



Introduction à la gestion de projet Démarche Agile - Scrum

m2information.fr





INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET

DÉMARCHE AGILE & FRAMEWORK SCRUM

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Comprendre les notions clés de la gestion de projet
- Comprendre l'agilité et le devops
- Comprendre une organisation agile
- Savoir intégrer une équipe Scrum

Sommaire

- Partie 1 : Définition de projet : notions clés
- Partie 2 : Les méthodes de pilotage de projet
- Partie 3 : L'agilité, le lean, de devops
- Partie 4 : Scrum

Agilité & **SOFT-SKILLS ...**

Top 10 skills of 2025



Type of skill

- Problem-solving
- Self-management
- Working with people
- Technology use and development


-  Analytical thinking and innovation
-  Active learning and learning strategies
-  Complex problem-solving
-  Critical thinking and analysis
-  Creativity, originality and initiative
-  Leadership and social influence
-  Technology use, monitoring and control
-  Technology design and programming
-  Resilience, stress tolerance and flexibility
-  Reasoning, problem-solving and ideation

Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

La vie d'un projet informatique 'bien' mené




Comment le client
a exprimé son besoin



Comment le chef de
projet l'a compris



Comment l'ingénieur
l'a conçu




Comment le
programmeur l'a écrit



Comment le responsable
des ventes l'a décrit




Comment le projet
a été documenté




Ce qui a finalement
été installé



Comment le client
a été facturé



Comment la hotline
répond aux demandes




Ce dont le client avait
réellement besoin

PARTIE 1 : DÉFINITION DE PROJET

LES NOTIONS CLÉS

Définir le cadre d'un projet

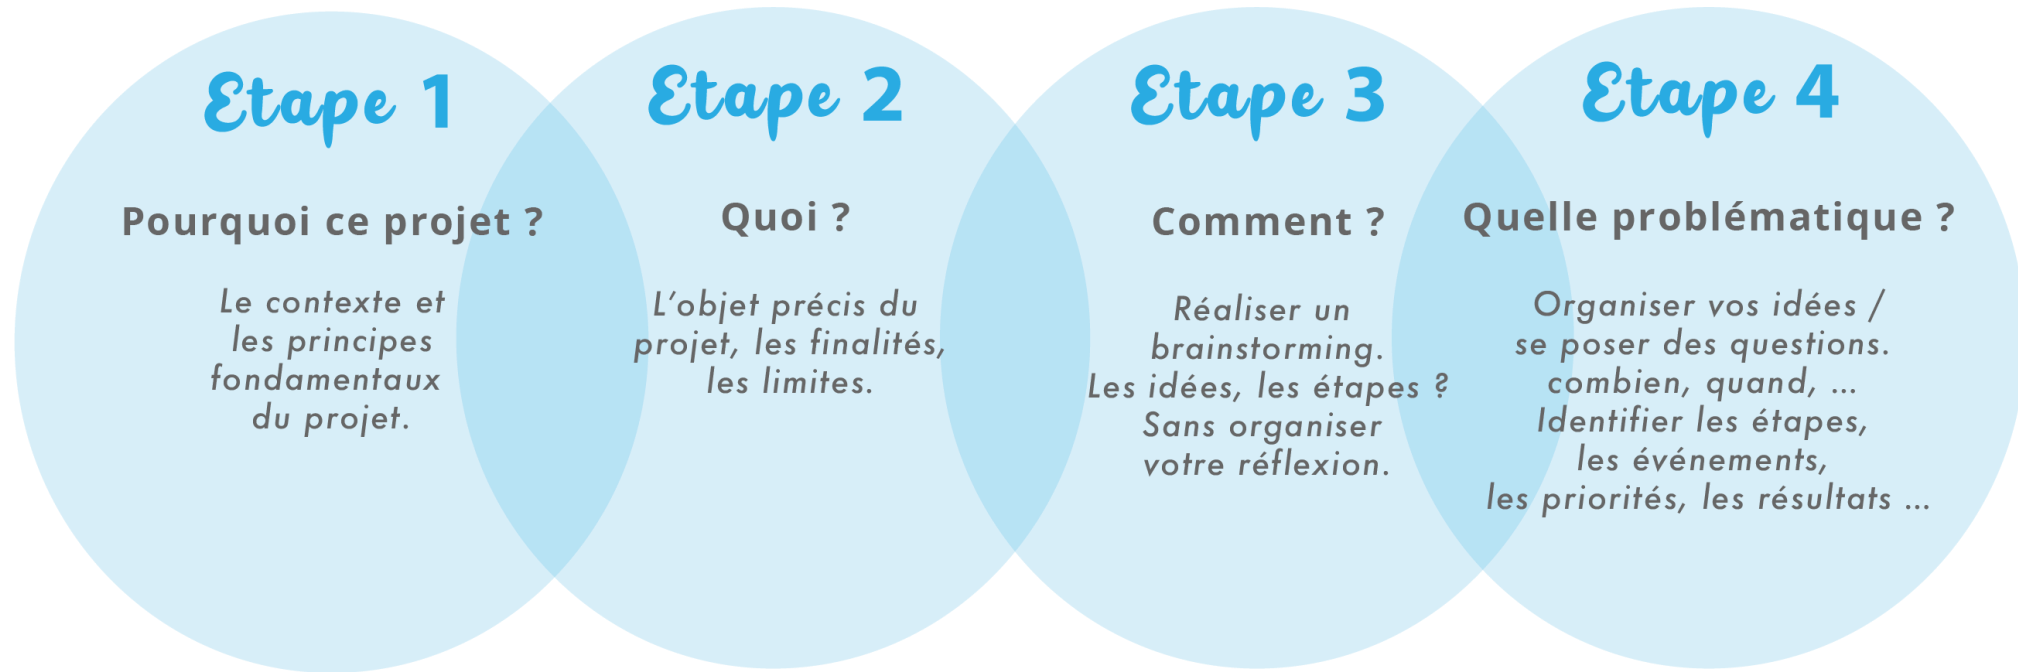

Après toutes ces étapes, on commence à cadrer le projet.

Les objectifs doivent être ...

Cadrés *(spécifique, précis, défini)*

Approuvés *par tous*

Mesurables *avec des critères de validation*

Echéances précises


Réalistes et faisables...

Ambitieux


LA MÉTHODE SMART :

Spécifique et simple / **M**esurable / **A**mbitieux et Accepté / **R**éaliste / Délimité dans le **T**emps


Les déterminants d'un projet

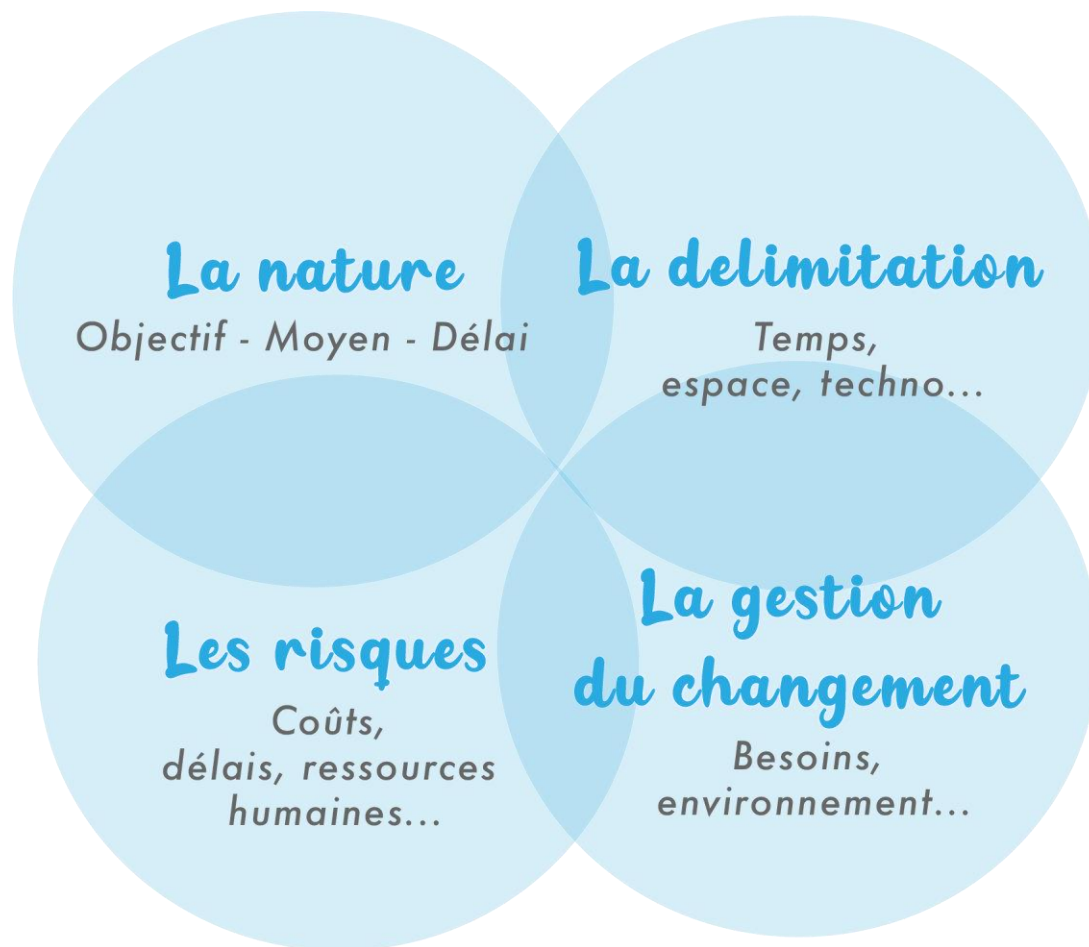


Les acteurs

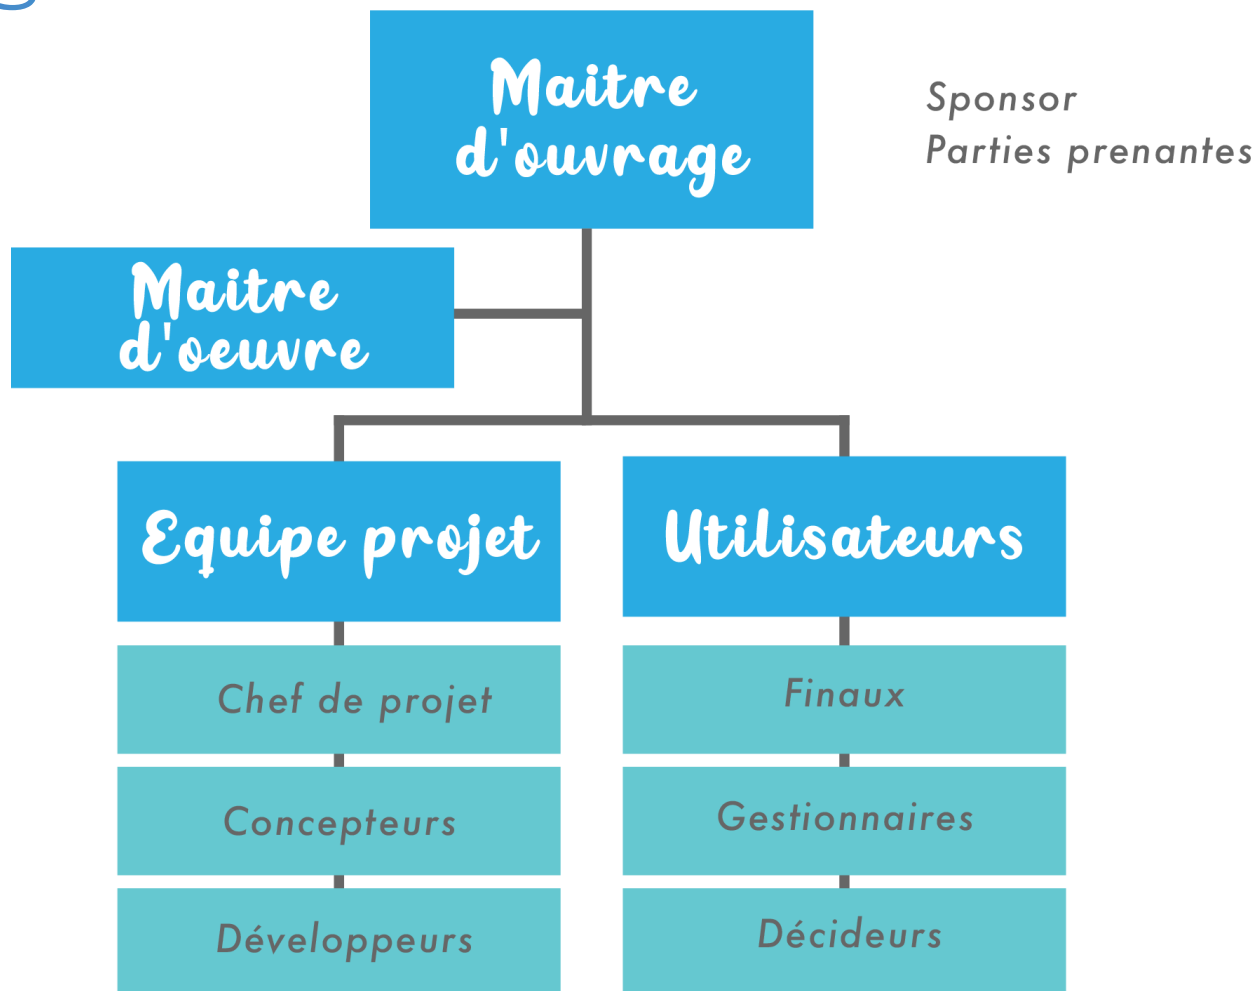


Les responsabilités

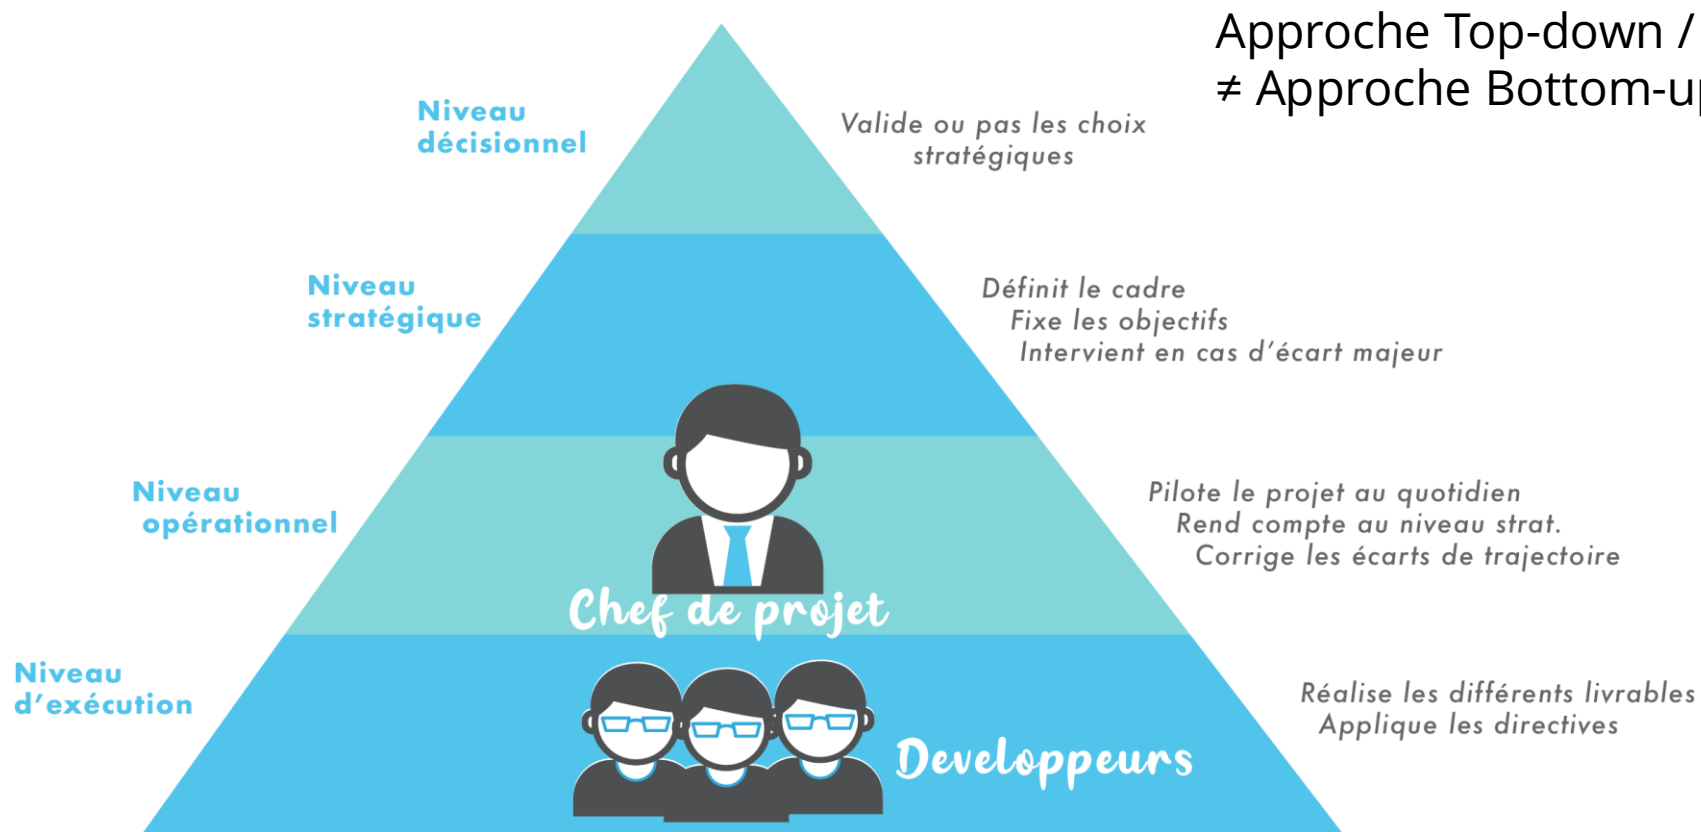

Les étapes de la gestion de projet

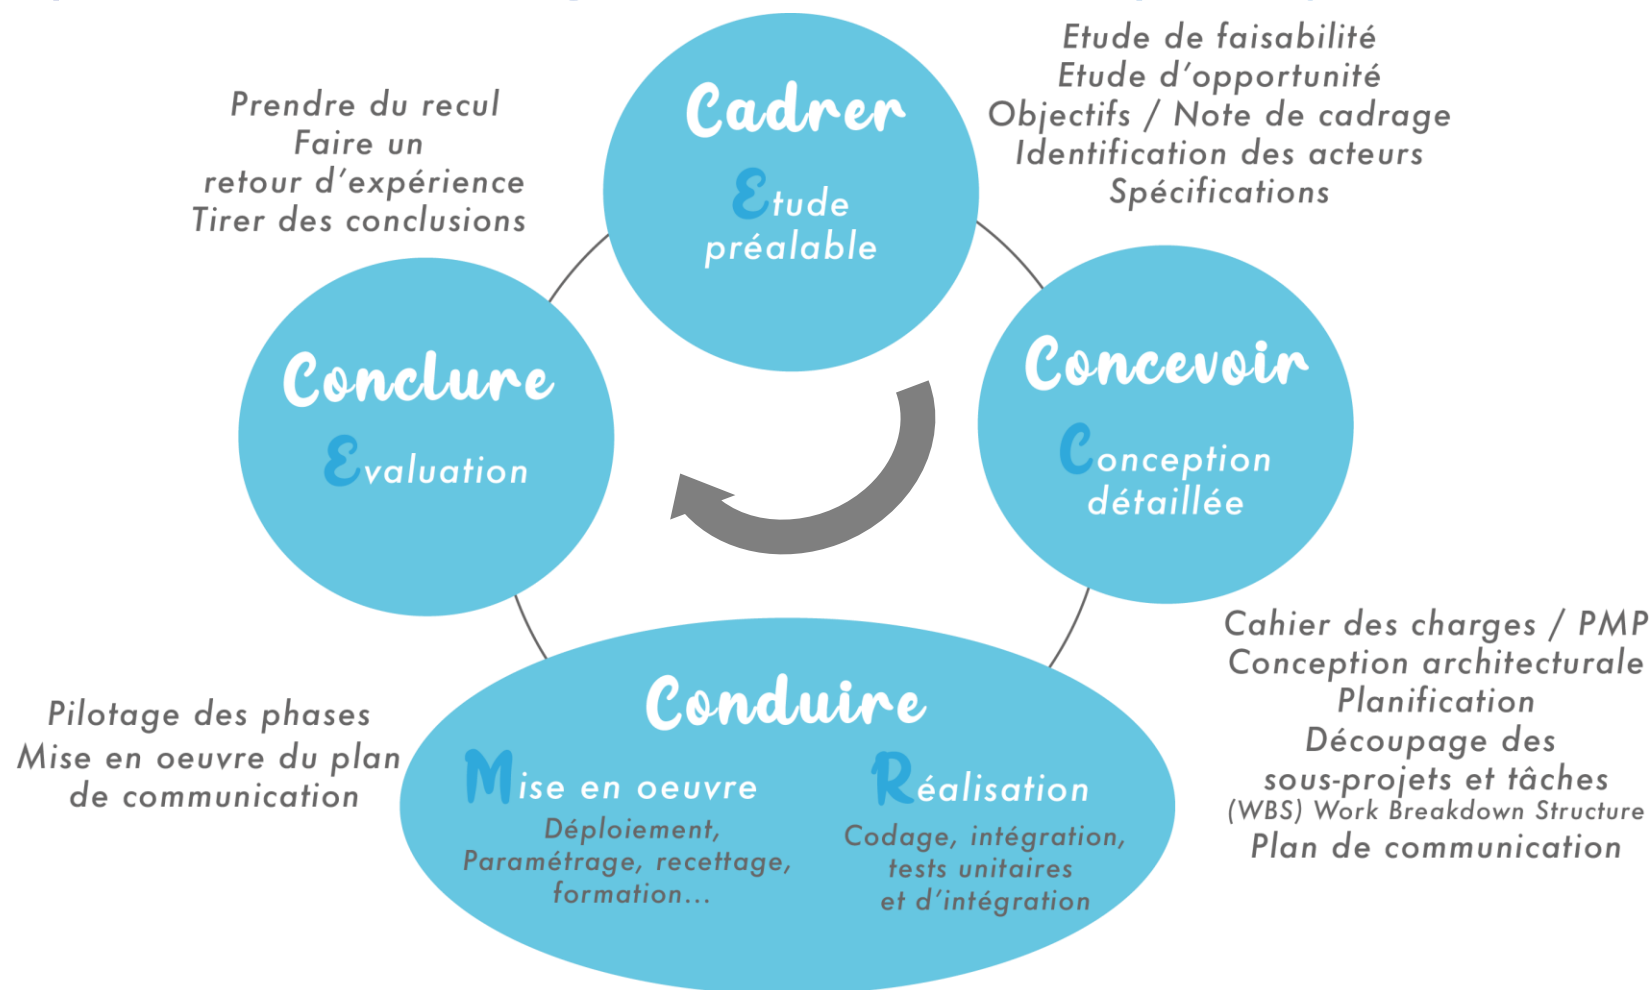


Les livrables

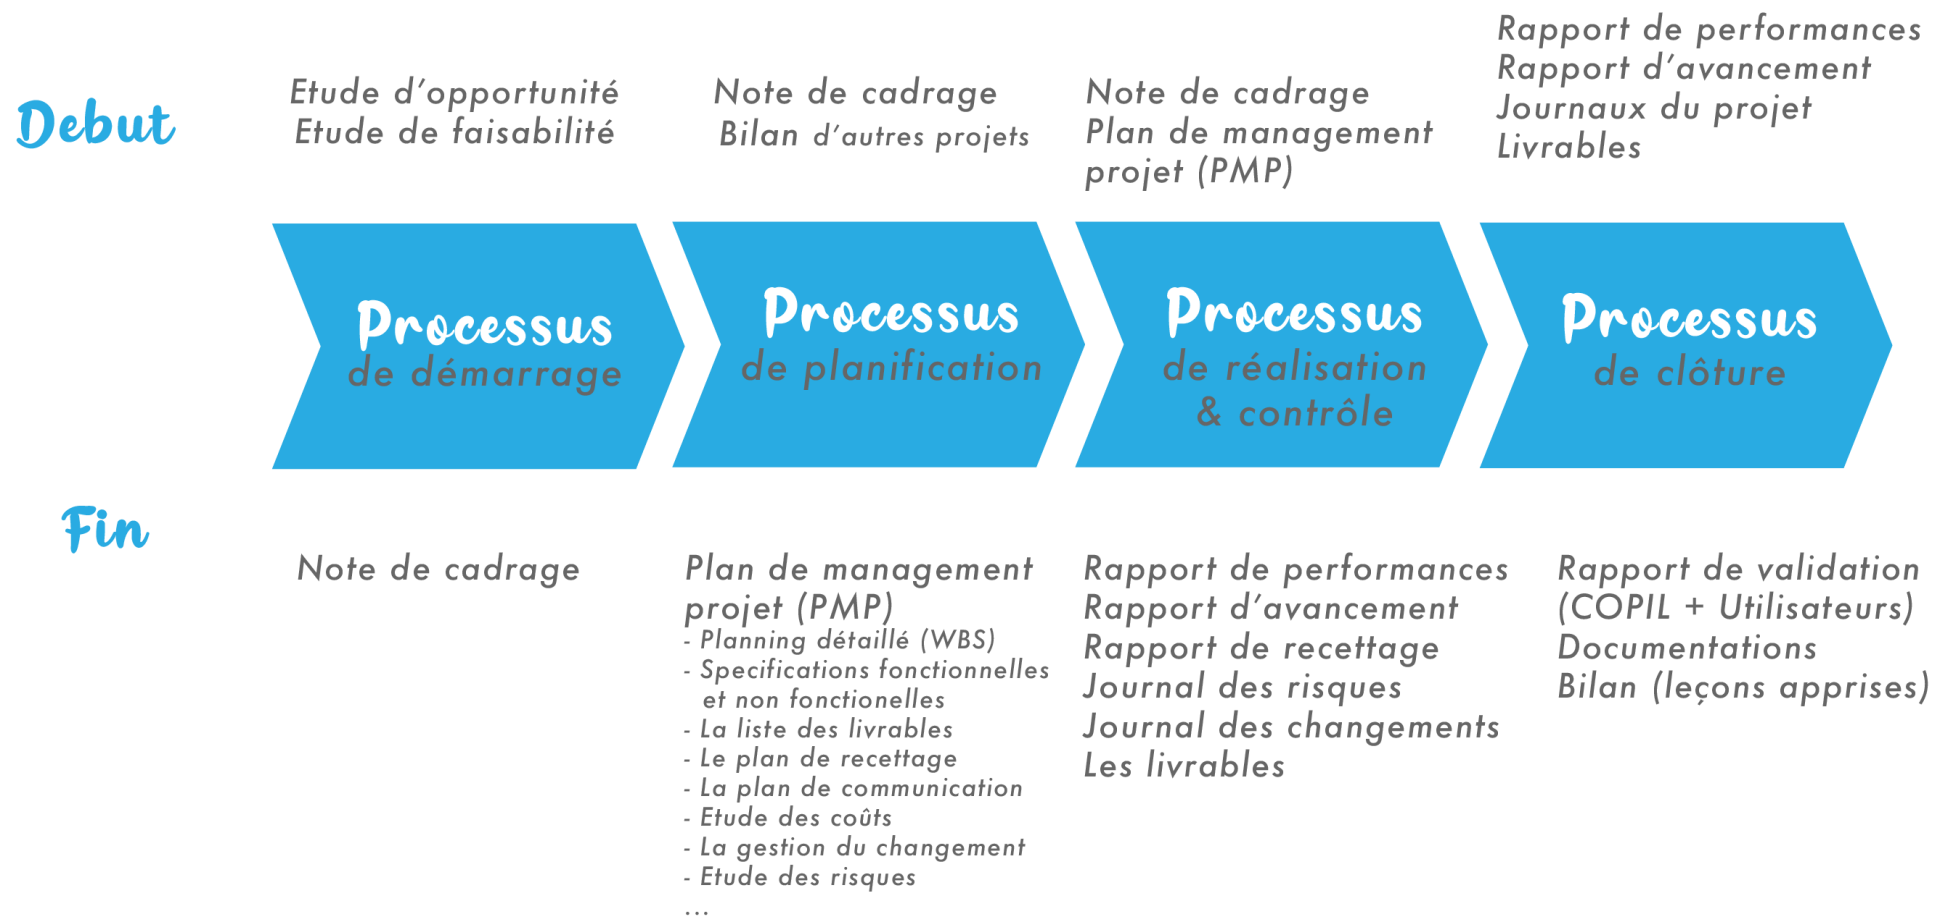

PARTIE 2 : LES MÉTHODES **DE PILOTAGE DE PROJETS**

Modèle en cascade / waterfall

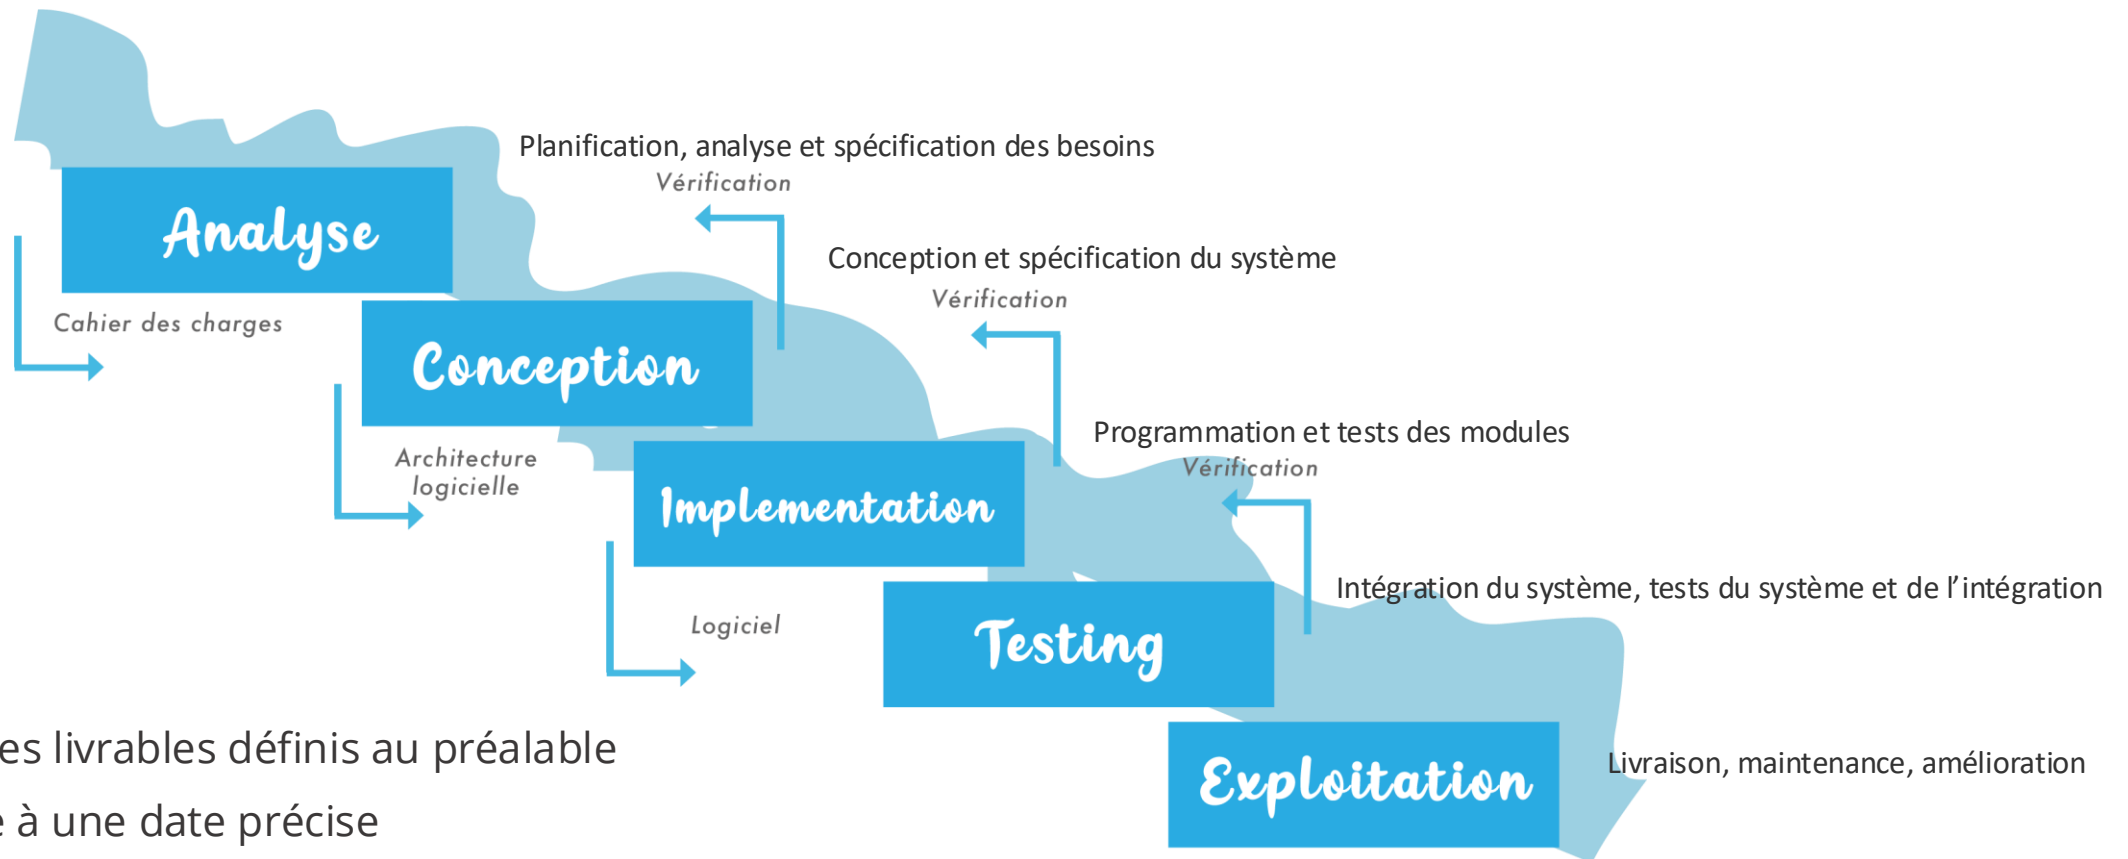

- Produire des livrables définis au préalable
- Se termine à une date précise
- Se termine que lorsque les livrables sont jugés satisfaisants – étape validation-vérification


Modèle en cascade / waterfall

A SAVOIR

- Chaque étape produit un livrable (document, maquette, code...).
- On valide chaque phase avant de passer à la suivante (revue formelle).
- Il est difficile de revenir en arrière une fois une étape terminée.
- La documentation est centrale à chaque étape.

AVANTAGES


- Simple à comprendre et à planifier.
- Utile quand les **besoins sont clairs, stables et bien définis dès le départ**.
- Permet de bien structurer les projets réglementés ou critiques (santé, industrie...).

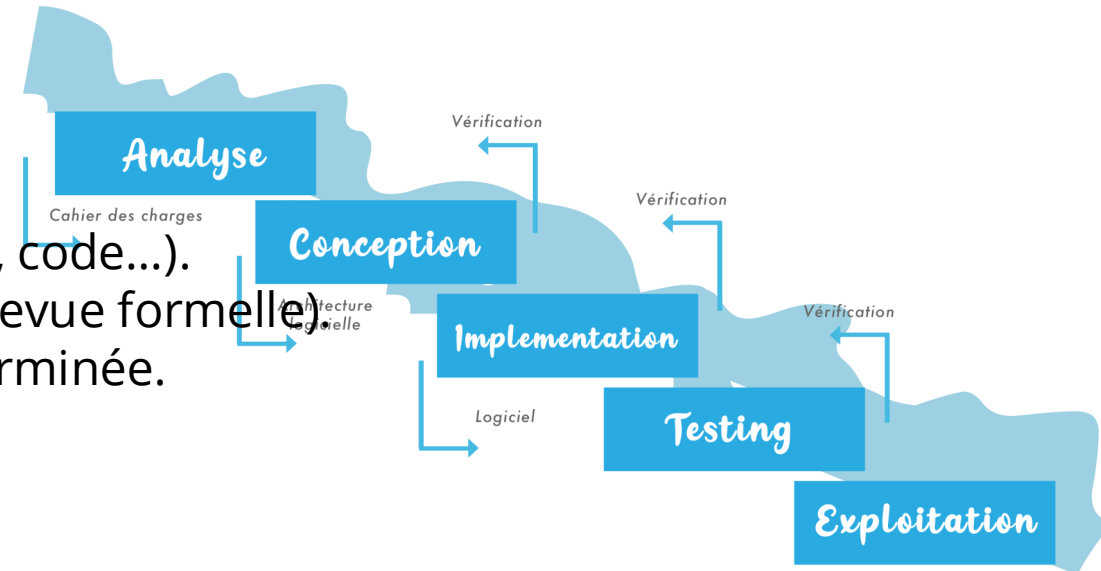

Modèle en cascade / waterfall

INCONVENIENTS

- Rigide : peu adapté aux projets où les besoins évoluent
- Décalage entre la conception et la livraison du produit réel.
- Découverte tardive des erreurs, souvent pendant les tests.
- Peu de place au feedback client avant la fin.

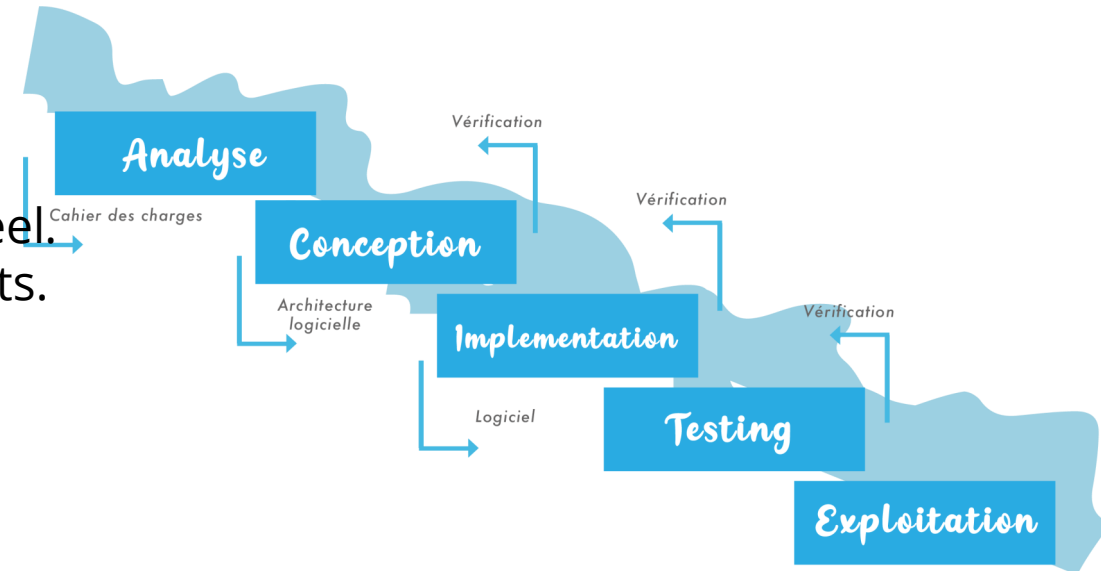

A UTILISER QUAND ?

- Projets courts et bien définis.
- Déploiement d'une infrastructure réseau.
- Mise en place d'un système de sauvegarde conforme à un cahier des charges fixe.
- Milieu cybersécurité pour des projets avec des contraintes réglementaires fortes.
- Exemples de projets : Systèmes de gestion des cartes bancaires (Visa / Mastercard dans les années 1990-2000), Airbus A320 années 80, logiciel de la navette spatiale américaine 80'-2000

Modèle en V

Utilisée **1984 US Department of Defense**

1984 **Popularisée dans les années 1990** l'aéronautique, automobile, ferroviaire

Nécessité d'anticiper et de préparer les critères d'appréciation et d'acceptation



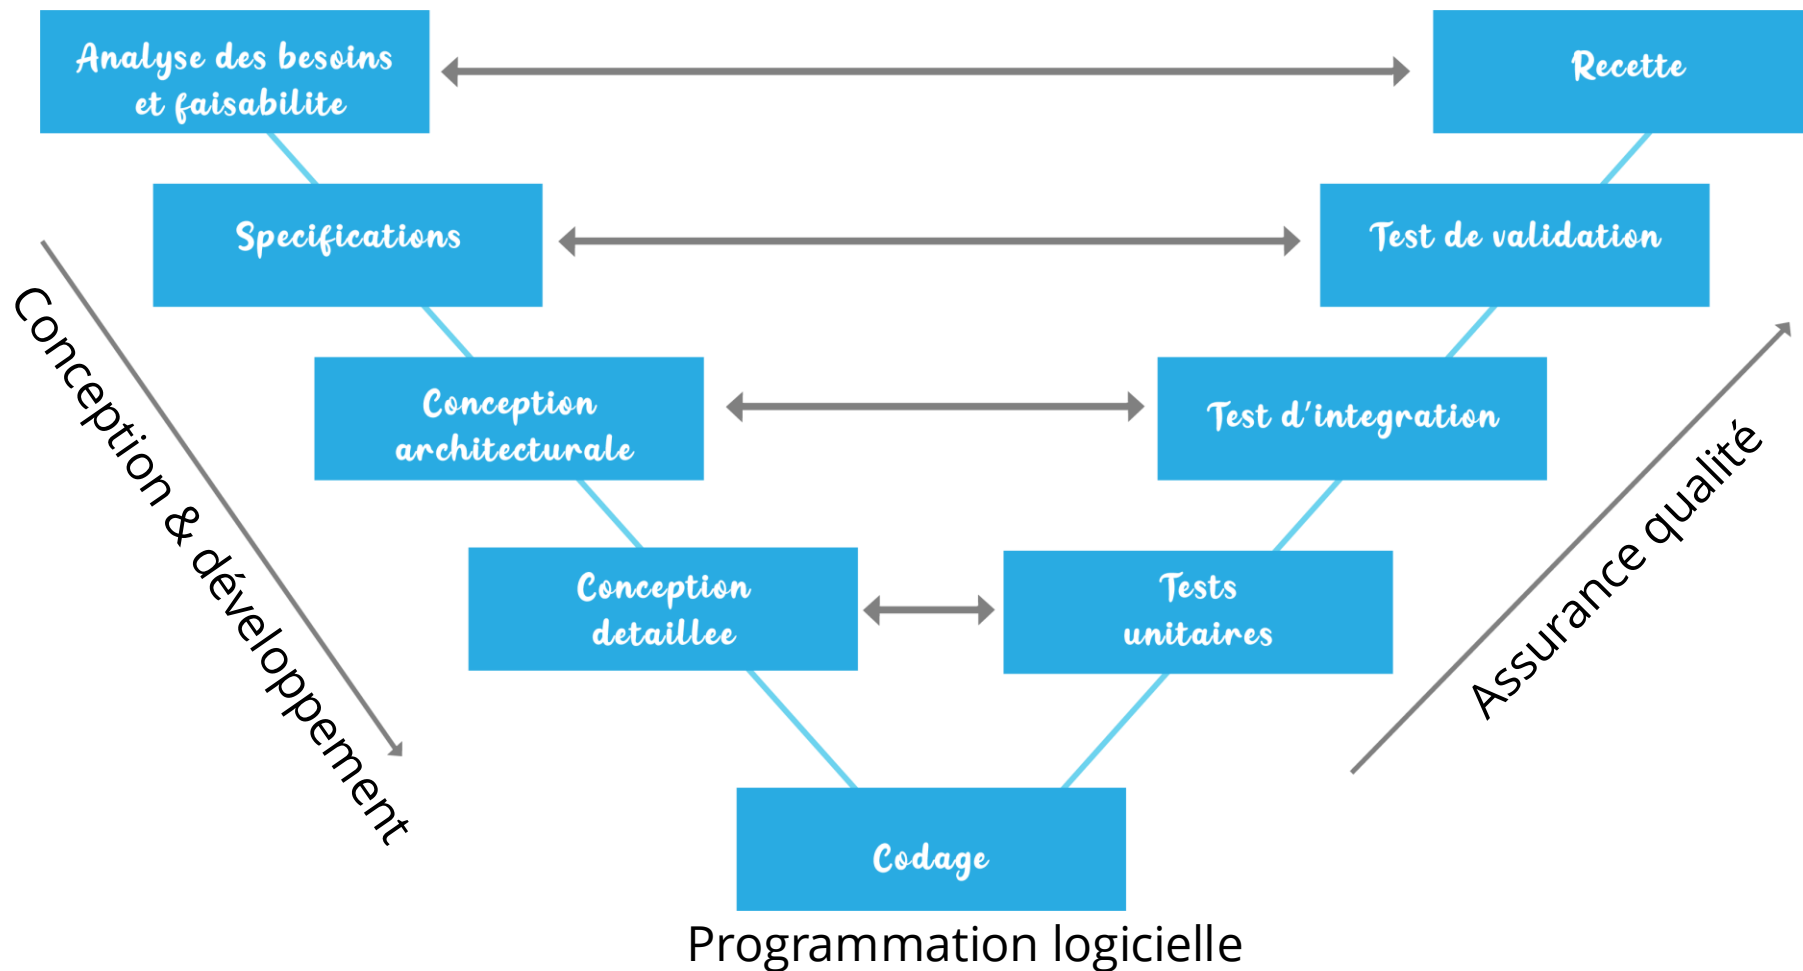


Diagramme de Gantt

- **Henry L. Gantt** au début du XXe siècle pour le secteur industriel.
- Utilisé en gestion de projets **IT, cybersécurité, infrastructure et développement logiciel**.
- Complément utile notamment des approches prédictives (cycle en V, cascade)

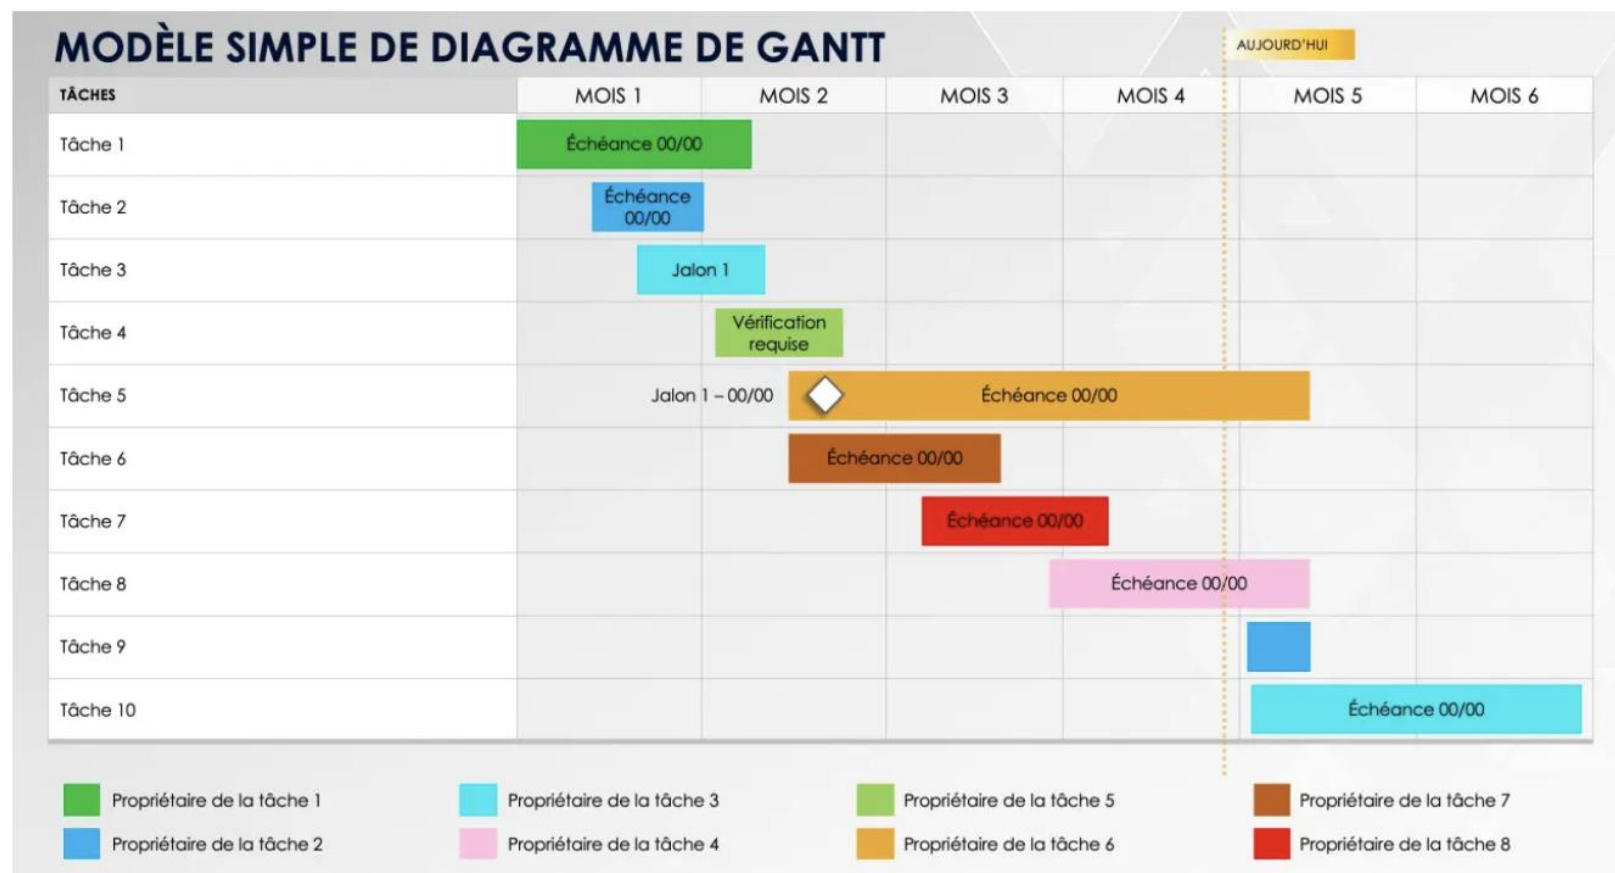

L'effet tunnel

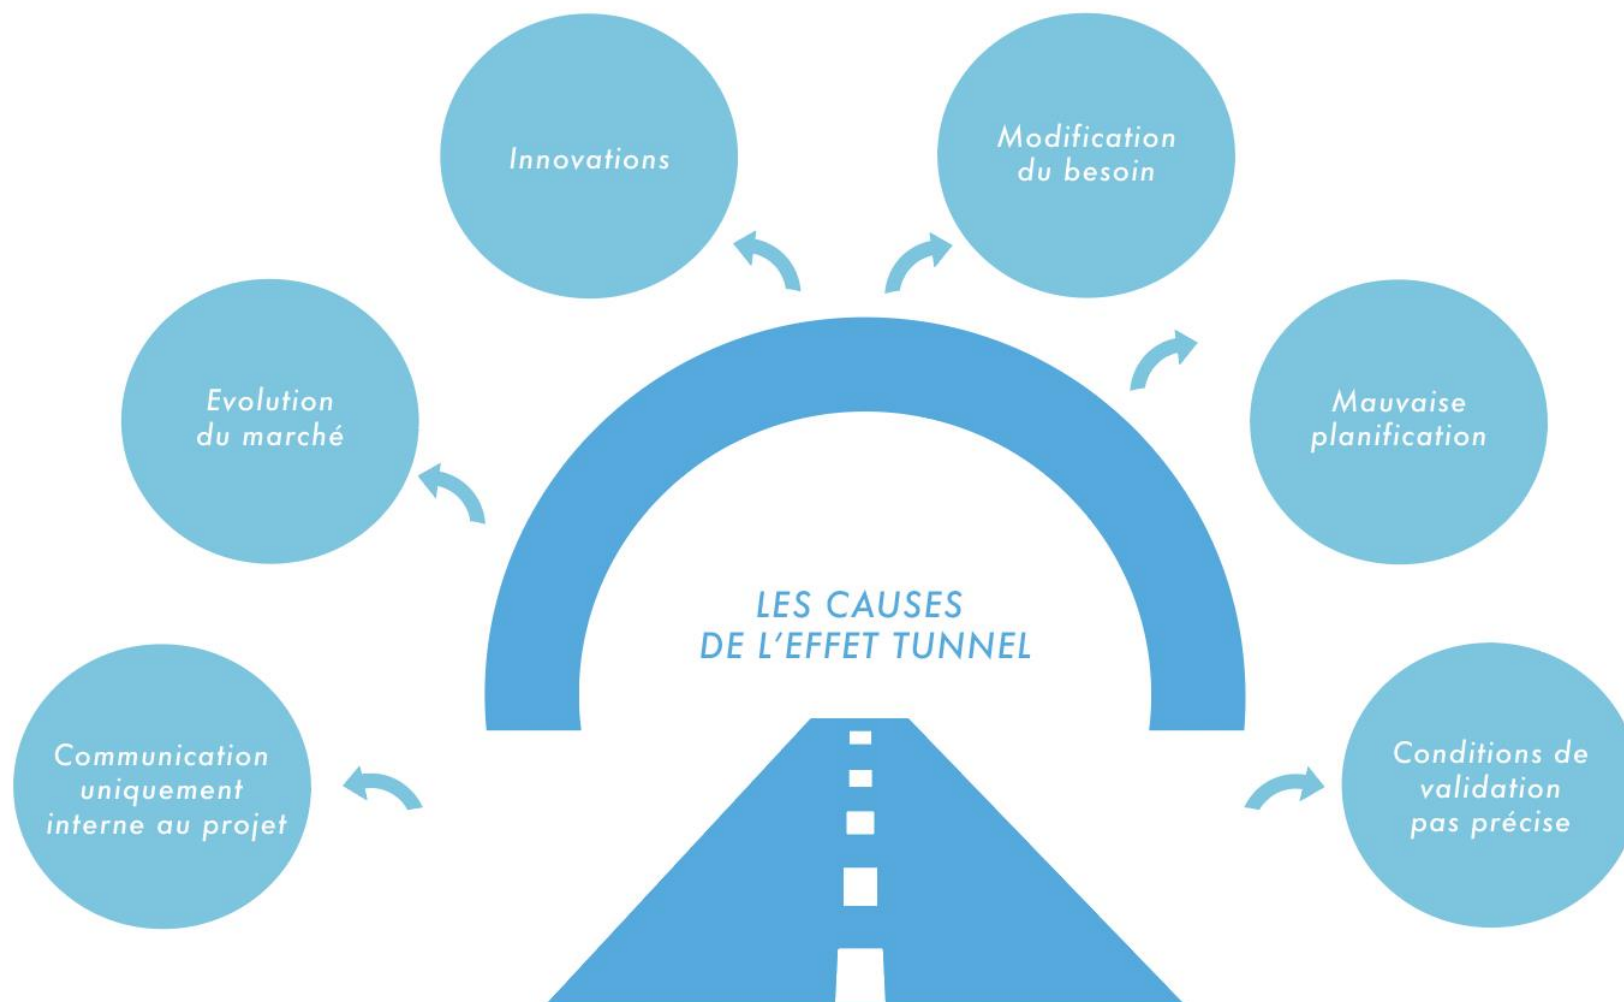

Les modèles classiques


- Le client exprime ce qu'il veut
- Décisions stratégiques prise au moment où le système est le moins bien connu
- Les livrables doivent arriver à temps et en bon état
- Souvent préconisé en industrie et projets scientifiques

LES LIMITES :

- Utopie d'une spécification complète sans changement
- Rigidité du contrat
- Mode de communication pas optimal

Modèle en spirale / cycle semi-itératif


Proposé en 1986
1991 : Méthode RAD
(Développement rapide d'applications)

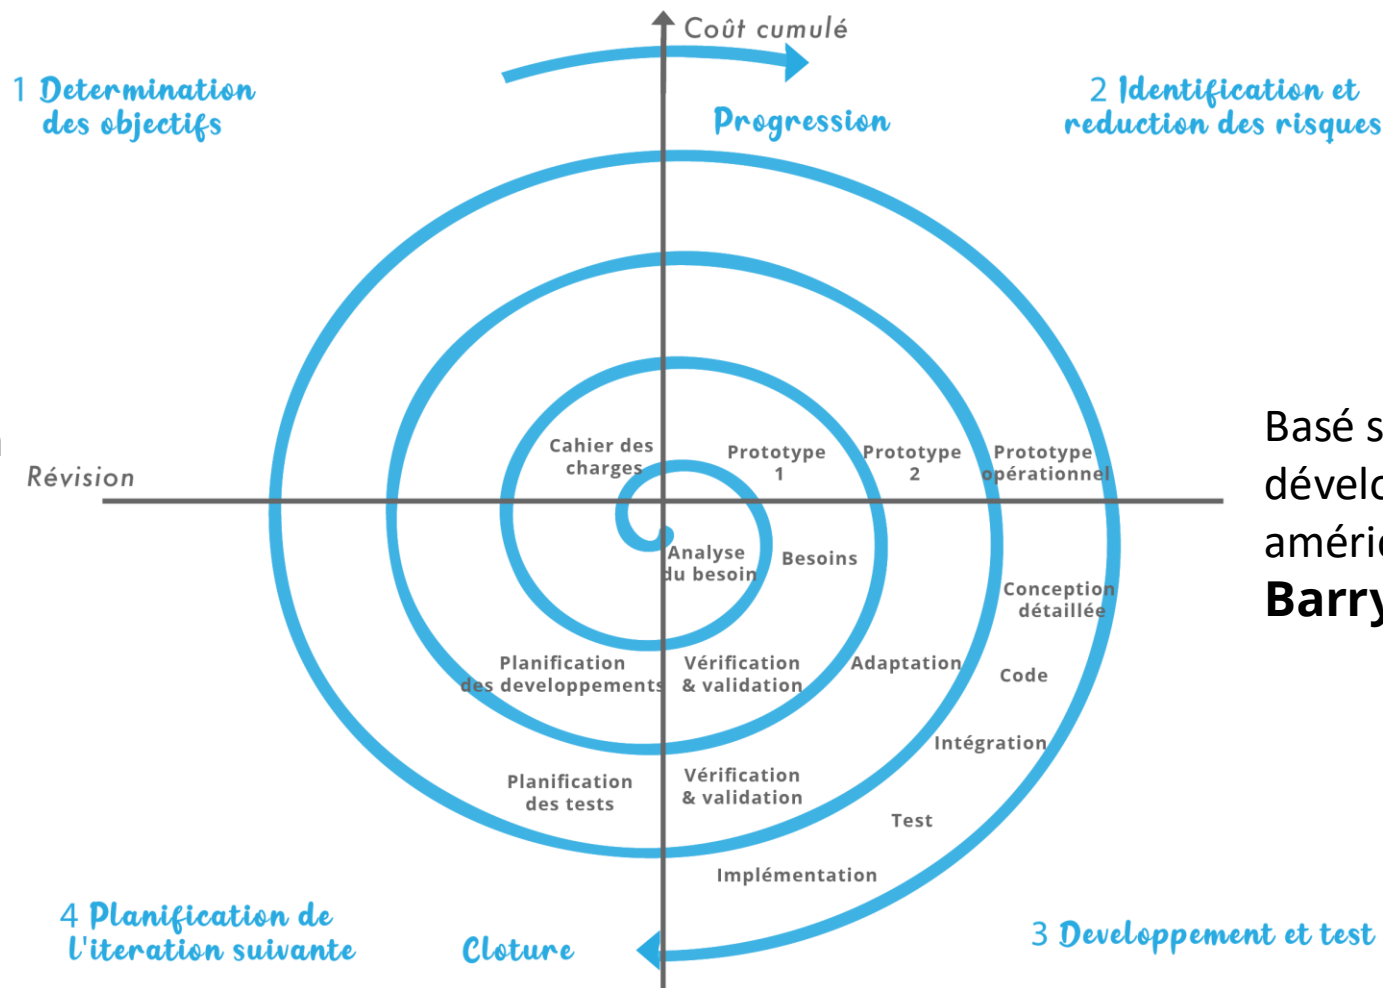

Cycle 1 & 2 :
Expression du besoin
+ conception
Cycle 3 :
Développement


Basé sur l'expérience du
développement logiciel de défense
américain – TRW/NASA/USAF par
Barry Boehm 70-80'

Cascade VS Semi-itératif VS Itératif

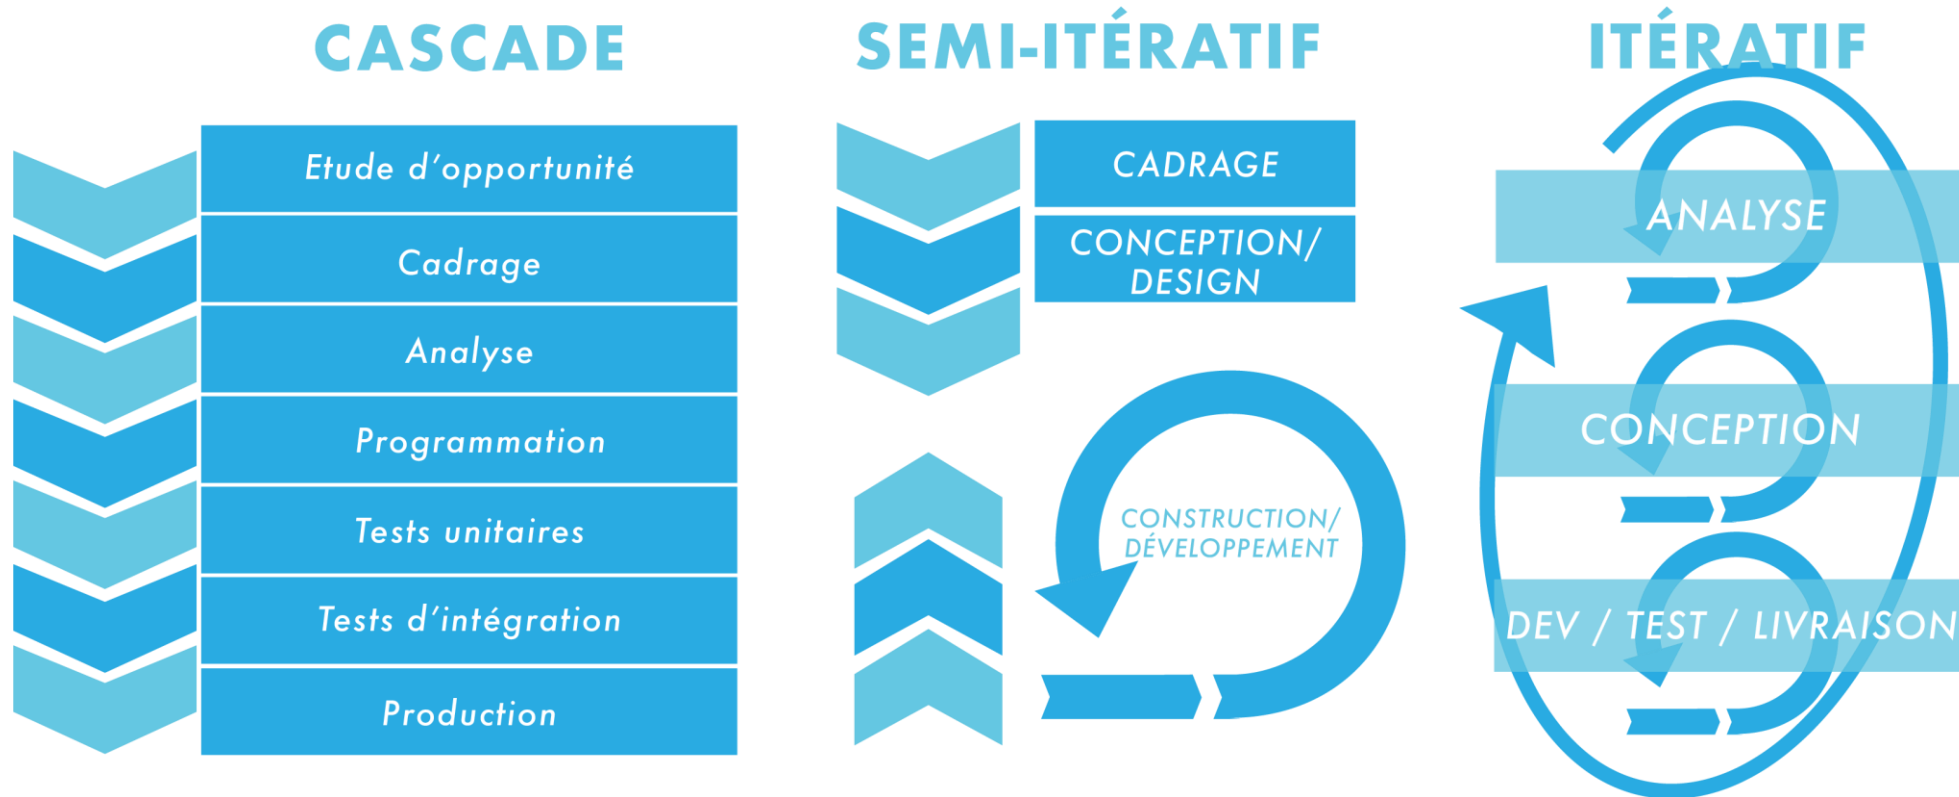


Scrum : Pilotage par la valeur

Not like this....

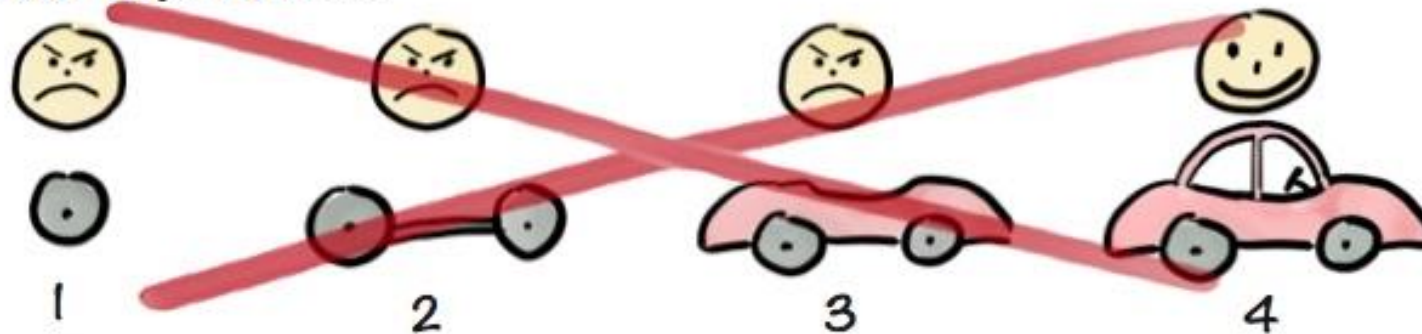


Like this!




Minimum Viable Product

From MVP (**Minimum Viable Product**) to
SCL (**Simple, Complete & Lovable product**)

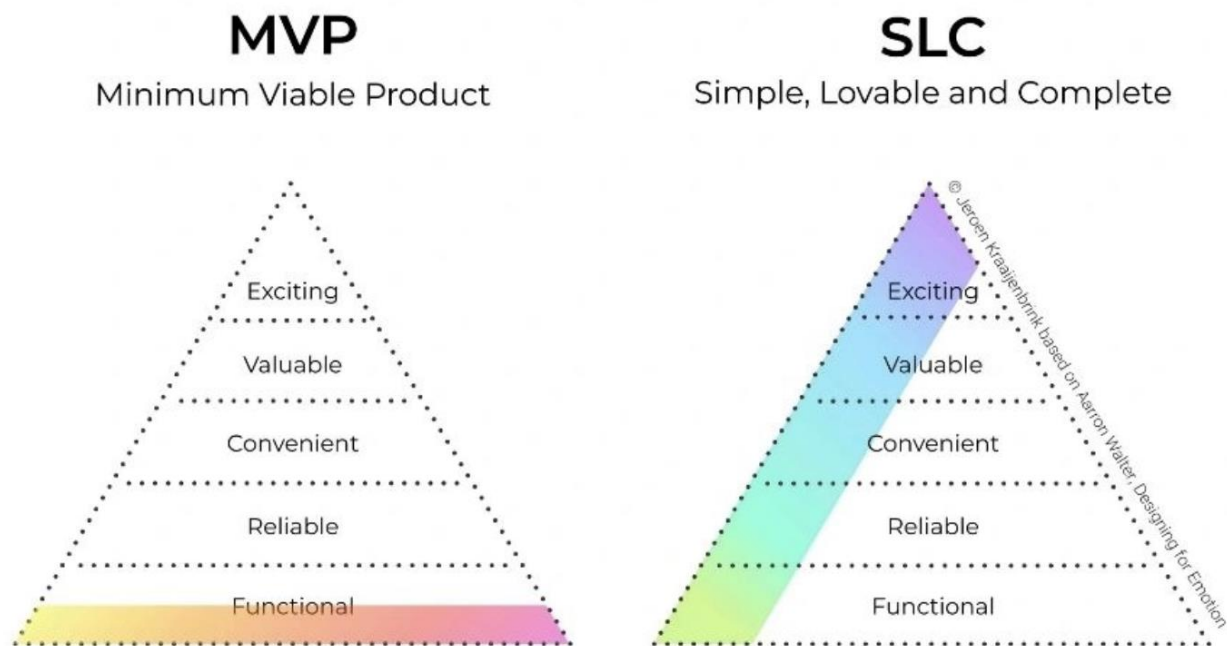

Fonctionnel – Fiable – Pratique – de valeur - Passionnant

Proof of Concept (POC)

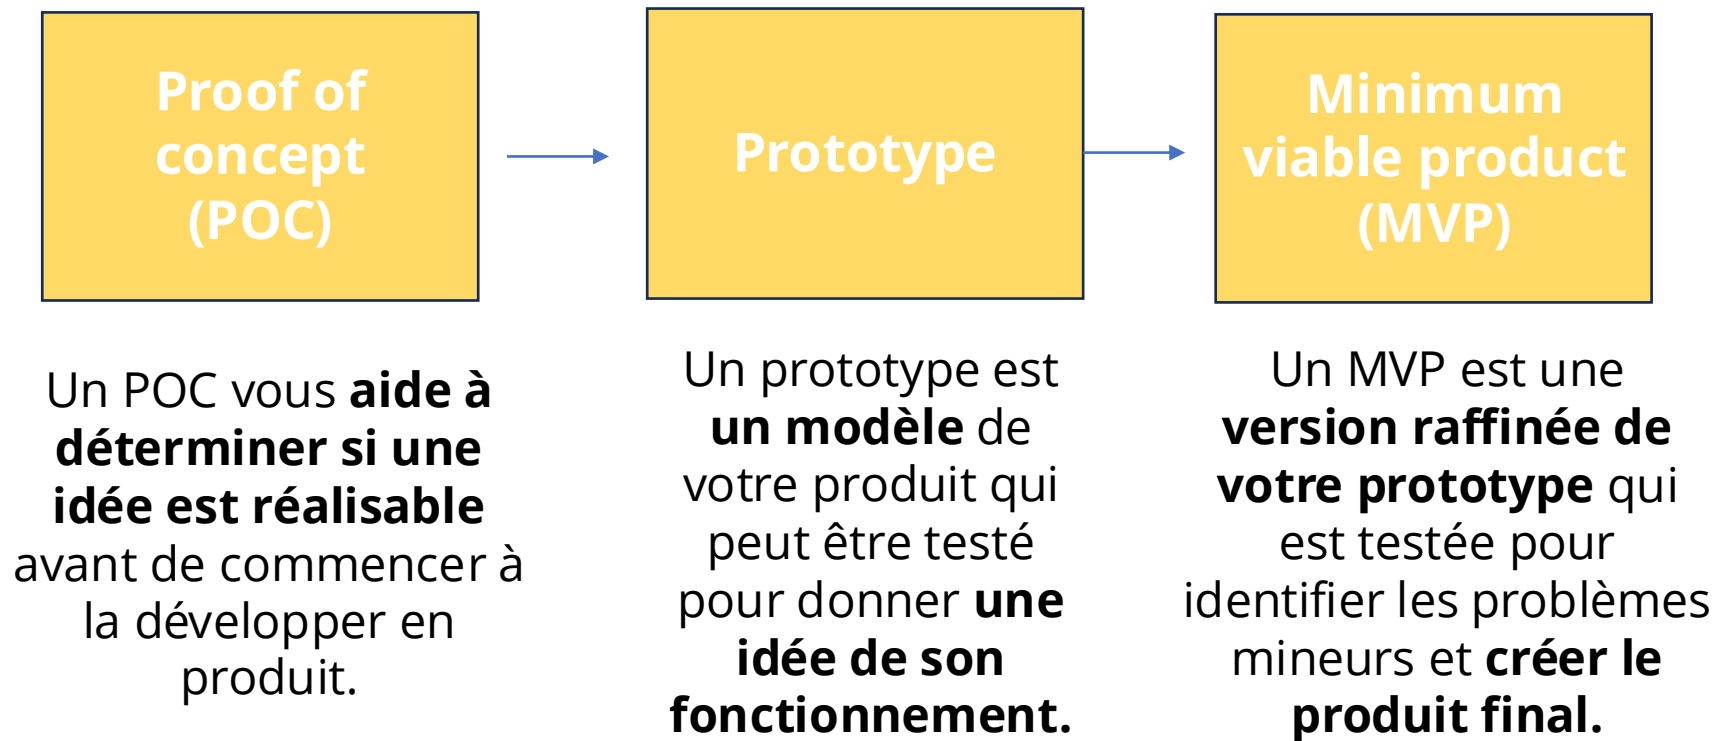

PARTIE 3 : L'AGILITÉ : **QUOI & COMMENT ?**

L'agilité : 4 valeurs

- Sommet Snowbird 2001 :
=> planification et documentation excessives ≠ satisfaire leurs clients.
- Méthodologie qui repose sur une approche itérative et incrémentale afin d'optimiser la prédictibilité et de contrôler les risques
- Favorise l'intégration du client dans l'équipe de développement d'un projet
- Permet une flexibilité et une adaptation aux changements des besoins d'un client

Les 4 valeurs du Manifeste Agile :

- Valoriser les individus et leurs interactions de préférence aux processus et aux outils,
- Valoriser des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive,
- Valoriser la collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles,
- Valoriser la réponse au changement, de préférence au respect d'un plan.

Le manifeste reconnaît la valeur du second élément mais privilégie le premier.

L'agilité : 12 principes

- Notre principale priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des solutions qui apportent de la valeur.
- Accueillez chaleureusement les changements de besoins, même tardifs dans le développement. Les processus agiles tirent parti du changement pour renforcer l'avantage concurrentiel du client.
- Livrez souvent des solutions opérationnelles, à une fréquence allant de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les échelles de temps les plus courtes.
- Les personnes en charge du métier ou des affaires et les personnes en charge de la réalisation doivent travailler ensemble chaque jour, tout au long du projet.
- Construisez les projets à partir de personnes motivées. Donnez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour mener à bien le travail.
- La conversation en face à face est la méthode la plus efficace et la plus économique pour donner des informations à une équipe de réalisation, et pour échanger des informations à l'intérieur de l'équipe.

L'agilité : 12 principes

- La disponibilité de solutions opérationnelles est la principale mesure d'avancement.
- Les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation. Les commanditaires, les réalisateurs et les utilisateurs devraient pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant.
- Porter continuellement attention à l'excellence technique et à la qualité de la conception renforce l'agilité.
- La simplicité – l'art de maximiser la quantité de travail qu'on ne fait pas – est essentielle.
- Les meilleures architectures, les meilleures spécifications de besoins, et les meilleures conceptions émergent d'équipes auto-organisées.
- À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux façons de devenir plus efficace, puis modifie son comportement et l'ajuste en conséquence.

Rédigé par ...

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas



Kent Beck

Créateur de l'Extreme programming



Jeff Sutherland

Fondateur de Scrum




Ken Schwaber


Formulé la 1ere version de Scrum
Fondé Scrum.org



Les premières méthodes agiles

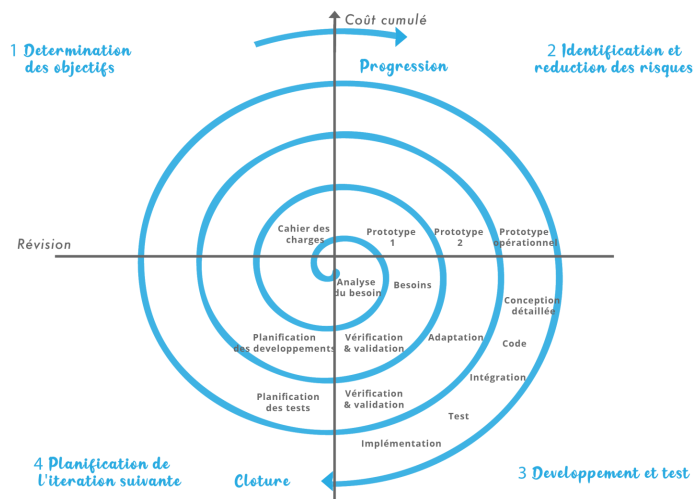

1991 : Méthode RAD
(Développement rapide d'applications)
ETATS-UNIS
RAD2 / France

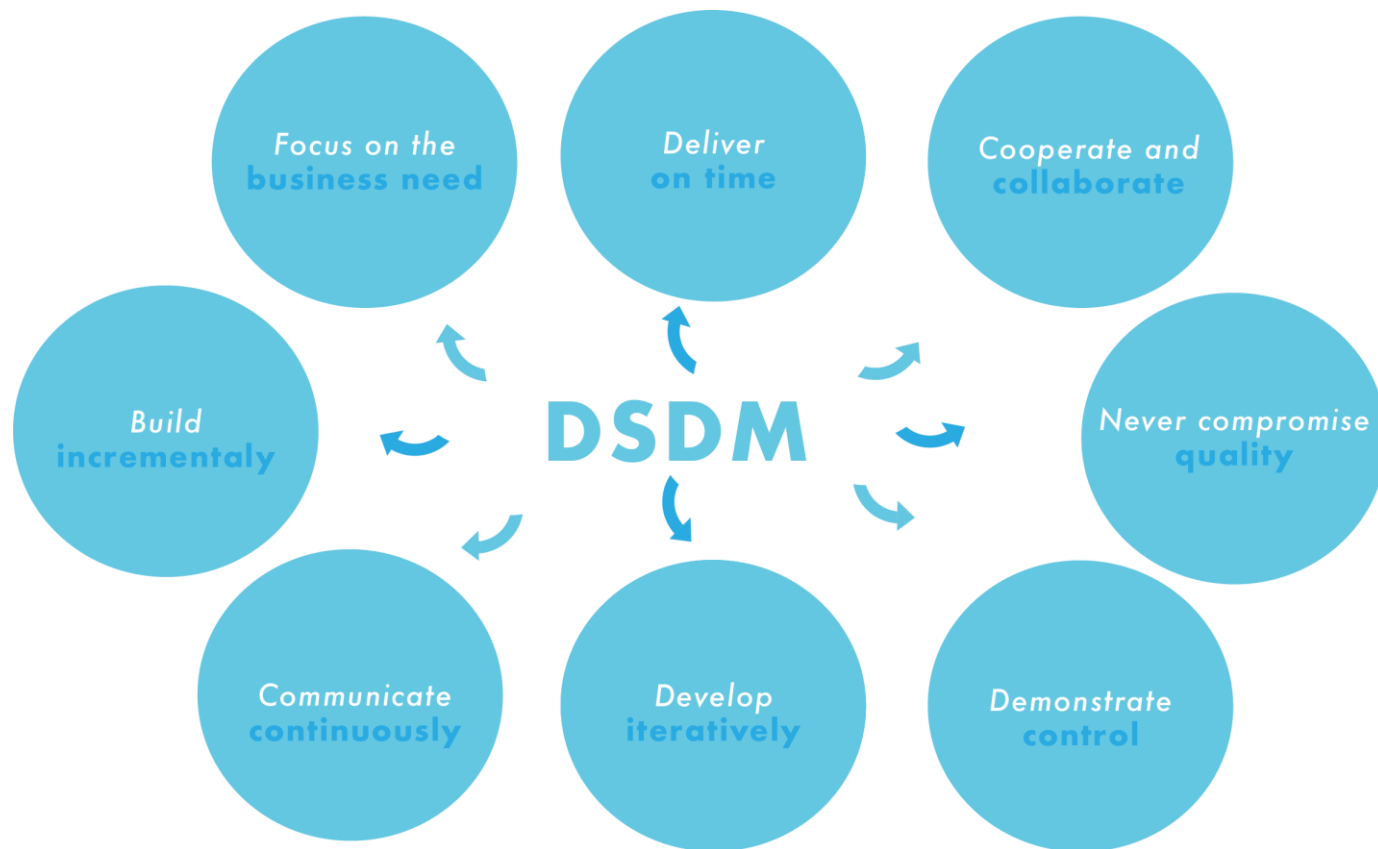


1994 : DSDM
(Dynamic Systems Development Method)
GRANDE BRETAGNE

eXtreme Programming

- Kent Beck / 1999 / Chrysler / Gestion de paie
- se concentrer sur les besoins du clients, mettre en place un développement itératif et l'intégration continue, avec de cycles rapides.
- Pair programming => revue de code en binôme systématique (driver/partner)


5 valeurs fondamentales :

- Communication
- Simplicité
- Feedback
- Courage
- Respect

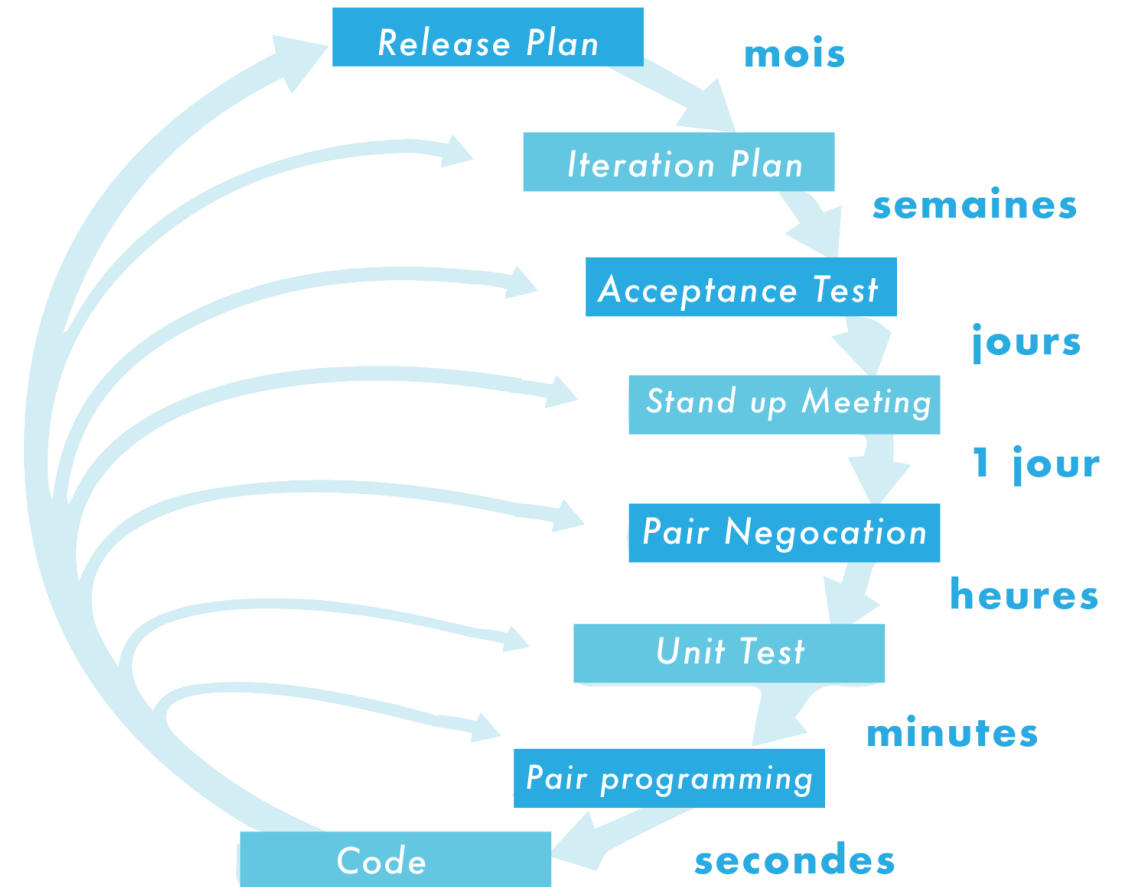


Lean thinking

- Taiichi Ōno / 30' / Amélioration de l'industrie Japonaise
- produire un éventail large de voitures, offrir du choix aux consommateurs, réduire les coûts
=> Juste à temps
- Produire de la valeur !
- organisation de production fluide, flexible, sans déchets !
- 90' : Etats-Unis : John Krafcik

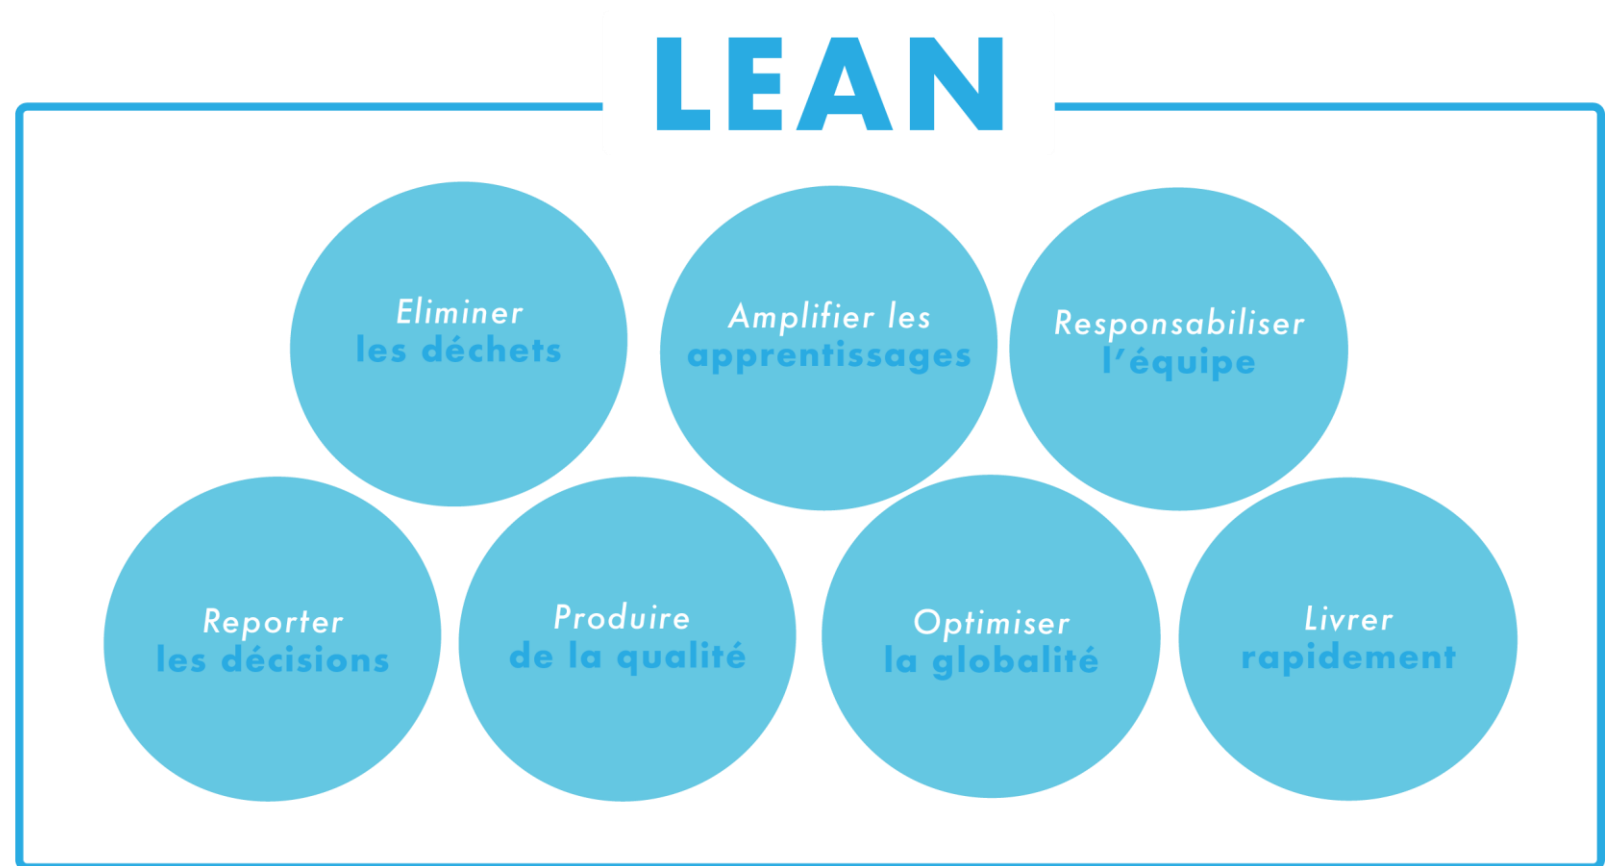

La maison du Lean Manufacturing

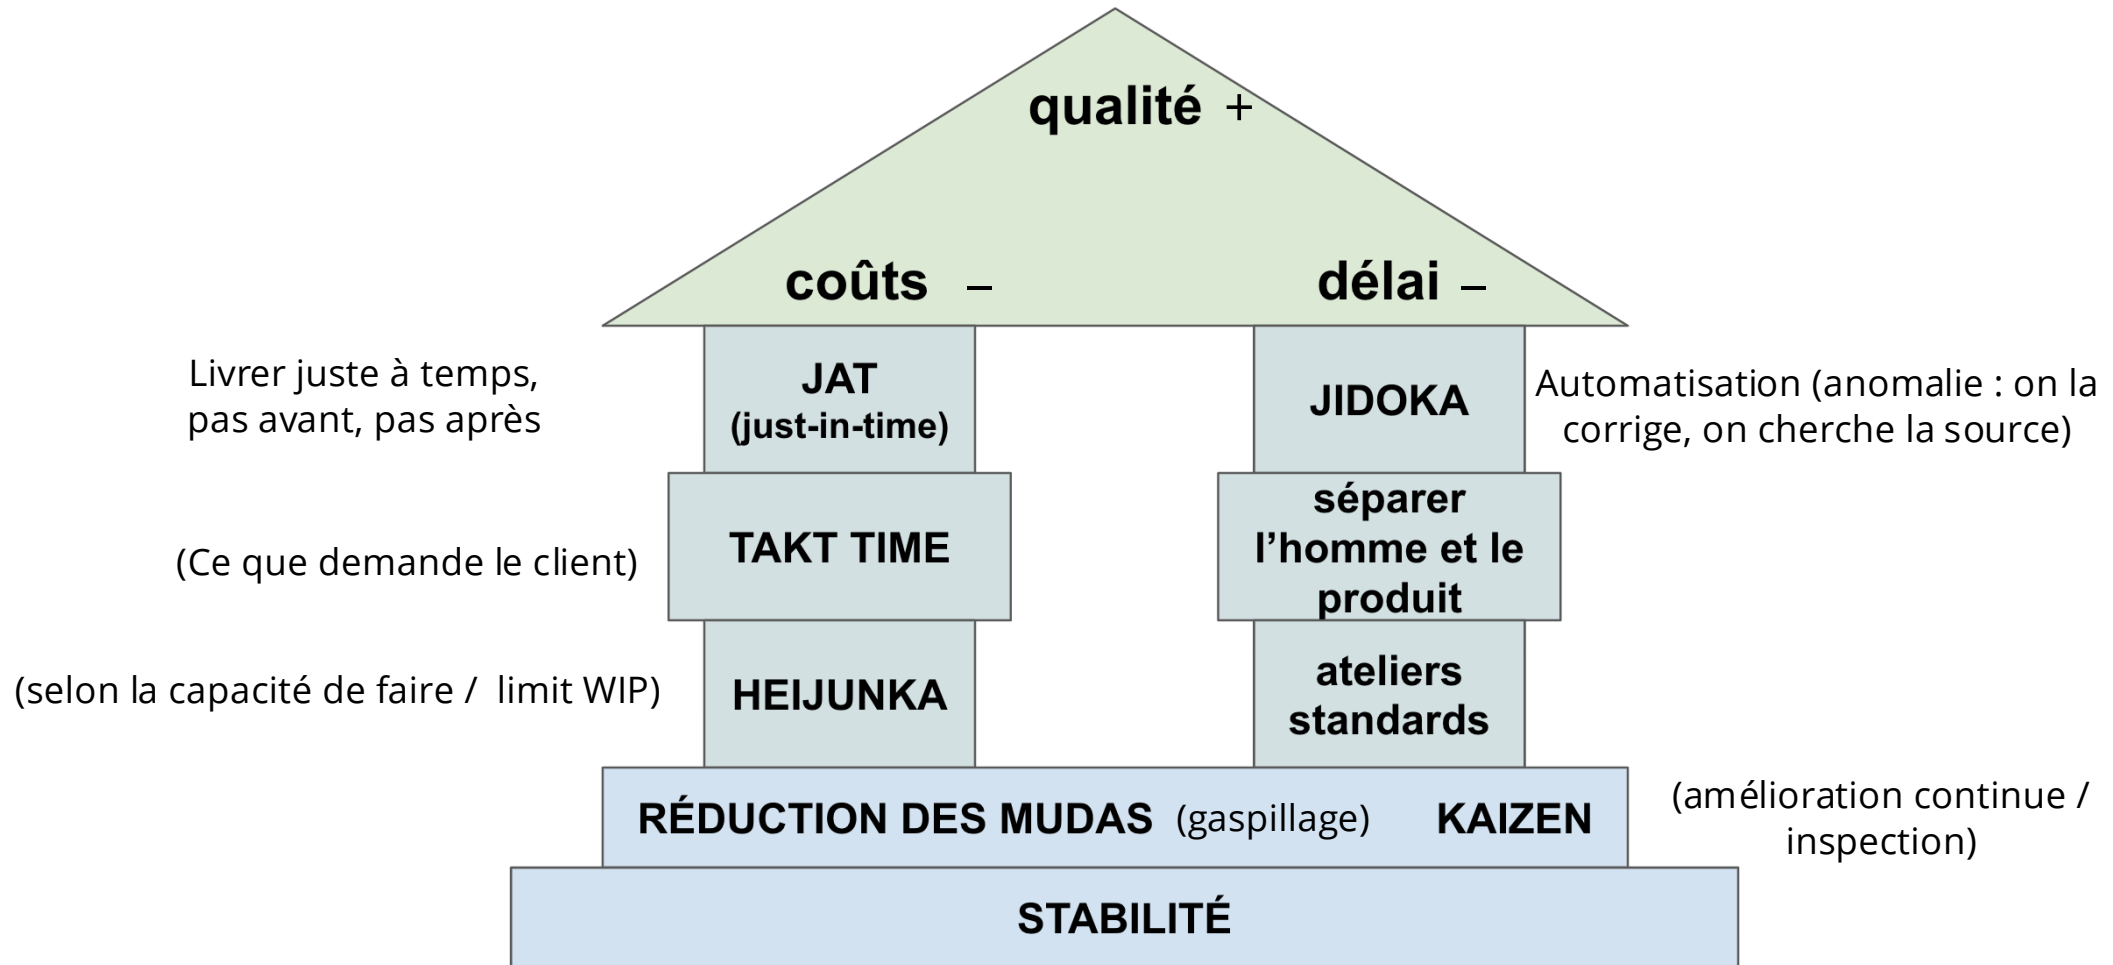

Les 7 gaspillages du Lean

- **Bugs ou défauts** – erreurs à corriger, pertes de temps
- **Changement de tâche (task switching)** – perte de concentration en passant d'une tâche à une autre
- **Fonctionnalités inutiles** – développer des choses non demandées ou non utilisées
- **Passages de relais (handoffs)** – perte d'information ou de temps entre équipes ou rôles
- **Temps d'attente** – blocages, validations en retard, dépendances non résolues
- **Travail non terminé** – code ou tâches en cours mais non livrés
- **Réapprentissage** – refaire, redécouvrir ou re-documenter ce qu'on avait déjà fait

Les 7 gaspillages du Lean

Le bug oublié

"Une fonctionnalité est livrée. Le lendemain, le client dit qu'elle ne marche pas. Il faut 3 personnes pendant une demi-journée pour corriger et retester. Que remarquez-vous ? »

Les interruptions

"Lisa commence à coder un ticket. 15 minutes plus tard, elle est appelée pour aider sur un autre. Puis encore sur un autre. À la fin de la journée, rien n'est terminé. Qu'en pensez-vous ? »

Le futur hypothétique

"L'équipe développe un module 'au cas où le client en aurait besoin'. Il ne sera jamais utilisé. C'était bien vu ? »

Le flou du transfert

"Max termine une tâche et l'envoie au QA. Le QA ne comprend pas ce qui a été fait, pose des questions. Aller-retours pendant deux jours. Que manque-t-il ?"

Les 7 gaspillages du Lean

La tâche bloquée

"Une tâche est prête, mais personne ne peut la valider avant 3 jours. L'équipe ne peut rien faire d'autre. Que feriez-vous ? »

Les tickets fantômes

"L'équipe a commencé 4 tâches cette semaine. Aucune n'est terminée. Juste 'en cours'. Ça pose problème selon vous ? »

L'amnésie

"On demande à Julie de modifier un code fait il y a 6 mois. Rien n'est commenté. Elle passe 2h à comprendre ce qu'il fait. Ça vous est déjà arrivé ?"


Kanban

- Taiichi Ōno / 40' / optimiser la capacité de production
- Modèle de gestion des inventaires utilisés par les supermarchés au US
- Pull system = flux tiré, limite de la surcharge
- Kanban = « étiquette » = une tâche à réaliser




Kanban

- Taiichi Ōno / 40' / optimiser la capacité de production
- Modèle de gestion des inventaires utilisés par les supermarchés au US
- Pull system = flux tiré, limite de la surcharge
- Kanban = « étiquette » = une tâche à réaliser

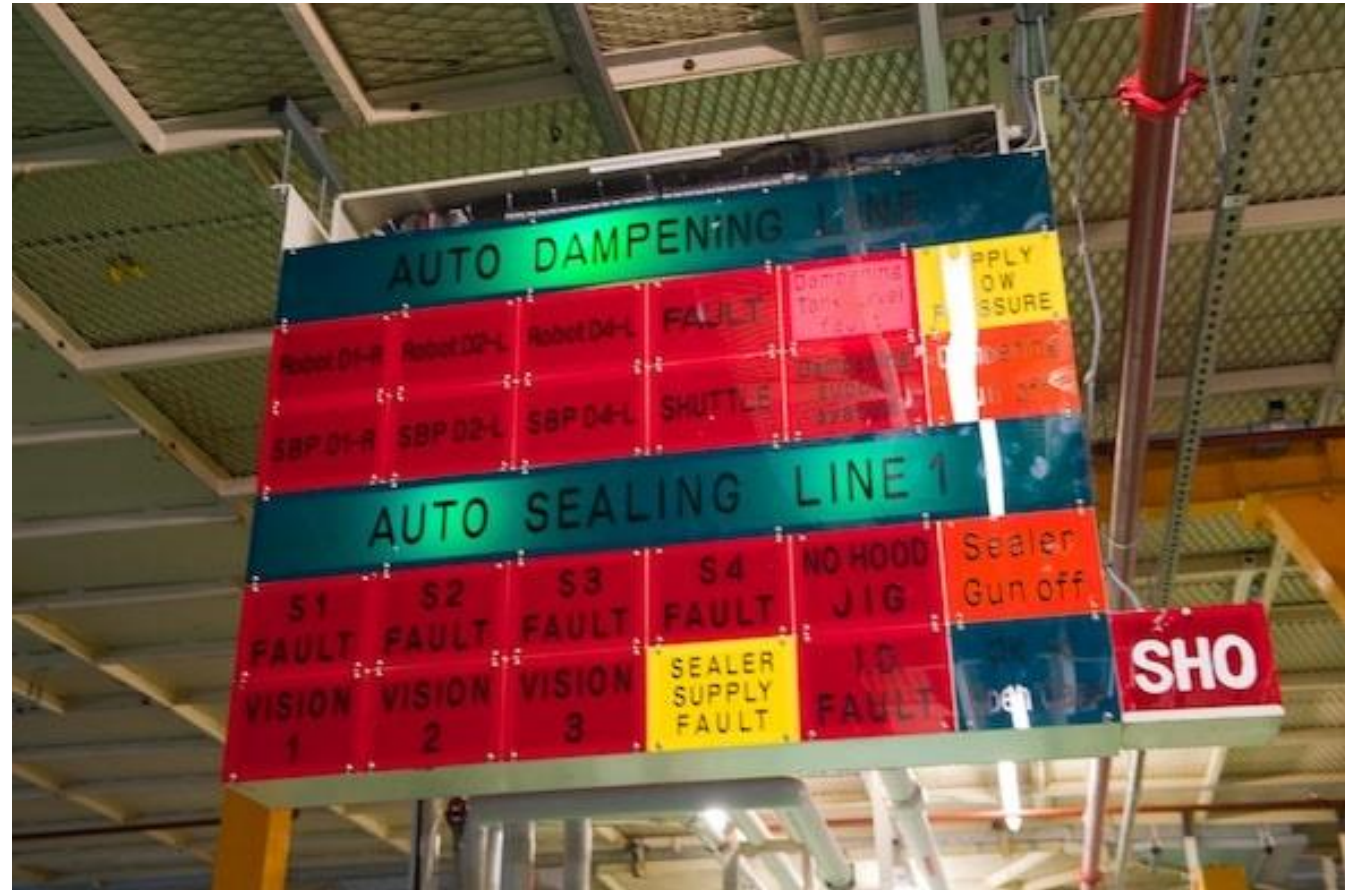

Kanban & PDCA (Roue de deming)

- Standardisation du workflow
- Dev continue, plus fluide
- Transparence
- Communication en temps réel
- Limiter le volume du travail : focus
- Ex: limit WIP : revue de code : 2

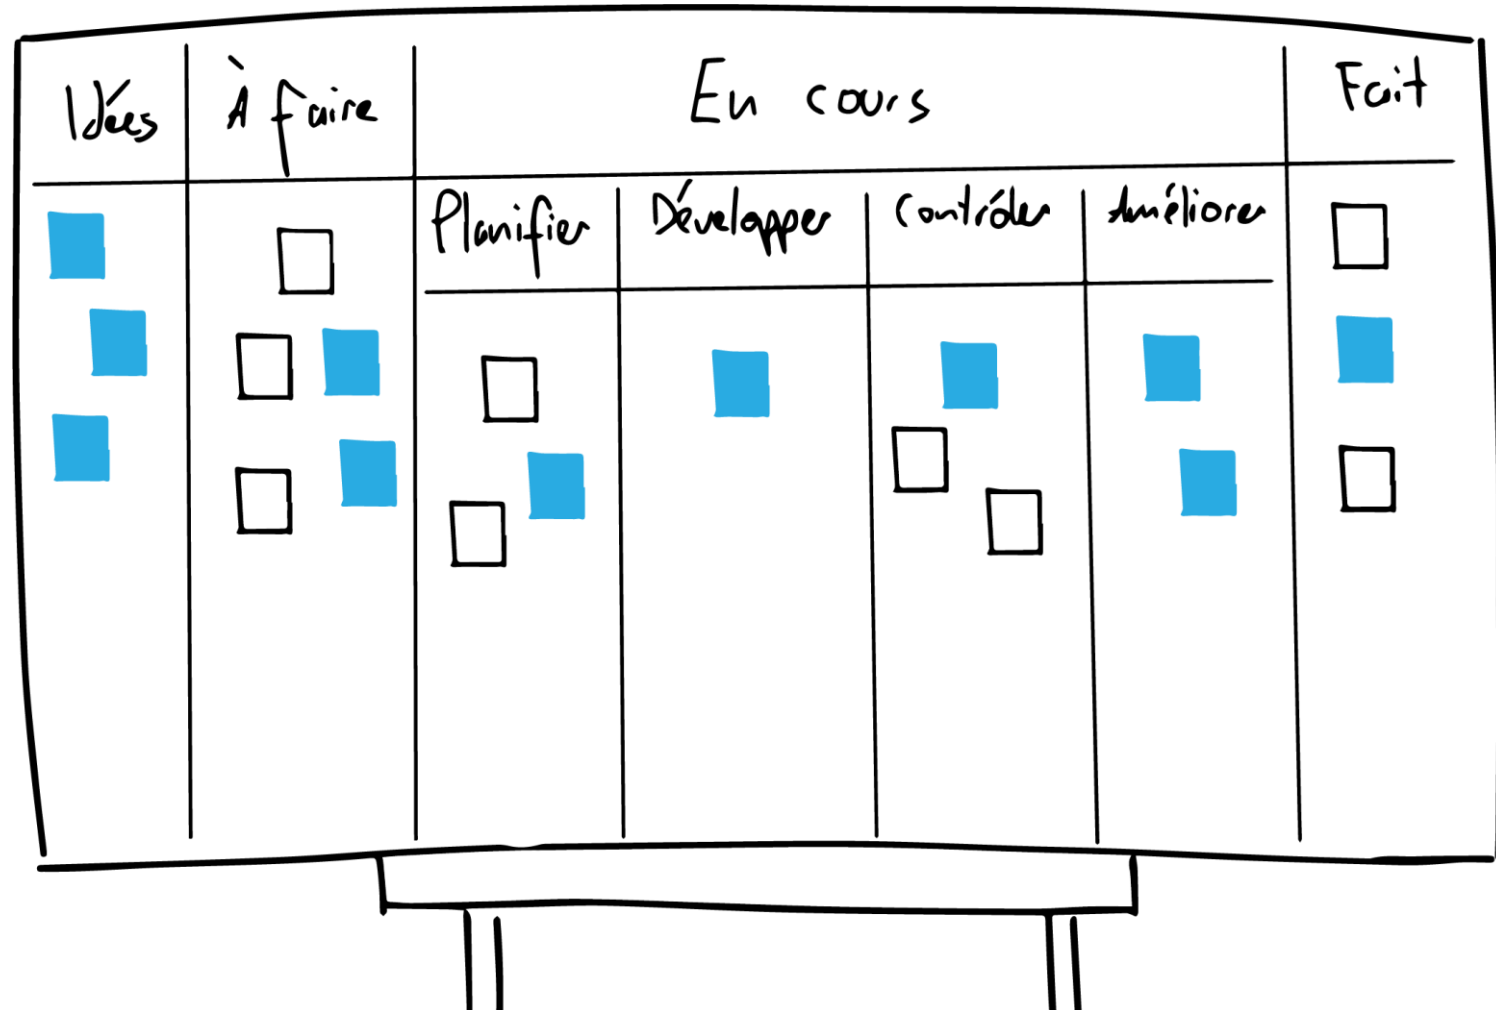


Kanban & Scrum


	Scrum	Kanban
Idéologie	Apprendre de ses expériences, s'organiser et hiérarchiser, et réfléchir à ses réussites et ses échecs afin de s'améliorer en permanence	Structure agile élaborée pour aider les équipes à répartir le travail selon la capacité de faire Via le tableau « kanban »
Cadence	Backlog produit > Sprints réguliers et à durée déterminée	Backlog produit > Flux continu
Bonnes pratiques	Planification du sprint, sprint, mêlée quotidienne, revue du sprint, rétrospective du sprint	Visualiser le flux de travail, limiter le travail en cours, gérer le flux, intégrer des boucles de rétroaction
Rôles	Product Owner, Scrum Master, développeur	Aucun rôle requis

DevOps / DevSecOps


- 2008 / Patrick Debois
Conférence Agile Toronto
Devopsdays » Gand / 2009
- On ne délègue plus pour déployer son application
- Contraintes de déploiement dès la phase de programmation
- Automatiser les cycles de vie des applications, du test à la mise en production.
- Résoudre les problèmes d'intégration, dépendances ...
- Parcourir la boucle le plus vite possible...

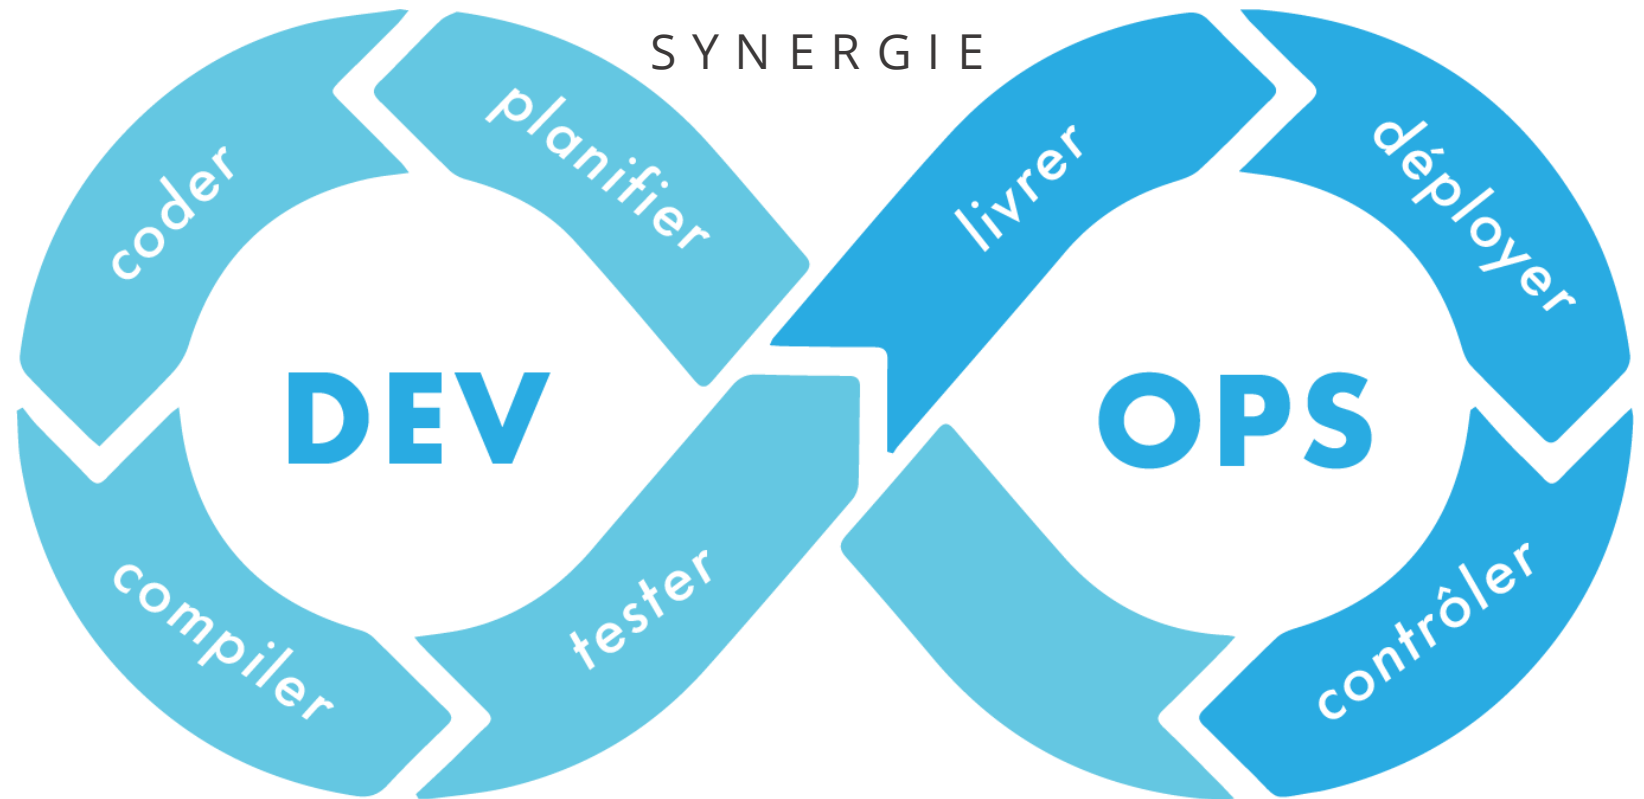

Les équipes agiles

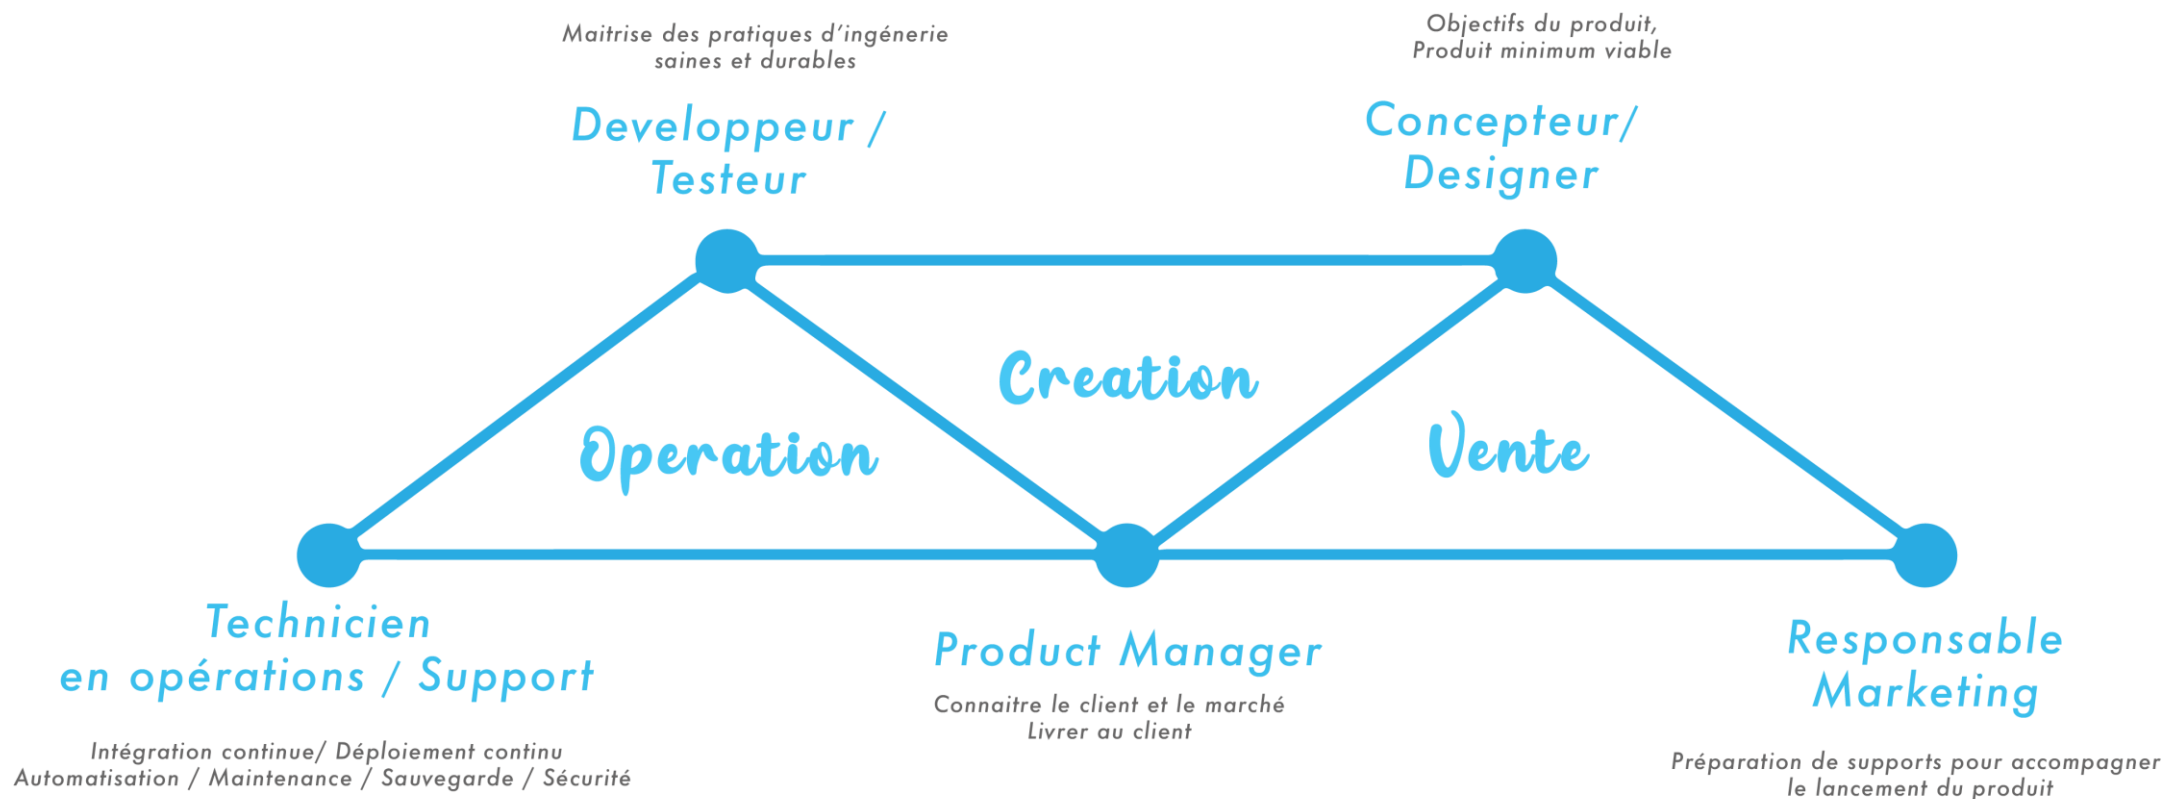

Quel terme illustre cette infographie ?

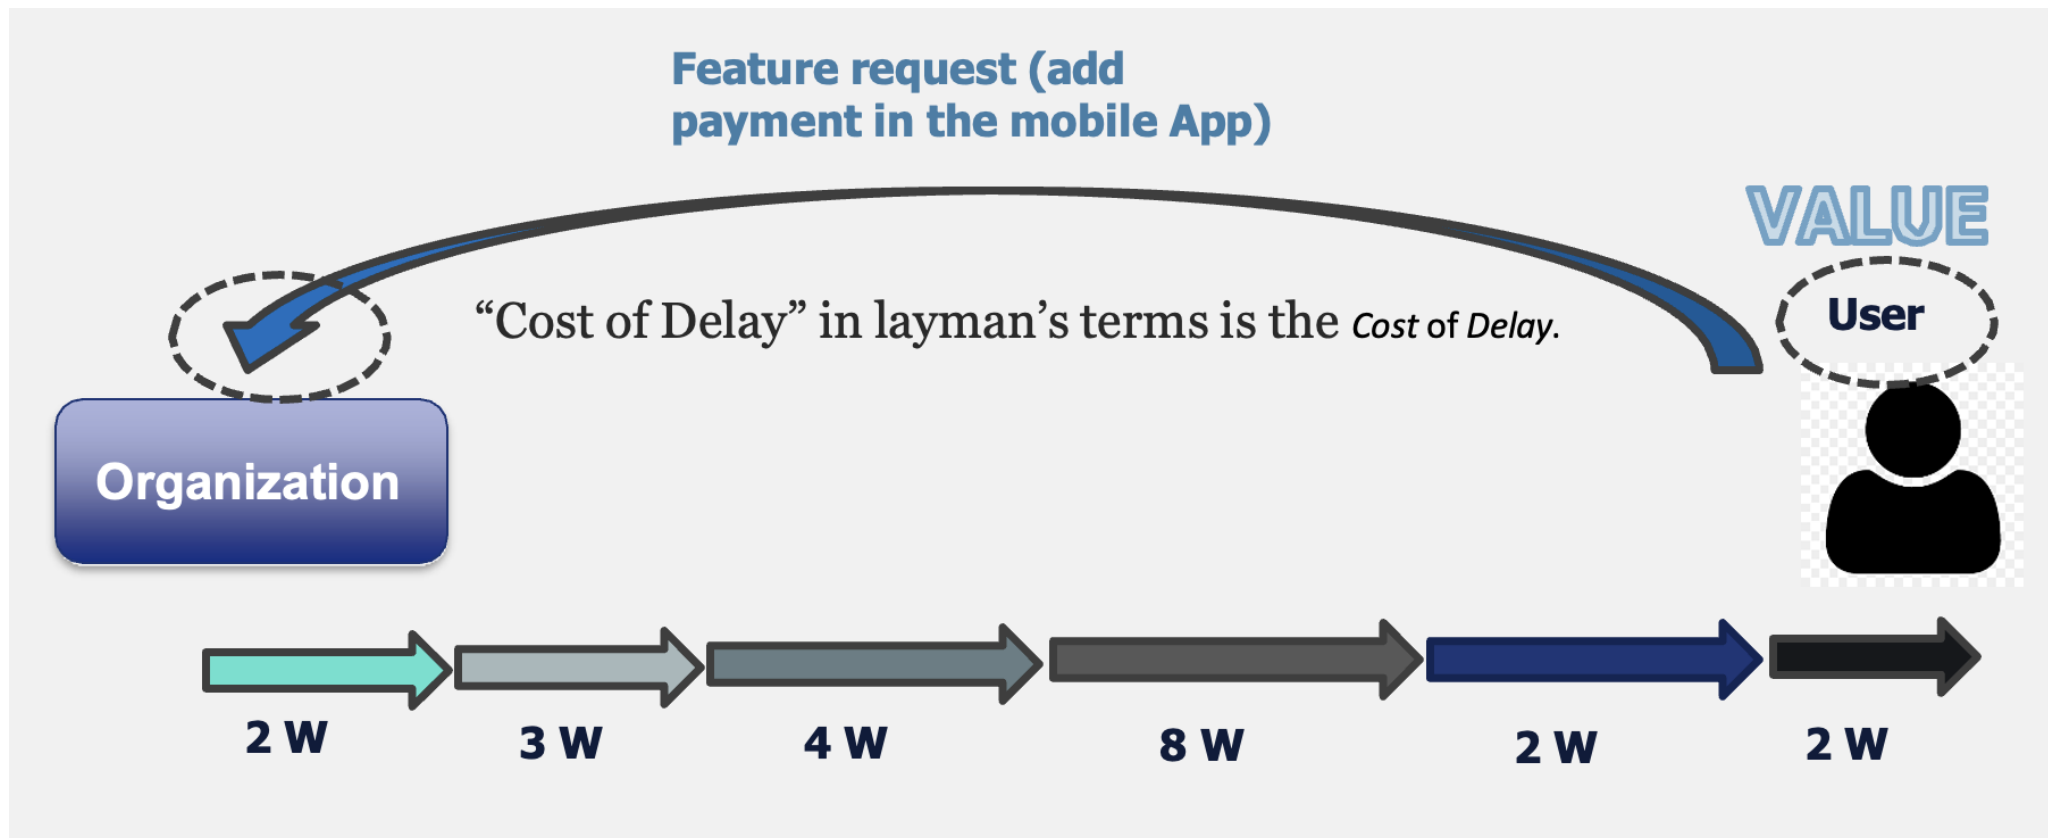

Time to market

« Combien cela nous coûterait-il si ce projet était retardé d'un mois ? »

Ou, inversement :

« Quelle serait la valeur pour nous si nous pouvions l'avoir un mois plus tôt ? »


L'émergence du Devops

=> l'émergence de **nouvelles méthodes d'interaction avec les clients finaux** et l'utilisation de **techniques de développement Agile**.

=> l'arrivée de **nouvelles technologies pour la gestion de l'infrastructure**, telles que :
la **virtualisation** : machine virtuelle pour utiliser plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur
le **cloud computing** : utilisation des ressources informatiques **à distance**, comme un service.

Résultat : il est devenu possible **d'organiser le travail en informatique de manière différente**.

L'émergence du Devops


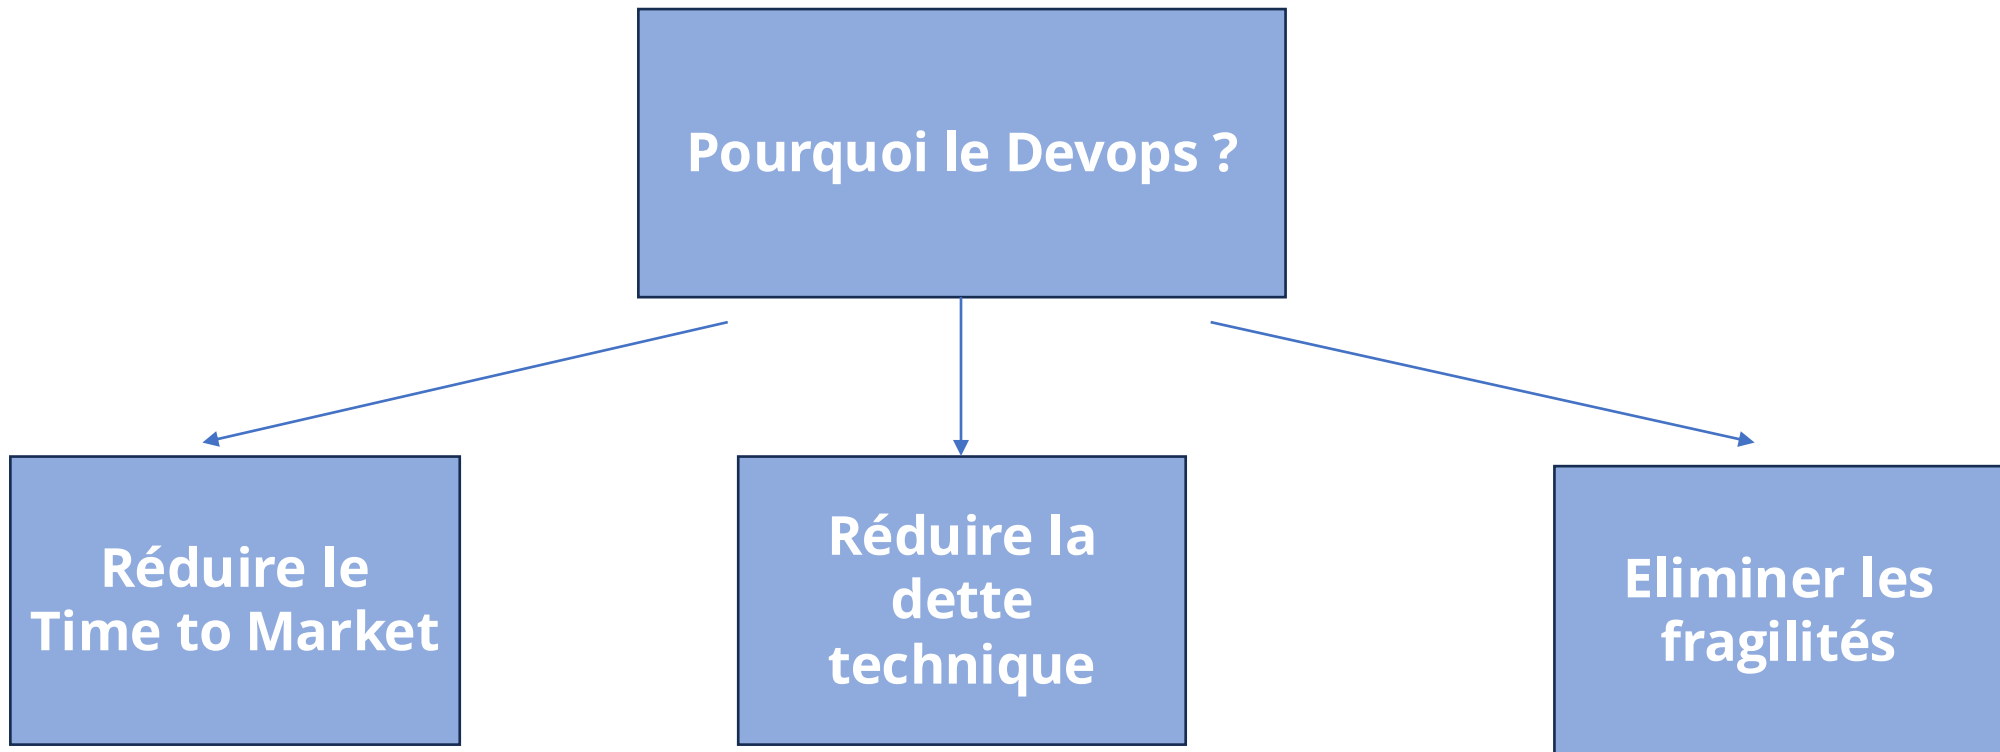


Dette technique

- Concept ayant pour but de sensibiliser les développeurs et les décideurs à l'impact d'un code mal réalisé.

Exemple :

- des bugs
- des parties de code devenues obsolètes
- un code qui ne va pas à l'essentiel
- non respect des normes de codage

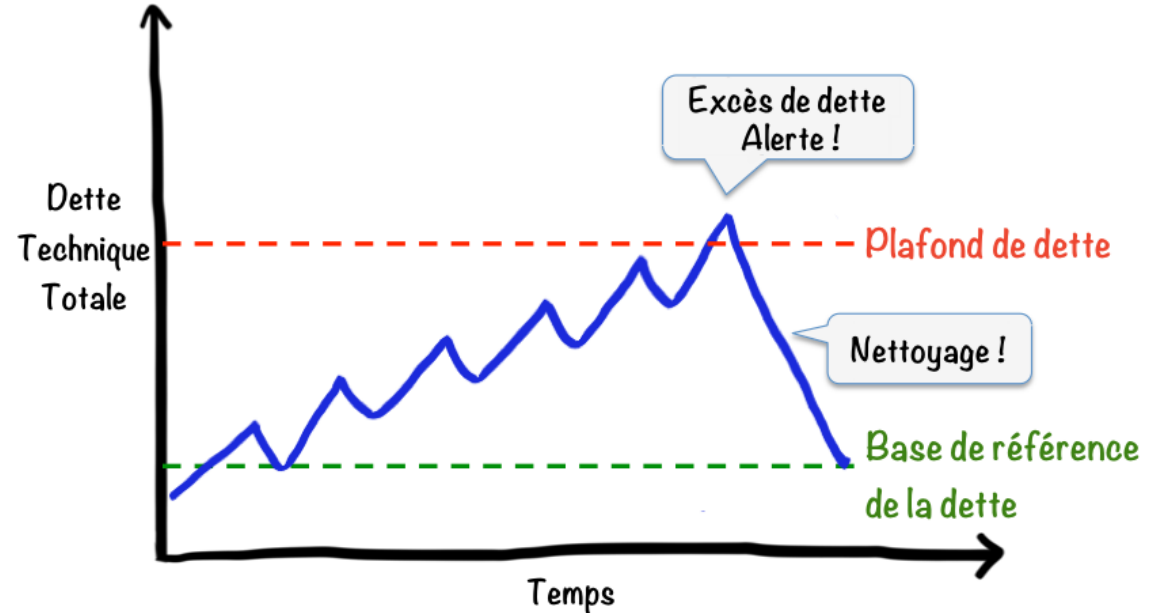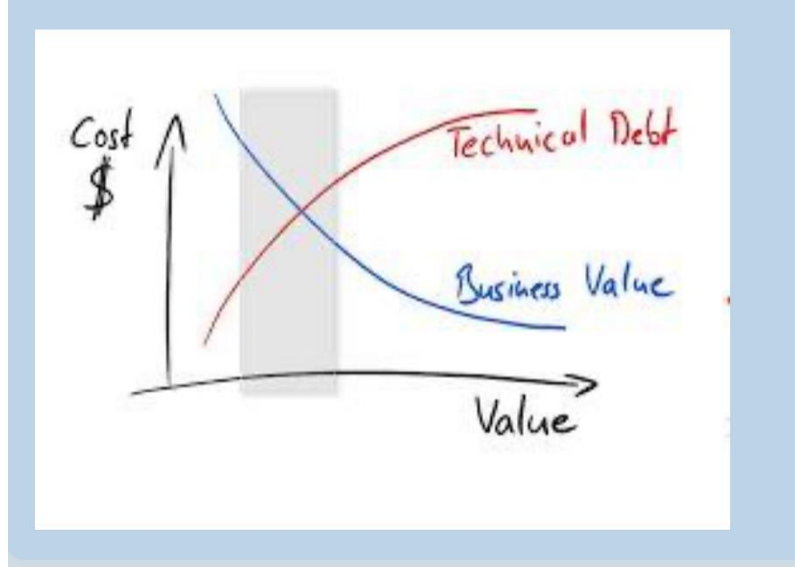

L'antifragilité

L'antifragilité est la capacité d'un système à devenir plus fort lorsqu'il est exposé à des facteurs

- De stress,
- des chocs,
- de la volatilité,
- des erreurs,
- des pannes,
- des attaques
- des échecs.

Mythe ou réalité ?

**« Le DevOps est un super-héros capable de coder, créer des tests,
déployer des environnements et gérer l'infrastructure. »**

Mythe ou réalité ?

« **Le DevOps est un super-héros capable de coder, créer des tests, déployer des environnements et gérer l'infrastructure.** »

Le DevOps est **un changement profond dans les services informatiques, qui ne peut pas être atteint simplement en recrutant plusieurs ingénieurs DevOps** ou en faisant appel à des experts externes.

La capacité à mettre en place une **chaîne de livraison logicielle** ne garantit pas le succès.
Le DevOps, ce **n'est pas juste une question d'outils**.
Ce sont surtout **des transformations organisationnelles majeures**, que ces outils peuvent **accompagner**, mais pas remplacer.


Devops, c'est quoi ?

DEVOPS n'est :

- Ni un **produit**,
- Ni un **framework**,
- Ni une **méthode**,
- Il n'a **pas fait l'objet d'un manifeste**,

Il n'existe **aucun consensus clair** : son créateur, **Patrick Debois**, n'a jamais vraiment défini **DevOps** de façon formelle.

Devops, c'est quoi ?

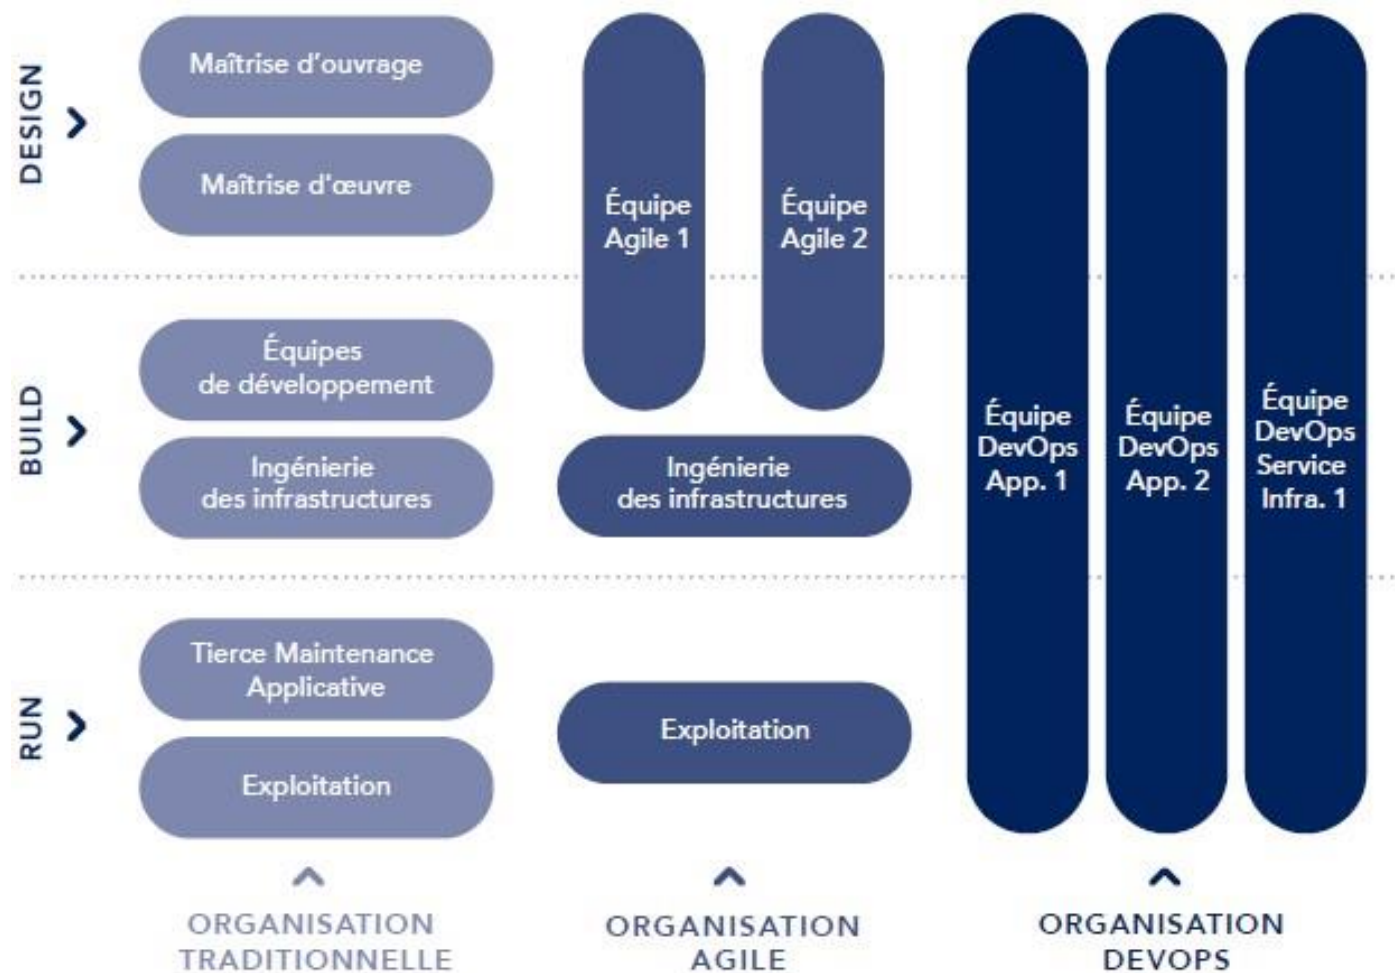


Devops, les principes clés

- Value Stream Mapping
- Deployment pipeline
- Version control.
- Configuration management
- Definition of Done

Value stream mapping

C'est une méthode visuelle pour **identifier toutes les étapes** (utiles ou inutiles) qu'une idée traverse pour devenir un produit fini.


Objectif : **repérer les gaspillages** et **améliorer la fluidité** du processus.

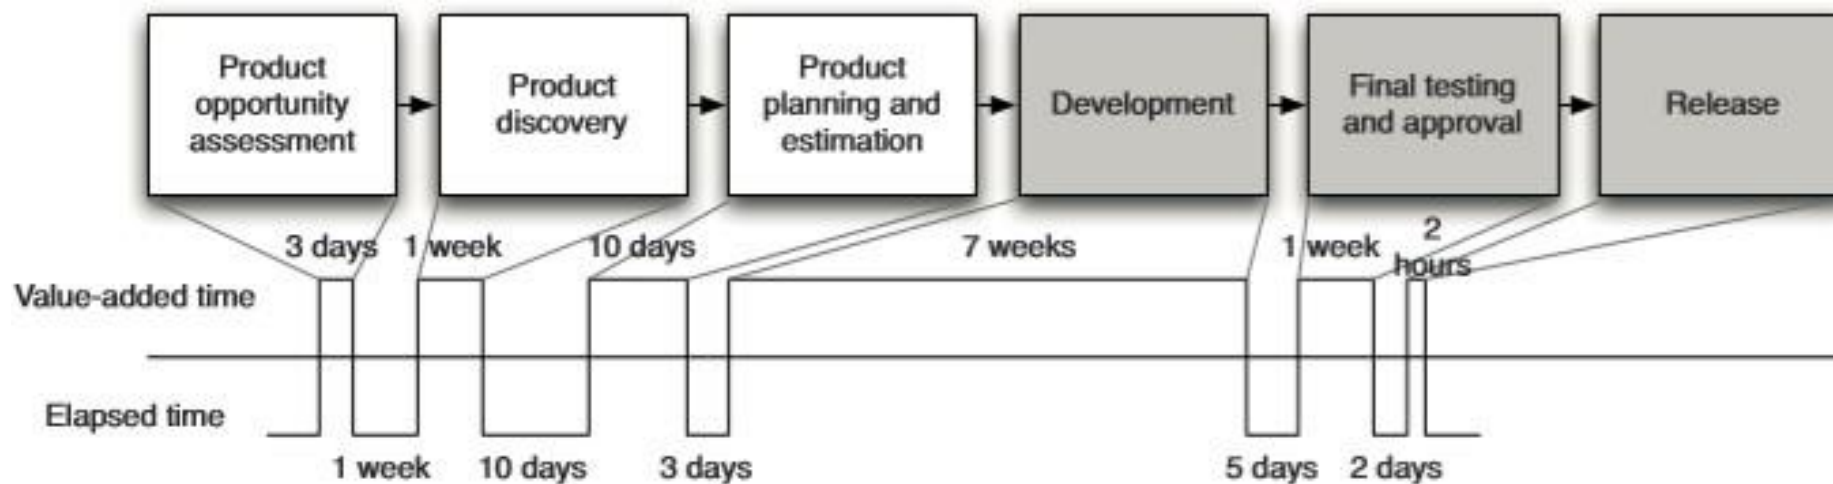

Déploiement de pipeline


C'est une suite automatisée d'étapes (tests, intégration, déploiement...) qui permet de **livrer du code en production rapidement et en toute sécurité**.

Cela garantit que le logiciel passe toujours par les mêmes contrôles avant d'être mis en ligne.

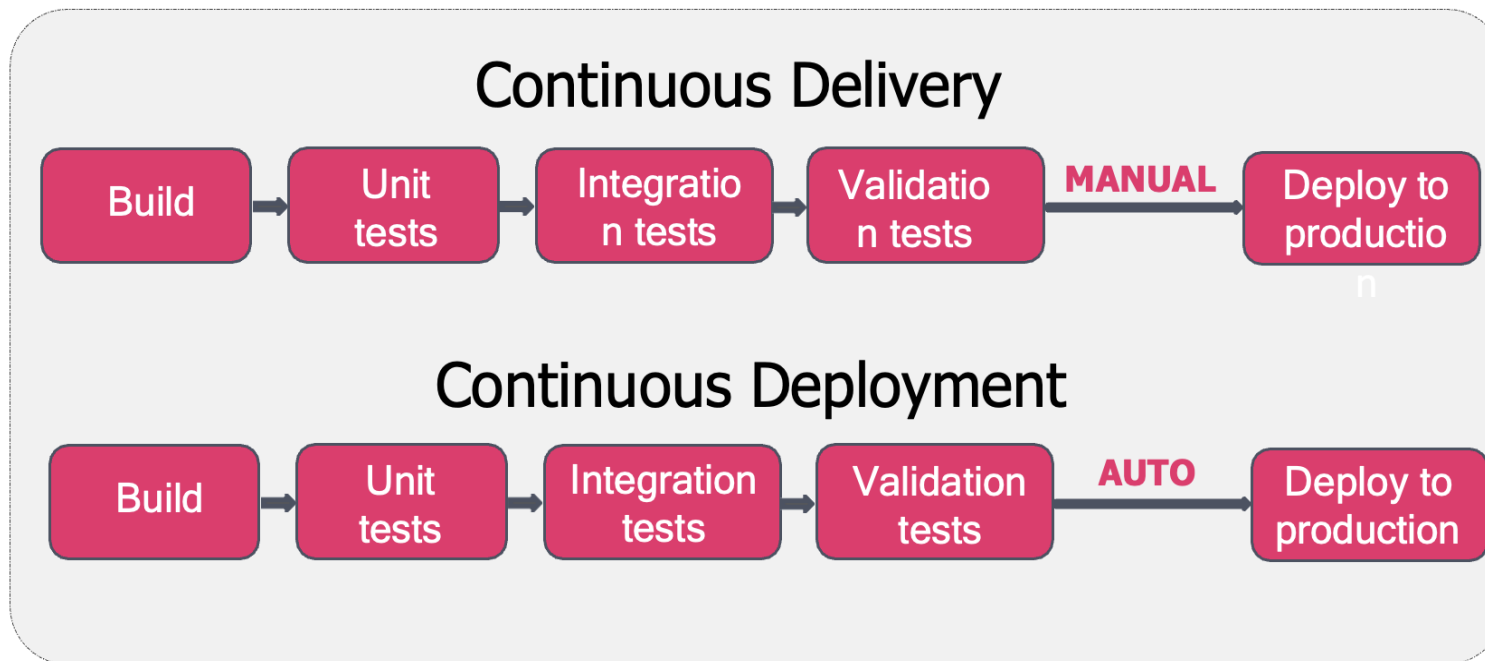

Contrôle des versions

C'est un système (comme Git) qui permet de **suivre toutes les modifications du code**, de collaborer à plusieurs, et de revenir en arrière si besoin.
Indispensable pour travailler en équipe sur un même projet.

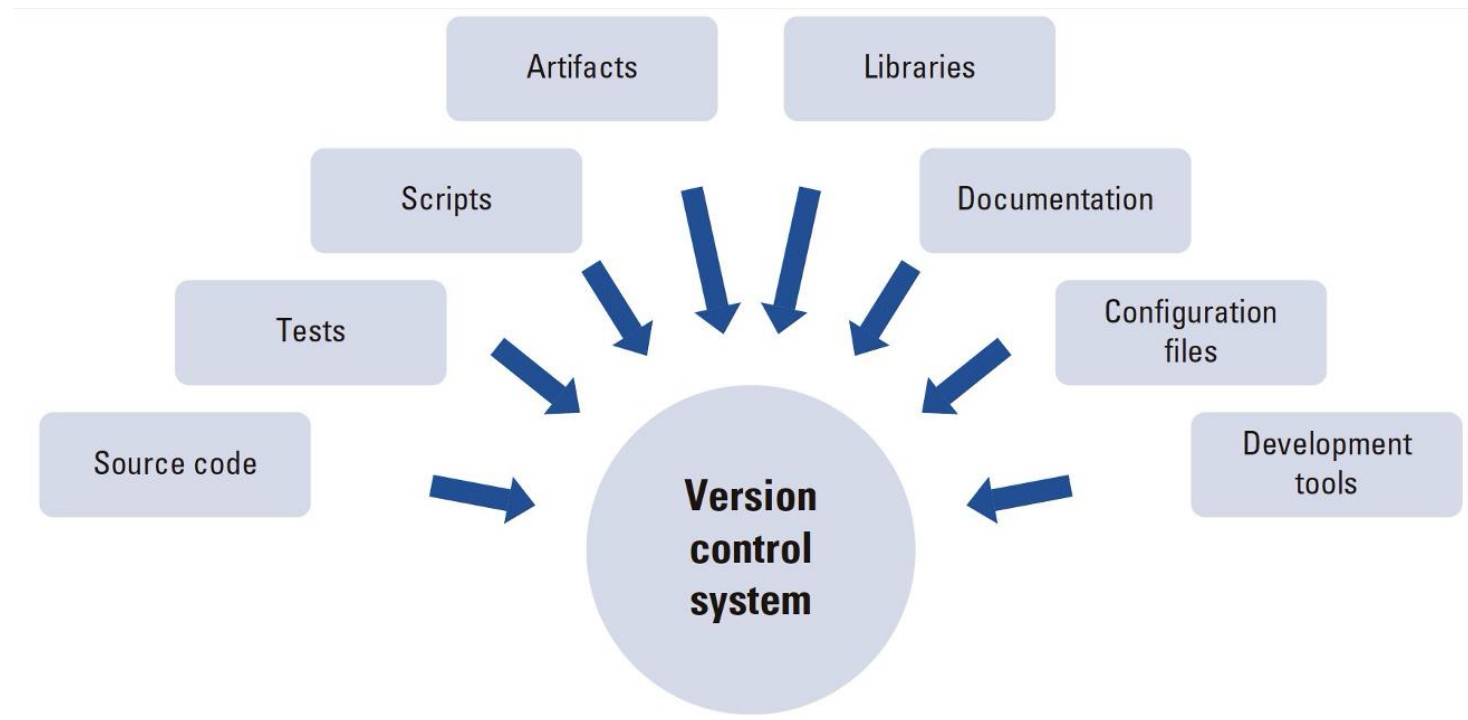

Gestion de la configuration


C'est le fait de **gérer et automatiser l'état des serveurs, applications et environnements**
- fichiers, logiciels installés, réglages...

Permet de garder des environnements cohérents et reproductibles
ex. avec Ansible, Puppet, Terraform...


Definition of done

C'est une **liste claire de critères** que chaque tâche ou fonctionnalité doit remplir pour être considérée comme **réellement terminée** (ex. : codée, testée, documentée, déployée).


Cela évite les malentendus et garantit la qualité.

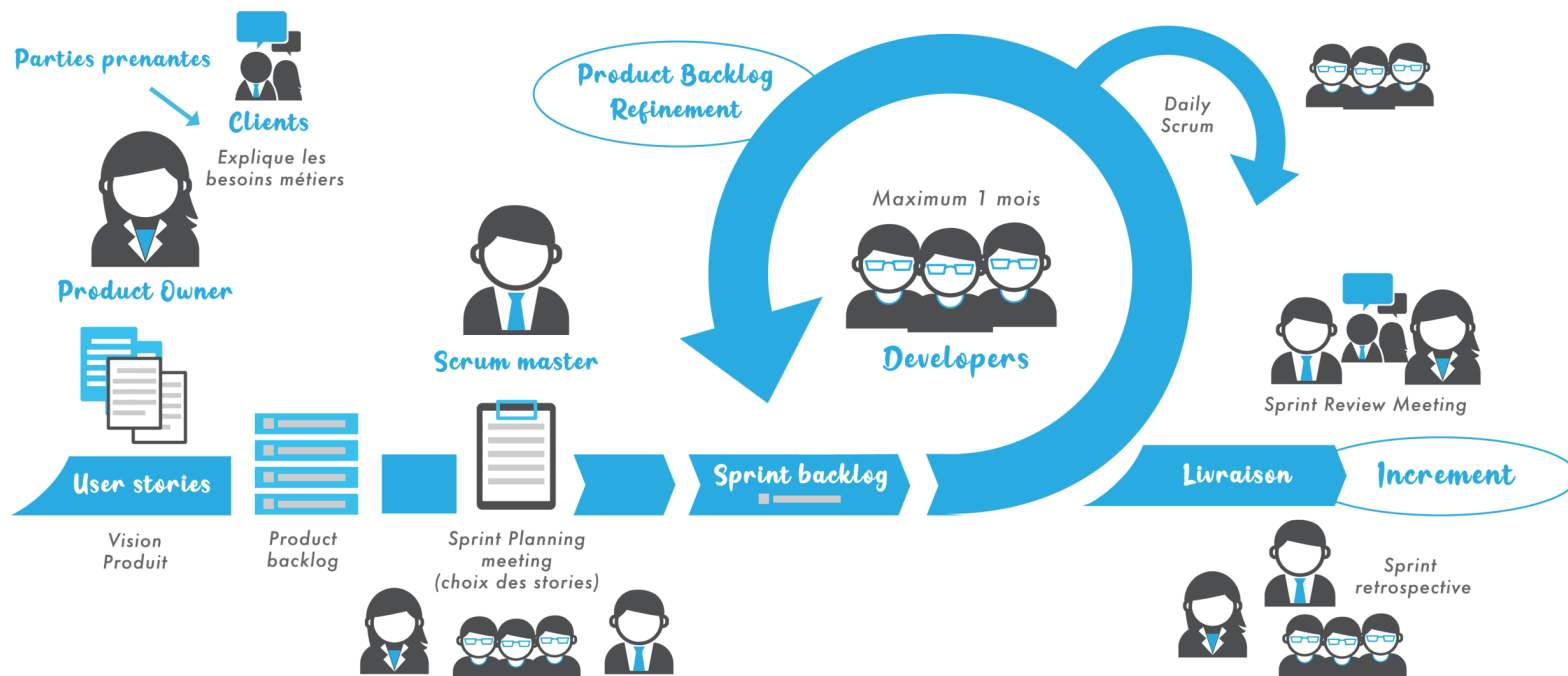

Une équipe Devops


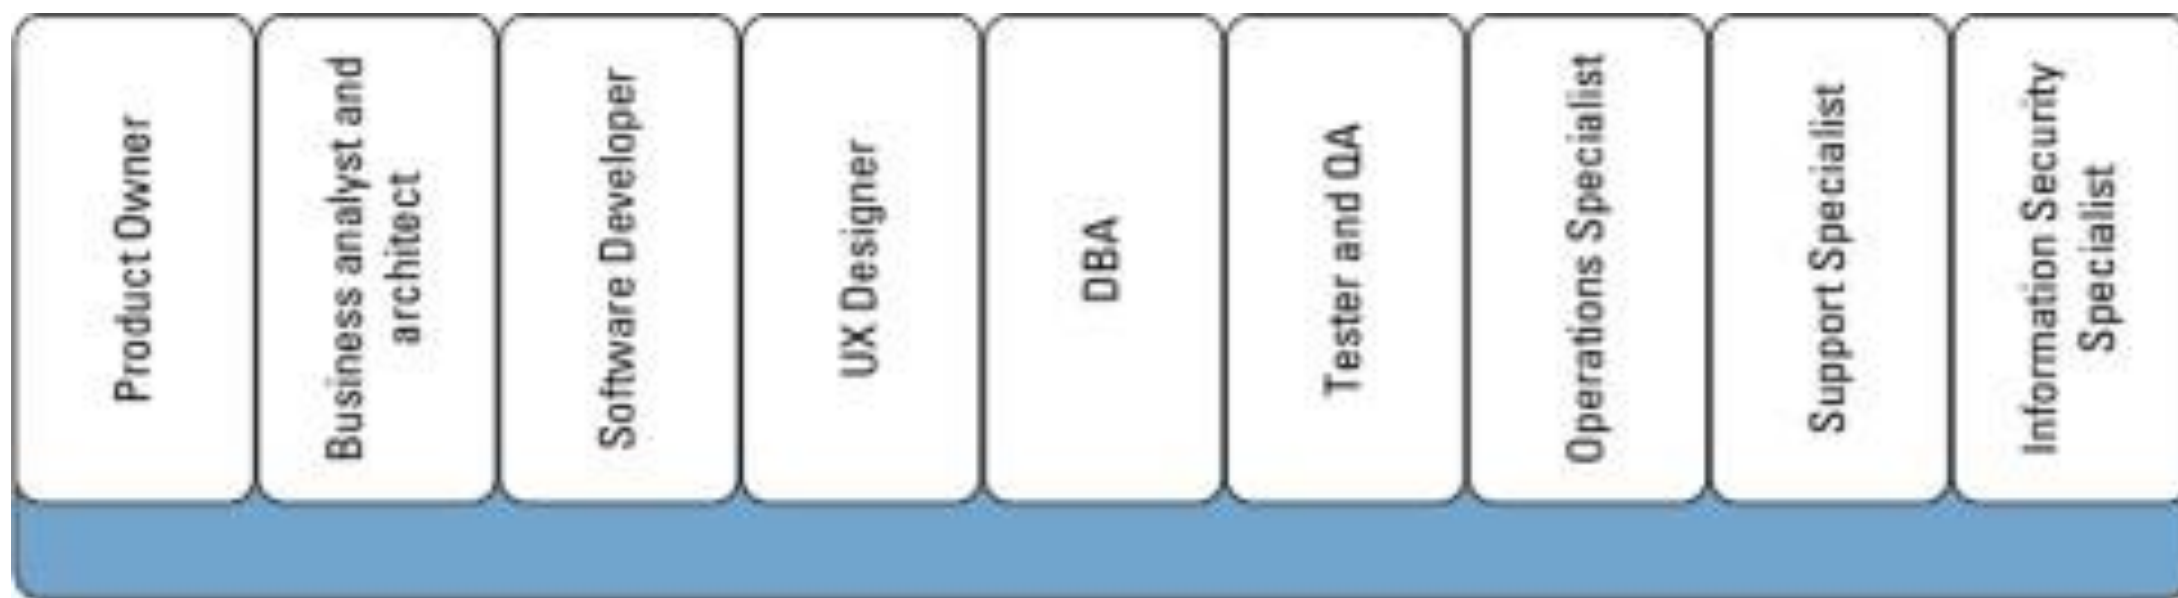


Le métro de l'agile par Agile alliance

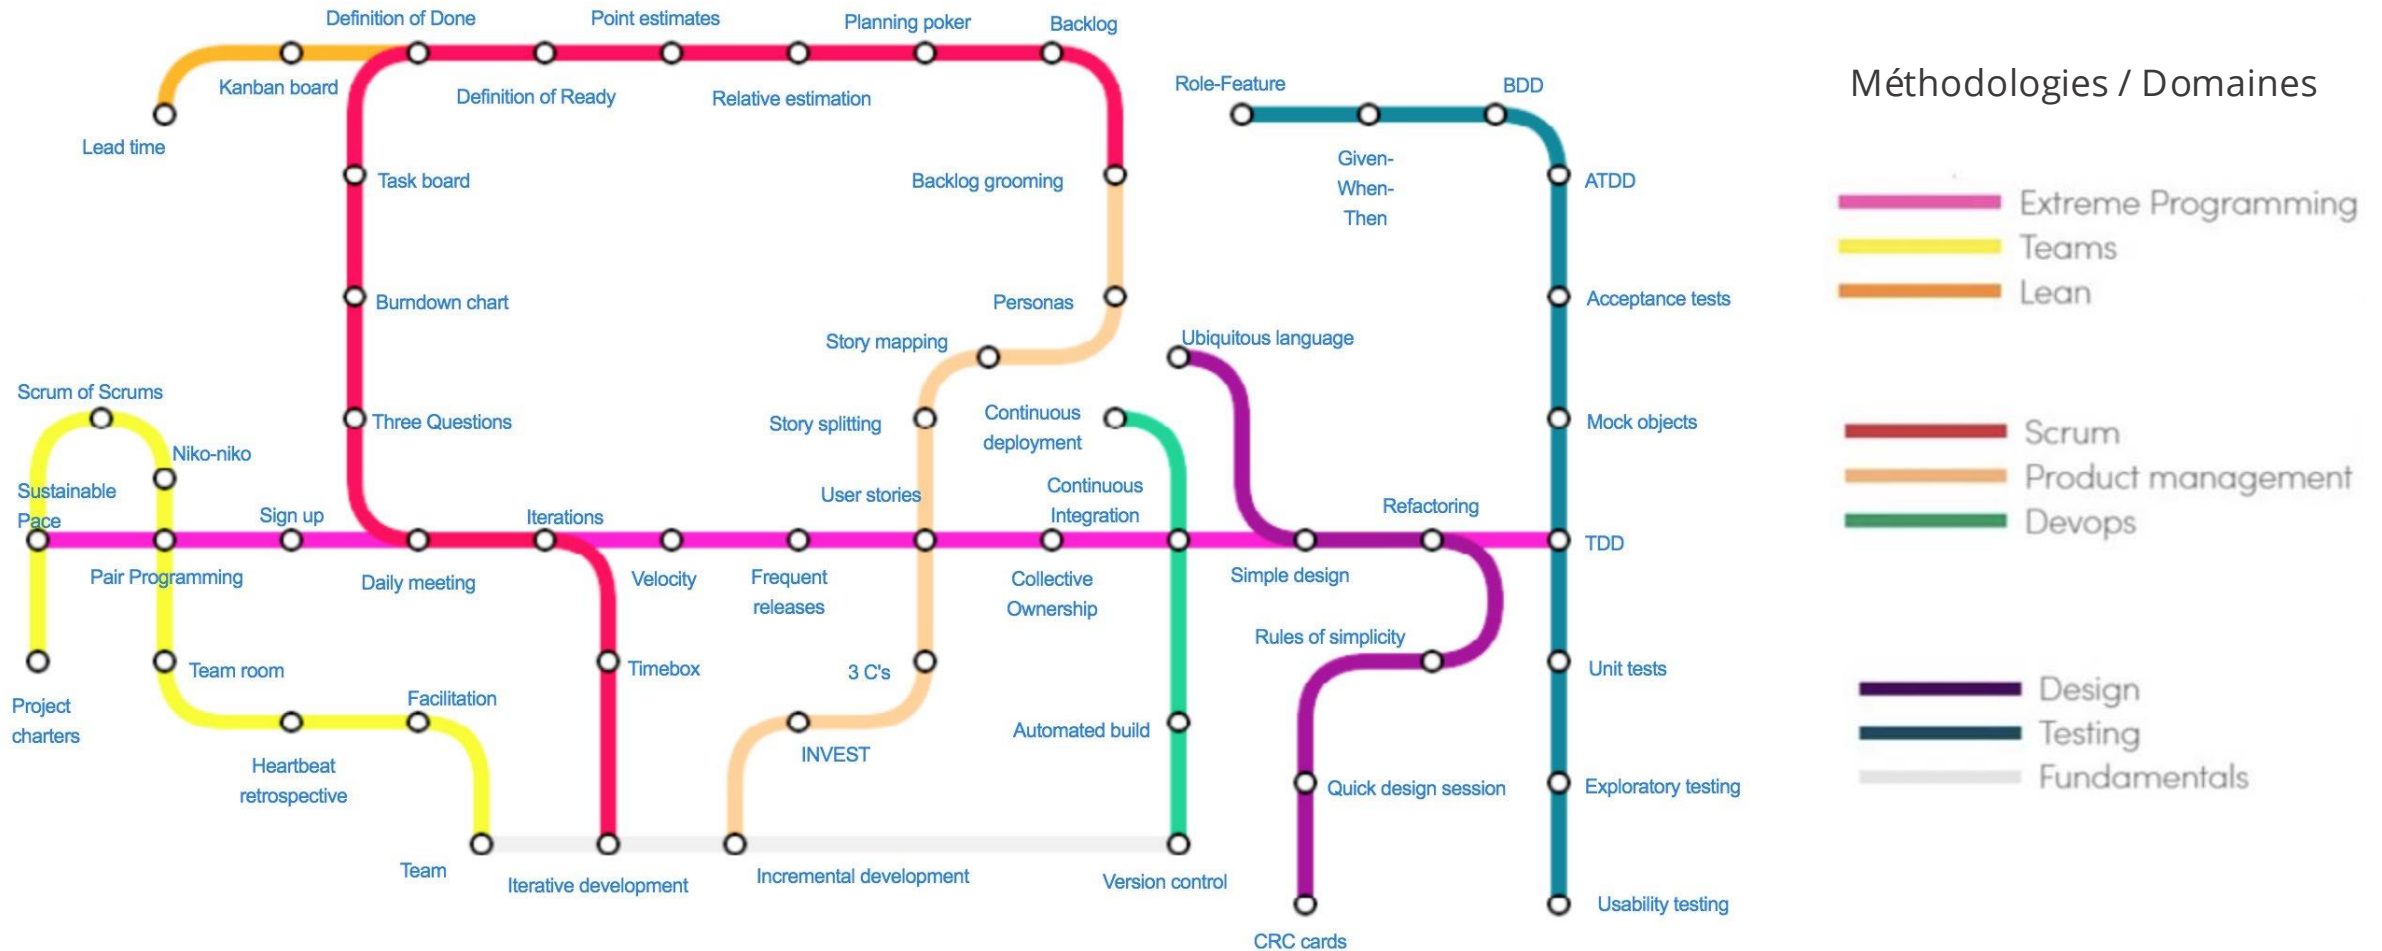

La transformation des organisations


D'une organisation Taylorienne à une organisation Agile

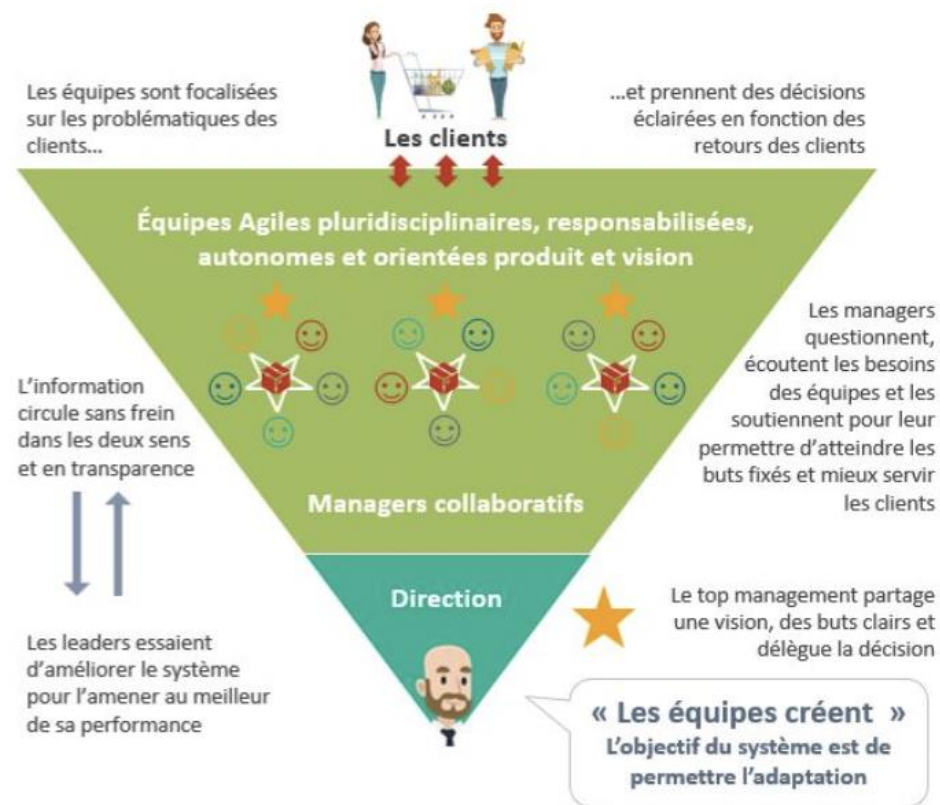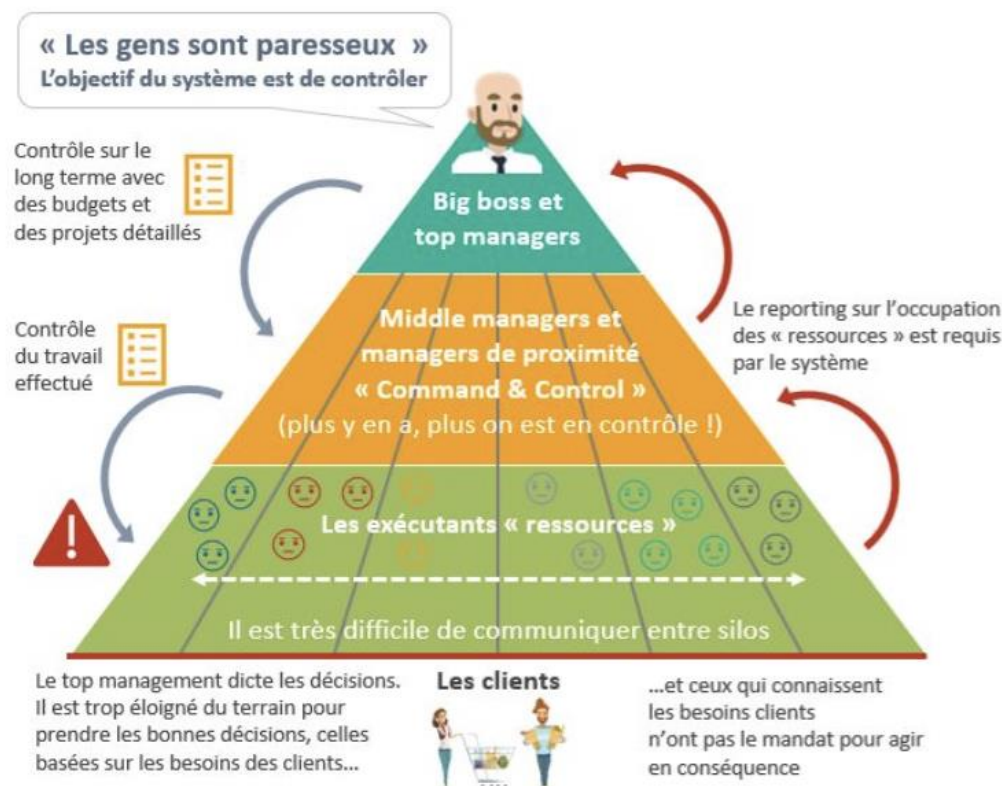

Source : LinkedIn : Jean Christophe Pagès

Le manager agile

Le manager Agile

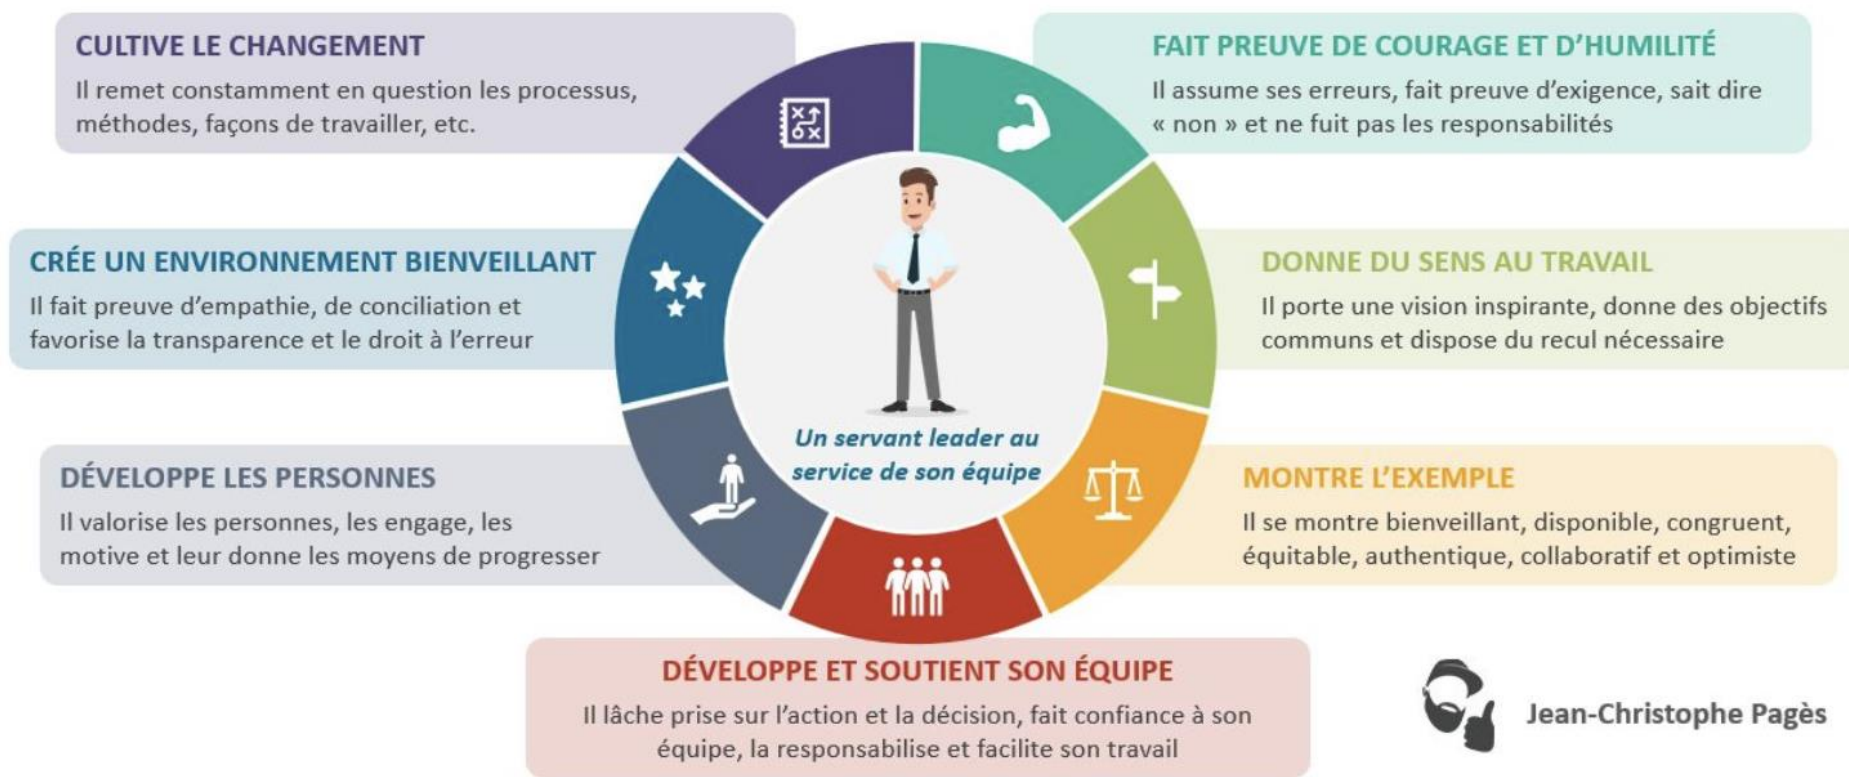

Jean-Christophe Pagès


Source : LinkedIn : Jean Christophe Pagès

Le coach agile

- De plus en plus présent dans l'organisation Agile
- Pas prévu par Scrum.org
- Rôle d'accompagnement sur l'agilité au sein de l'organisation à des moments clés :
 - Durant les phases de transition Agile / conduite du changement
 - Durant les phases de montée en compétence
 - Amélioration des pratiques de l'entreprise au niv. Managérial, organisationnel
- Il ne doit pas effacer le Scrum Master
- Scrum qui fonctionne mieux amène à une meilleure organisation agile

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**


INTRODUCTION

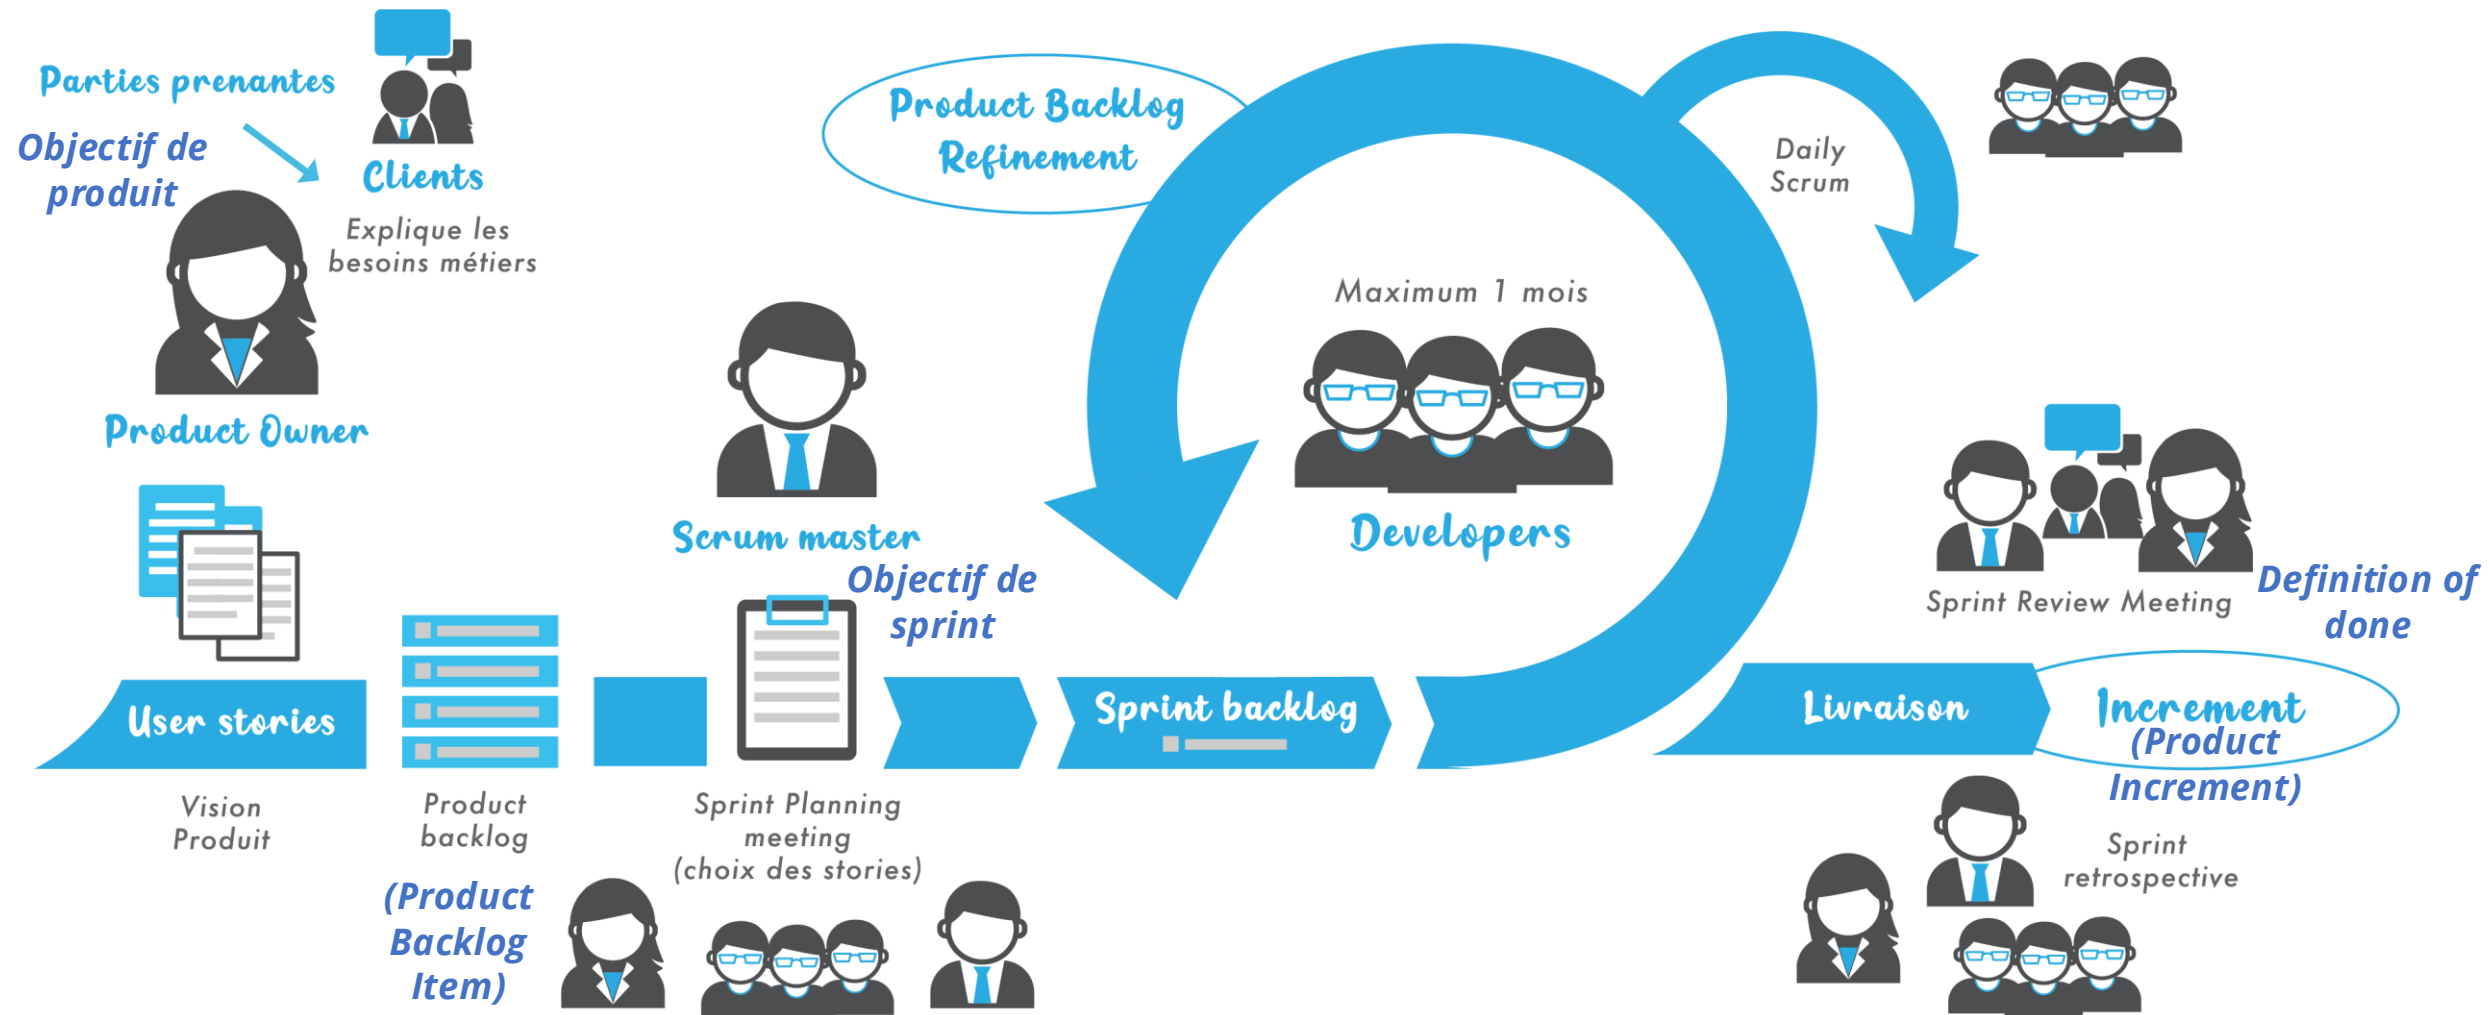

Scrum Guide

- 1^{ère} version en 2010 (pensé entre 1996-2010)
- Terme issu du Rugby (mêlée)
- Scrum Guide 2020 disponible en ligne
- Scrum n'est pas :
 - Une méthodologie
 - Une philosophie
 - Un principe
 - Une technique

Scrum est un FRAMEWORK

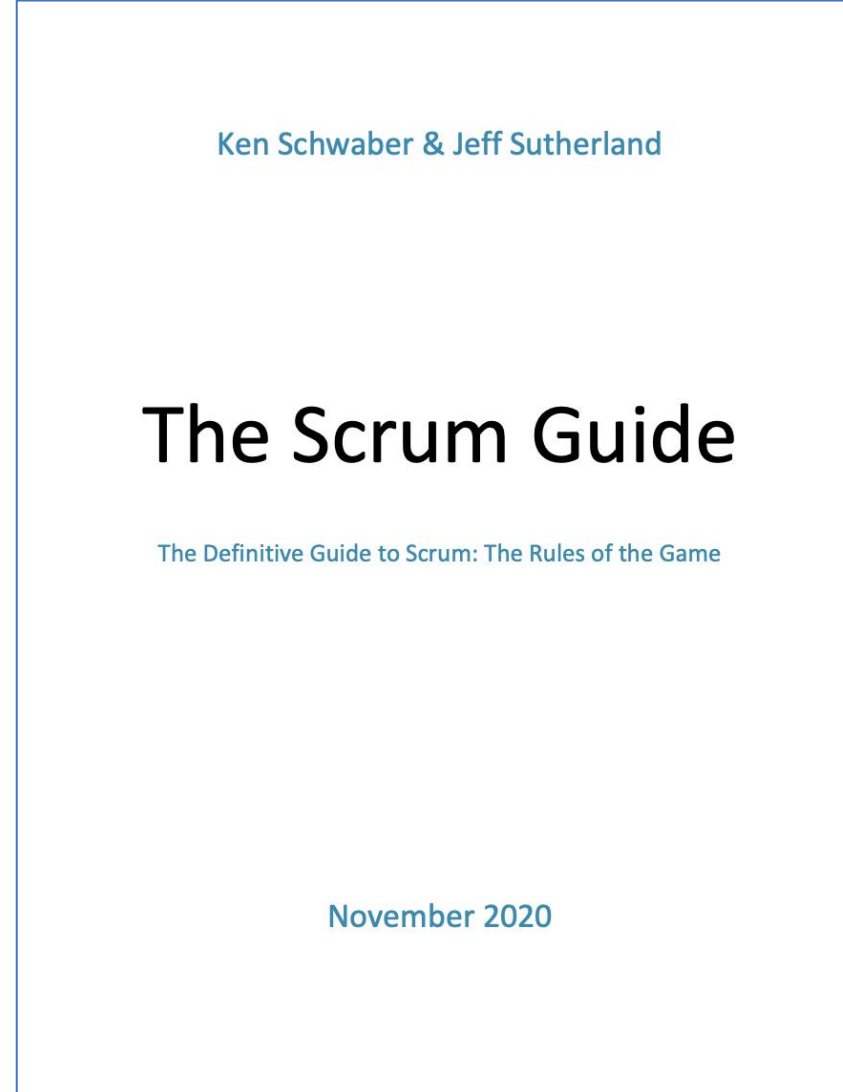

Scrum

- Extraits du Scrum Guide

« **Scrum est un cadre de travail léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes.** »

« Le cadre de travail Scrum est **volontairement incomplet**, ne définissant que **les parties nécessaires** pour mettre en œuvre la théorie Scrum. »


Quand utiliser scrum ?

- Quand le produit ou l'environnement est complexe et incertain
- Quand le produit est innovant
- Quand on a besoin de livrer rapidement une version du produit sur le marché
- Quand le client ne connaît pas bien son besoin
- Quand la technologie est instable et complexe
- Quand nous n'avons pas encore toutes les compétences
- Quand la gestion des ressources humaines est délicate


On ne l'utilise pas uniquement pour le développement logiciel mais aussi pour...
Marketing digital, design de produit, recherche et développement, évènementiel...

Scrum : Pilotage par la valeur

Not like this....

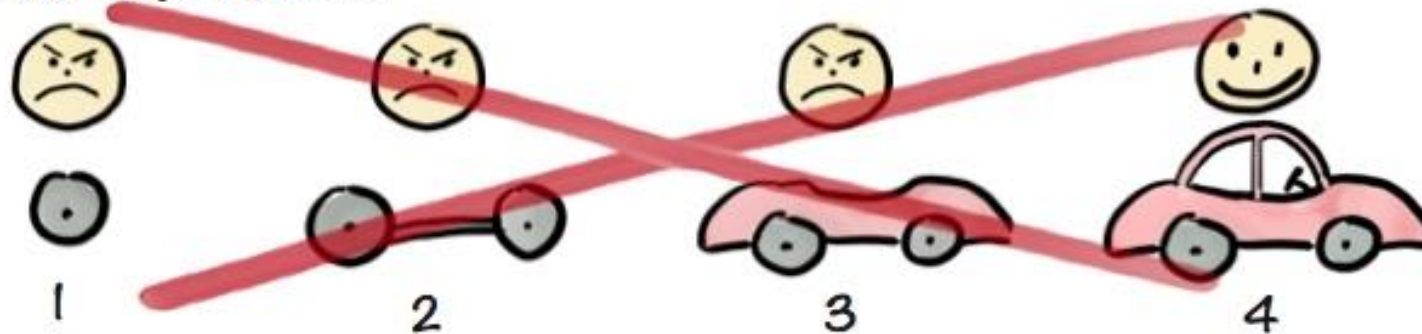


Like this!



Scrum : Pilotage par la valeur

- CHIFFRES DE 2014
 - 43% des clients de CRM utilisent moins de la moitié les fonctionnalités de leur CRM (CSO Insights)
 - Seulement environ 50% des fonctionnalités des CRM payés par les entreprises, sont effectivement utilisés (Butler Group).

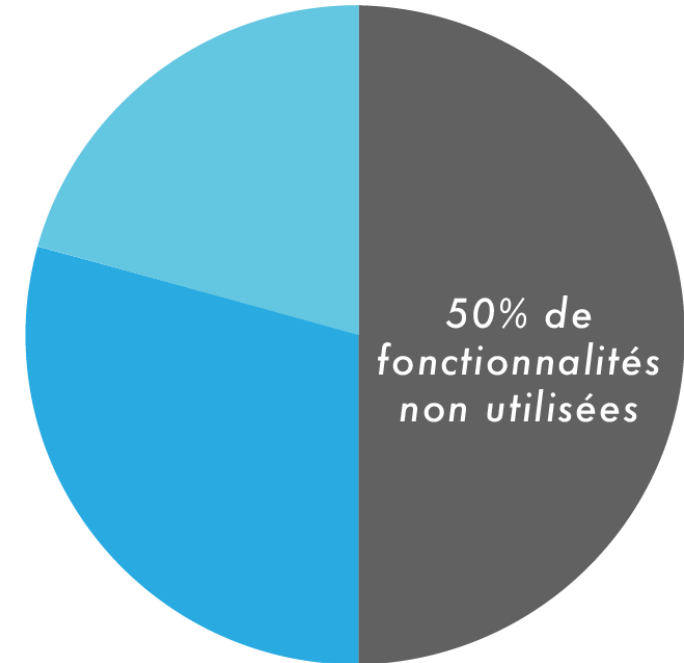


Serious Game



Serious Game

UNE PETITE HISTOIRE

- Il est approximativement 10h00 du matin et nous sommes mi-aout.
- Vous êtes dans le désert de Sonora au sud-ouest des Etats-Unis.
- L'avion léger bimoteur, contenant les corps du pilote et du co-pilote, a complètement brûlé. Il reste seulement l'armature de l'avion. Par chance personne n'est blessé parmi les survivants au crash !
- Le pilote n'a informé personne de votre position avant l'accident.
- Cependant, il a indiqué avant l'impact que vous étiez à 110 KM au sud, sud-ouest d'un camp de mineurs qui est l'habitation connue la plus proche, et que vous étiez approximativement à 80 KM de l'extérieur de votre couloir aérien prévu dans le plan de vol. La zone immédiate est tout à fait plate et excepté les cactus occasionnels, elle semble être plutôt déserte. Le dernier rapport météo a indiqué que la température atteindrait 41°C le jour, ce qui signifie une température au niveau du sol de 45°C. Vous êtes habillés de vêtement léger (chemisettes, pantalons légers, chaussettes et chaussures de ville.) Chacun a un mouchoir.
- Collectivement, vos poches contiennent 2.83 Euros en pièces, 85 Euros en billets, un paquet de cigarettes et un stylo bille.
- Avant que l'avion brûle, votre groupe a récupéré les 15 articles énumérés sur le slide suivant

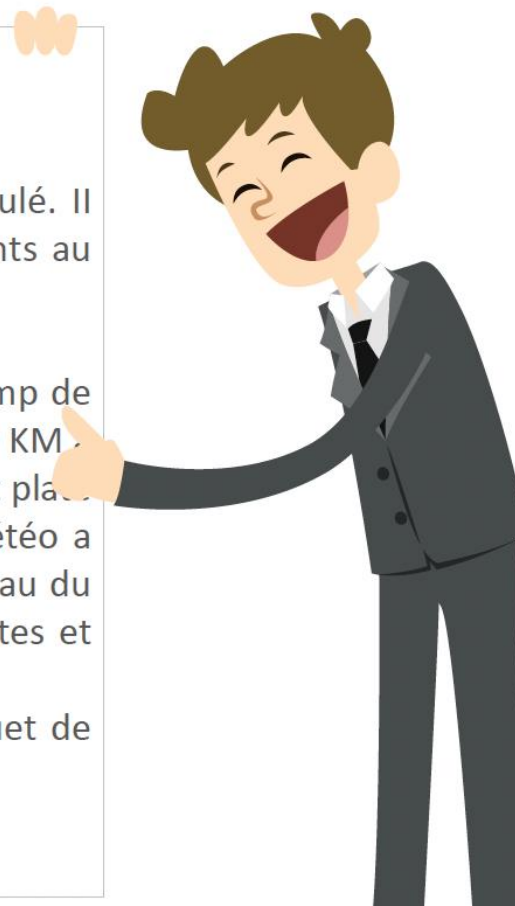

Serious Game

PERDUS DANS LE DÉSERT

COACH-AGILE.COM KIT D'ANIMATION

LES OBJETS RETROUVÉS 😊 DANS LE DÉSERT

Une paire de lunettes
de soleil (pour chaque
survivant)

Un parachute

2 bouteilles
de vodka

Un kit d'urgence avec
pansement

½ litre d'eau par personne

Une boussole

Plusieurs manteau
(pour chaque
survivant)

Une lampe de poche

Une carte aérienne de
la région

Un pancho en plastique
contre la pluie par
personne

Un livre :
l'encyclopédie de
la vie sauvage
dans le désert

Un couteau suisse

Un pistolet 45
chargé


Un miroir pour se
maquiller

Une boîte de
comprimés de sel

Serious Game

LA PRIORISATION DE LA NAVY

Objets	Réponse
Un miroir pour se maquiller	1
Un manteau (pour chaque survivant)	2
1/2 litre d'eau par personne	3
Lampe de poche	4
Un parachute	5
Un couteau suisse	6
Un pancho en plastique contre la pluie par personne	7
Un pistolet 45 chargé	8
Une paire de lunettes de soleil (pour chaque survivant)	9
Un kit d'urgence avec pansement	10
Une boussole	11
Une carte aérienne de la région	12
Un livre (encyclopédie de la vie sauvage dans le dessert)	13
2 bouteilles de vodka	14
Une boîte de comprimés de sel	15

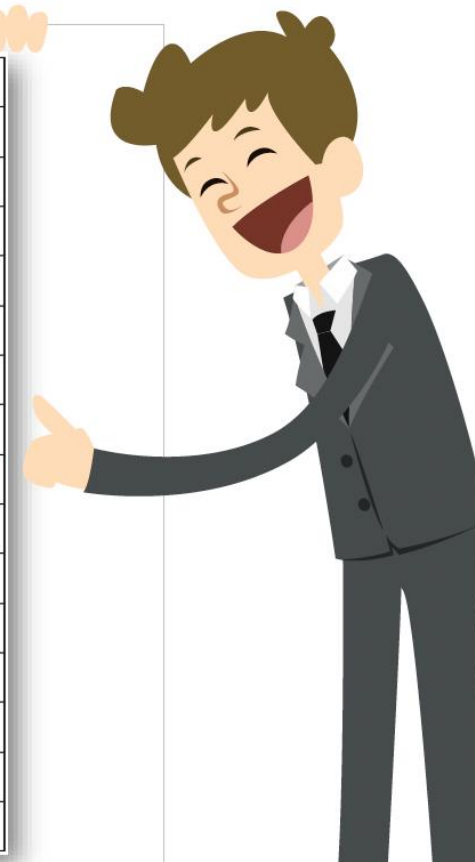

Serious Game

- PARTAGE D'UNE VISION COMMUNE
- POUR UN PROCESSUS DE DÉCISION SIMPLIFIÉ ET EFFICACE



Les 3 piliers

- Origine : Antiquité / médecine empirique
- Basé sur des observations et des faits mesurables
- Pratiquer l'empirisme revient à se baser sur l'expérience acquise pour optimiser l'environnement de production et le produit final.

Bienveillance
Droit à l'erreur

Collaboration
Transparence
Satisfaction client



Les 5 valeurs

- **Focus** (focus) : progresser le plus possible vers ces objectifs
- **Ouverture** (openness) : ouvertes sur le travail et les défis à relever.
- **Respect** (respect) : se respectent mutuellement pour être des personnes compétentes et indépendantes
- **Courage** (courage) : le courage de faire ce qu'il faut, de travailler sur des problèmes difficiles.
- **Engagement** (commitment) : se soutenir mutuellement

La maîtrise du temps

- Un des principes de Scrum est le fonctionnement en "Timeboxing", "Temps limité"
 - Respecter la durée d'une itération choisie facilite le rythme
- Durées typiques
 - Une itération peut durer maximum 4 semaines
 - La planification d'itération dure 8 heures pour une itération de 4 semaines
 - La mêlée (daily meeting) dure ¼ d'heure
 - La démo (revue) dure 4 heures pour une itération d'un mois
 - La rétrospective dure 3 heures pour une itération d'un mois
- Les évènements pour des sprints plus courts sont généralement plus court (sauf pour la daily)


Scrum en bref

- Un objectif général : construire de manière itérative et incrémentale des morceaux applicatifs à forte valeur ajoutée
- Un moyen : l'empirisme
- Un processus type et ses trois piliers
- Cinq valeurs fondamentales
- Des artefacts (Product backlog, Sprint Backlog & incrément)
- Des acteurs (Scrum master, Product Owner, Developpeurs)
- Des « événements »

Scrum n'est pas...

- Un solution miracle.
Il nécessite un vrai travail de mise en place et une forte discipline.
- Simple à optimiser.
Une véritable stratégie est nécessaire pour créer un processus de production adapté aux équipes, au produit, au contexte client etc...
- Une méthode autonome :
 - Cela doit se faire à partir de l'expérience de l'équipe par intégration de process et d'outils propres à l'organisation.
 - Et de l'apport d'autres méthodes, démarches et cadres de travail comme Kanban, XP...

Ce n'est pas juste un processus, c'est surtout comprendre pourquoi nous le faisons ?

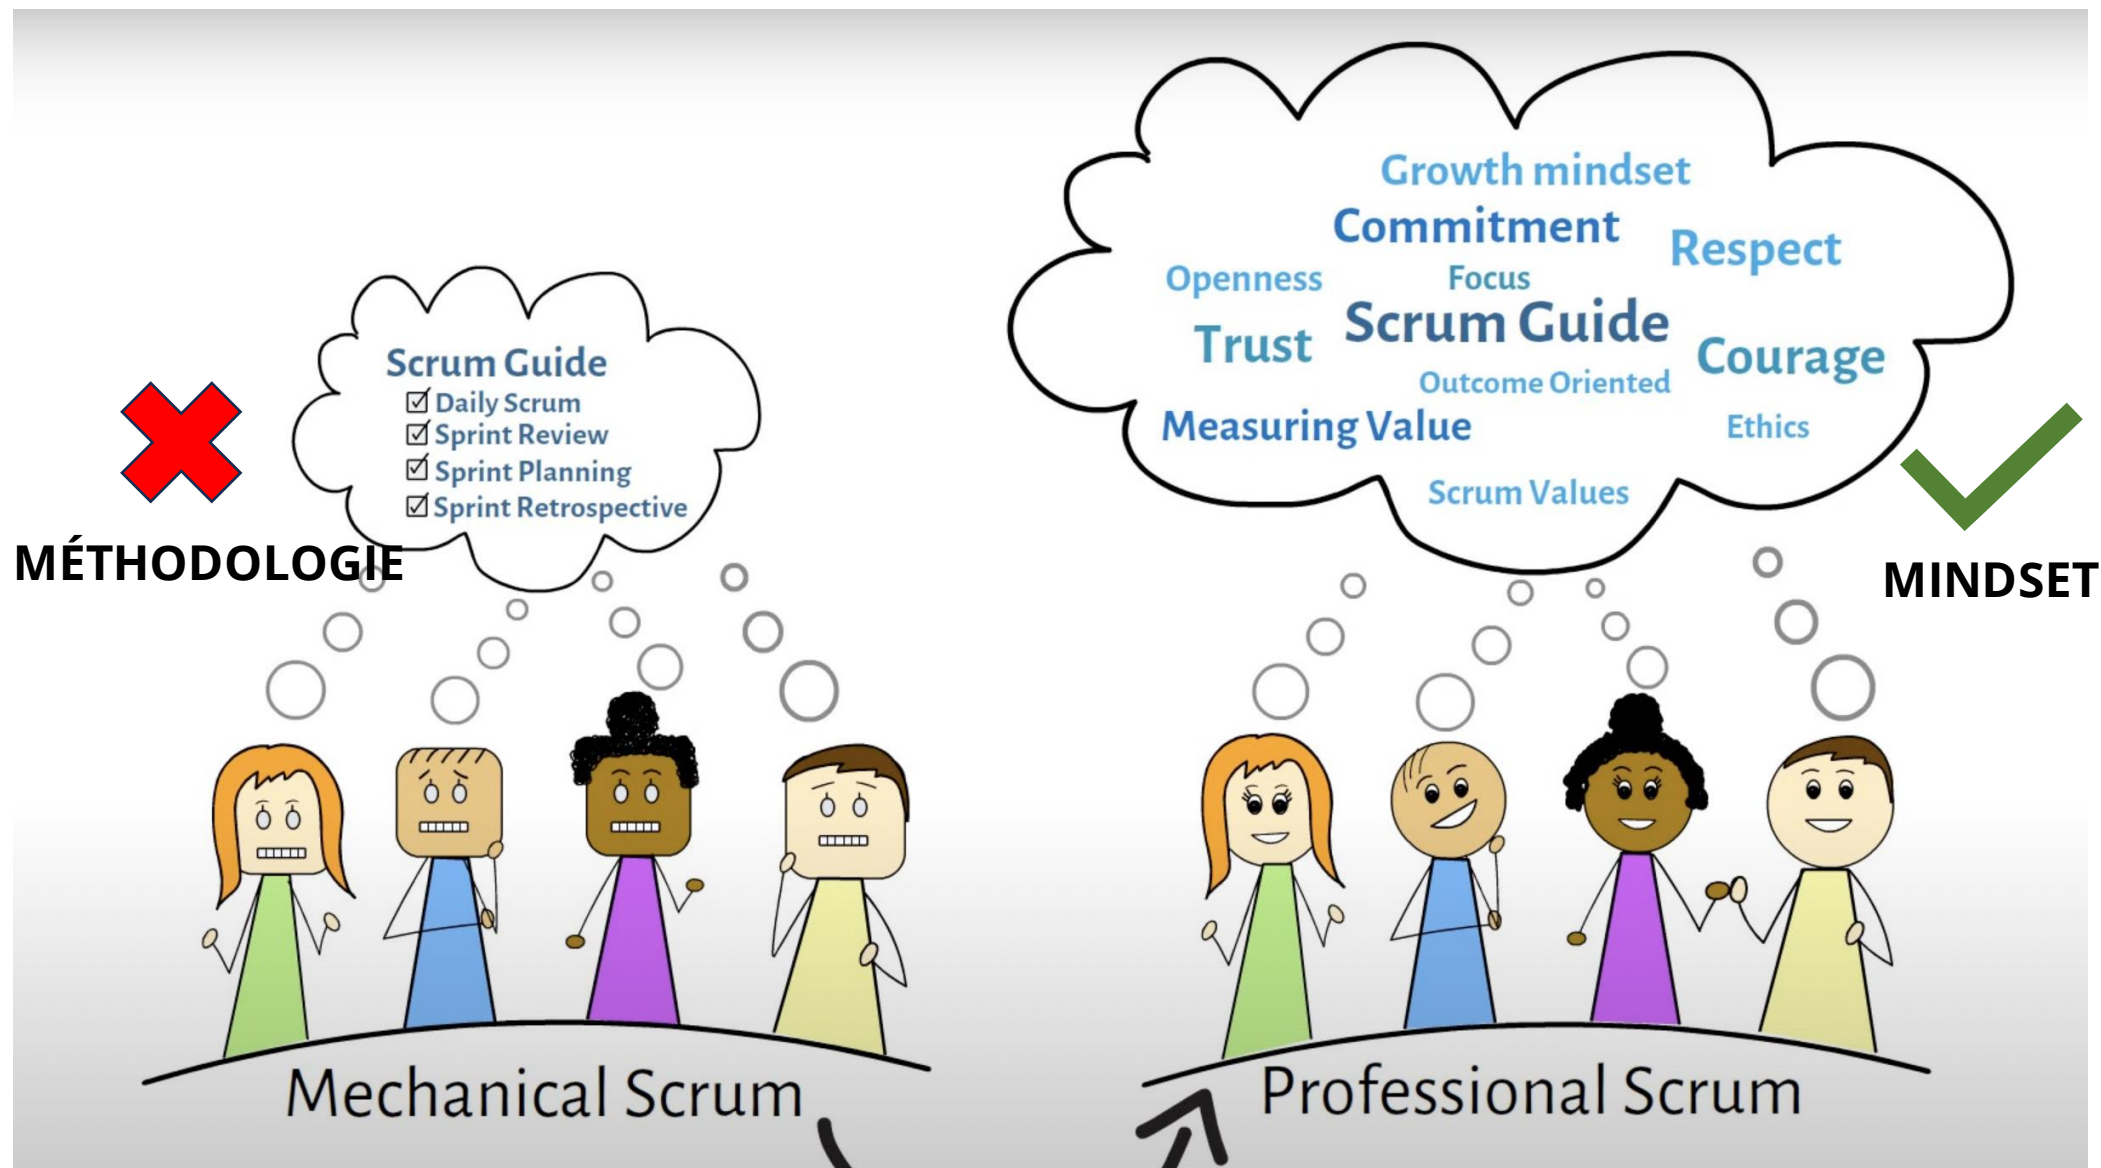



Quiz Scrum.org

- Scrum is a methodology for developing complex products.
 - a. TRUE
 - b. FALSE
- Scrum est une méthodologie de développement de produits complexes.
 - a. VRAI
 - b. FAUX

Quiz Scrum.org

- Scrum is a methodology for developing complex products.
 - a. TRUE
 - b. FALSE

Scrum est « considéré » comme un cadre, et non comme une méthodologie, un processus, des techniques, etc. Il peut être utilisé pour développer de nouveaux produits ou maintenir/soutenir ceux qui existent déjà.

Quiz Scrum.org

- **Scrum can be used for sustaining complex products.**

a. TRUE
b. FALSE

- **Scrum peut être utilisé pour soutenir des produits complexes.**

a. VRAI
b. FAUX

Quiz Scrum.org

- **Scrum can be used for sustaining complex products.**
- a. TRUE
- b. FALSE

Scrum est « considéré » comme un cadre, et non comme une méthodologie, un processus, des techniques, etc. Il peut être utilisé pour développer de nouveaux produits ou maintenir/soutenir ceux qui existent déjà.

Quiz Scrum.org

- **Which three statements show the result of changing Scrum terminology while implementing it in the organization?**
 - a. They will get better results adopting Scrum this way.
 - b. The change might not be obvious to everyone, and therefore very little change actually happens.
 - c. It's necessary to tailor Scrum to suit the project.
 - d. The change might not be obvious to everyone, and some benefits may be lost.
 - e. Management may feel less enthusiastic about the change.

Quelles sont les trois phrases qui montrent le résultat du changement de terminologie Scrum lors de sa mise en œuvre dans l'organisation ?

- a. Ils obtiendront de meilleurs résultats en adoptant Scrum de cette façon.
- b. Le changement n'est peut-être pas évident pour tout le monde et, par conséquent, très peu de changements se produisent réellement.
- c. Il est nécessaire d'adapter Scrum au projet.
- d. Le changement peut ne pas être évident pour tout le monde et certains avantages peuvent être perdus.
- e. La direction peut se sentir moins enthousiaste face au changement.

Quiz Scrum.org

Quelles sont les trois déclarations qui montrent le résultat du changement de terminologie Scrum lors de sa mise en œuvre dans l'organisation ?

- a. Ils obtiendront de meilleurs résultats en adoptant Scrum de cette façon.
- b. Le changement n'est peut-être pas évident pour tout le monde et, par conséquent, très peu de changements se produisent réellement.
- c. Il est nécessaire d'adapter Scrum au projet.
- d. Le changement peut ne pas être évident pour tout le monde et certains avantages peuvent être perdus.
- e. La direction peut se sentir moins enthousiaste face au changement.

Scrum est un cadre simple plutôt qu'une méthodologie complète, et il ne contient que le minimum nécessaire dont vous avez besoin dans chaque projet. Ainsi, au lieu d'une adaptation normale (ajustement des éléments existants), vous suivrez tout ce qui est décrit dans Scrum, et l'adapterez à votre projet par les pratiques et techniques que vous ajouterez ; par exemple. Planification du poker, programmation en binôme et développement piloté par les tests. En ce qui concerne la terminologie, Scrum.org pense qu'il vaut mieux ne pas la changer.

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are pillars of Scrum?**

- a. Adaptation
- b. Inspection
- c. Collaboration
- d. Transparency
- e. Creativity
- f. Value optimization

Parmi les éléments suivants, lesquels sont trois piliers de Scrum ?

- a. Adaptation
- b. Inspection
- c. Collaboration
- d. Transparence
- e. Créativité
- f. Optimisation de la valeur

Quiz Scrum.org

Which three of the following are pillars of Scrum?

- a. Adaptation
- b. Inspection
- c. Collaboration
- d. Transparency
- e. Creativity
- f. Value optimization

Les piliers sont la transparence, l'inspection et l'adaptation. Assurez-vous de ne pas confondre ces piliers avec les valeurs Scrum (engagement, courage, concentration, ouverture et respect).

Quiz Scrum.org

- **Which three Scrum values are demonstrated by focusing on the most valuable items first?**
- a. Self-organization
- b. Focus
- c. Courage
- d. Inspection
- e. Respect

Quelles sont les trois valeurs Scrum démontrées en se concentrant d'abord sur les éléments les plus précieux ?

- a. Auto-organisation
- b. Focus
- c. Courage
- d. Inspection
- e. Respect

Quiz Scrum.org

- **Which three Scrum values are demonstrated by focusing on the most valuable items first?**
 - a. Self-organization
 - **b. Focus**
 - **c. Courage**
 - d. Inspection
 - **e. Respect**
- d. C'est un des piliers, mais pas une des valeurs.
Les valeurs de Scrum sont l'engagement, le courage, la concentration, l'ouverture et le respect.

Quiz Scrum.org

- **Which two statements are correct about Daily Scrums?**

- a. It's 15 minutes only if the Sprint is one month long.
- b. The Product Owner should attend the meeting.
- c. It's always a 15-minute timeboxed event, no matter how many developers there are, or how long the Sprint is.
- d. It's held at the same time and place every day.
- e. It's facilitated by the Scrum Master.

- **Quelles sont les deux affirmations correctes concernant les Daily Scrum ?**

- a. C'est 15 minutes seulement si le Sprint dure un mois.
- b. Le Product Owner doit assister à la réunion.
- c. Il s'agit toujours d'un événement chronométré de 15 minutes, quel que soit le nombre de développeurs ou la durée du Sprint.
- d. Il a lieu tous les jours à la même heure et au même endroit.
- e. Il est animé par le Scrum Master.

Quiz Scrum.org

- **Which two statements are correct about Daily Scrums?**

- a. It's 15 minutes only if the Sprint is one month long.
- b. The Product Owner should attend the meeting.
- c. It's always a 15-minute timeboxed event, no matter how many developers there are, or how long the Sprint is.
- d. It's held at the same time and place every day.
- e. It's facilitated by the Scrum Master.

a. C'est toujours 15 minutes.

b. Le Product Owner "peut" y assister (=regarder, pas parler), mais il n'est pas correct de dire qu'il "devrait" y assister.

d. Pour réduire les complications liées à l'organisation des réunions.

e. Pas nécessairement; il peut être facilité par le Scrum Master, comme demandé ou requis, mais pas par défaut.

Quiz Scrum.org

- **When is the Sprint over? (Choose two answers)**
 - a. When the timeboxed duration is over
 - b. When the Sprint Backlog tasks are done
 - c. When the Product Owner announces the end of the Sprint
 - d. When all Sprint Backlog items are done
 - e. When the Product Owner cancels the Sprint

Quand est-ce que le Sprint est terminé ? (Choisissez deux réponses)

- a. Lorsque la durée chronométrée est terminée
- b. Lorsque les tâches du Sprint Backlog sont terminées
- c. Quand le Product Owner annonce la fin du Sprint
- d. Lorsque tous les éléments du Sprint Backlog sont terminés
- e. Lorsque le Product Owner annule le Sprint

Quiz Scrum.org

- **When is the Sprint over?**
 - a. When the timeboxed duration is over
 - b. When the Sprint Backlog tasks are done
 - c. When the Product Owner announces the end of the Sprint
 - d. When all Sprint Backlog items are done
 - e. When the Product Owner cancels the Sprint

Vous devez savoir ce que signifie timeboxing, et que les Sprints sont timeboxés. Outre les fins normales des Sprints, le Product Owner a également le pouvoir d'annuler un Sprint.

Quiz Scrum.org

- **What's the normal timeboxed duration of Sprint Retrospective when there are 6 developers in the team and Sprints are two weeks long?**
 - a. Maximum 8 hours
 - b. 1.5 hours
 - c. 3 hours
 - d. 4 hours

Quelle est la durée normale d'une rétrospective de sprint dans le temps lorsqu'il y a 6 développeurs dans l'équipe et que les sprints durent deux semaines ?

- a. Maximum 8 heures
- b. 1,5 heures
- c. 3 heures
- d. 4 heures

Quiz Scrum.org


- **What's the normal timeboxed duration of Sprint Retrospective when there are 6 developers in the team and Sprints are two weeks long?**
 - a. Maximum 8 hours
 - **b. 1.5 hours**
 - c. 3 hours
 - d. 4 hours
- La durée limitée des événements est la suivante :
 - Sprint** - Maximum 1 mois
 - Daily Scrum** - 15 minutes
 - Sprint Planning** - 8 heures dans un Sprint d'un mois, et normalement plus court proportionnellement pour les Sprints plus courts
 - Sprint Review** - 4 heures dans un Sprint d'un mois, et normalement plus court proportionnellement pour les sprints plus courts
 - Rétrospective de sprint** - 3 heures dans un sprint d'un mois, et normalement plus court proportionnellement pour les sprints plus courts

Note 1 : si vous avez un Sprint plus court, il n'est pas obligatoire de raccourcir les durées temporelles proportionnellement, mais c'est la chose normale à faire. Sinon, par exemple, dans un projet avec des Sprints d'une semaine (soit 5 jours ouvrés), vous passerez 2 jours, soit 40% du temps, en réunions au lieu de créer le produit. Note 2 : Oui, être plus court "proportionnellement" n'est pas mentionné dans le Scrum Guide, mais tout ce que vous verrez dans l'examen ne provient pas du Scrum Guide. Notez que la durée des événements ne dépend pas du nombre de développeurs.

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**

Chap. 1 : LE SCRUM MASTER


Les rôles

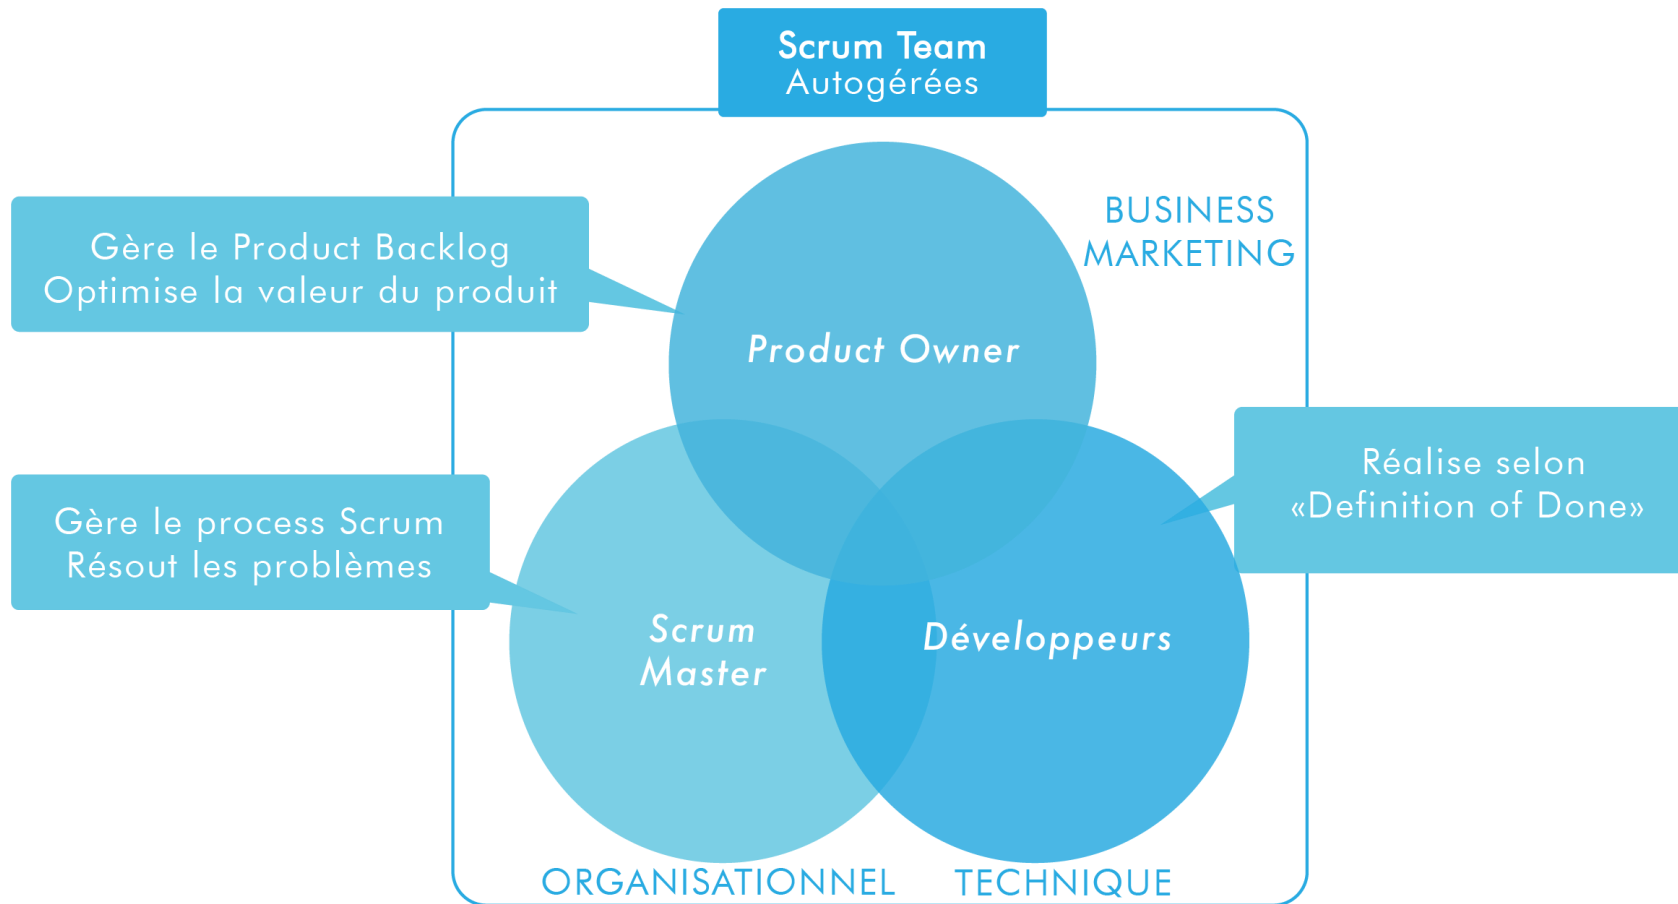

L'approche classique du chef de projet

Activité : comment on répartit en Scrum ?

- Écriture du cahier des charges
- Définition des priorités
- Répartition des tâches
- Gestion de l'équipe
- Évaluation des risques
- S'assurer de la qualité des développements
- Définir le processus de travail, la méthodologie
- Fournir une solution technique
- Communiquer et reporter à la hiérarchie et au client
- Contrôler le budget, les délais et la portée du projet
- Superviser la maintenance et l'évolution du projet

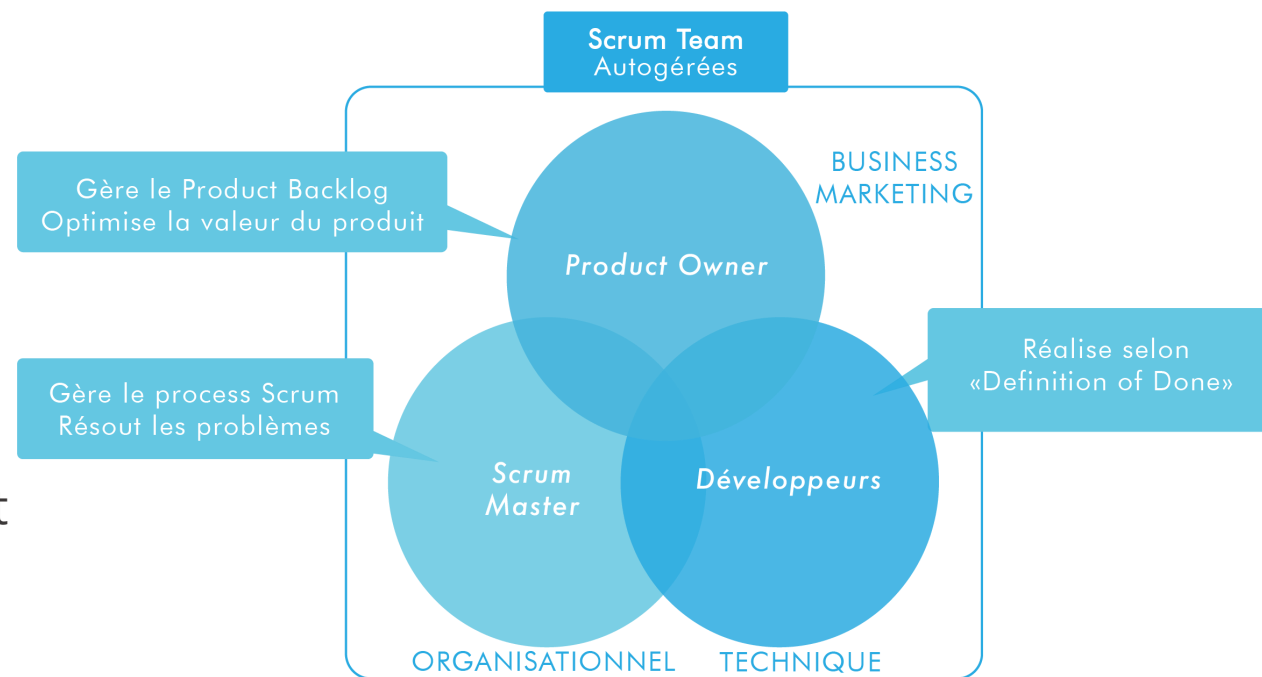

L'approche selon Scrum

Développeurs	Product Owner	Scrum Master
	Ecriture du cahier des charges	
	Définition des priorités	
Répartition des tâches		
		Gestion de l'humain (conflit, blocages...)
Evaluation des risques	Evaluation des risques	Evaluation des risques
Qualité des développements		
		Processus de travail
Solution technique		
	Communication avec la hiérarchie (liée au produit)	Communication avec les parties prenantes pour lever les obstacles
	Collaboration avec le client / Produit	Collaboration avec le client / obstacles
	Gestion du budget	
	Portée du projet / Evolution	

Le Scrum master rend service à la Scrum team

- Accompagner les membres de l'équipe en matière d'autogestion et de pluridisciplinarité
- Aider la Scrum Team à se focaliser sur la création d'Increments de grande valeur qui répondent à la Definition of Done
- Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles pouvant entraver la progression de la Scrum Team
- S'assurer que tous les événements Scrum ont bien lieu et sont efficaces, productifs et respectent bien les temps impartis (timeboxés : gardés dans une boîte de temps).

Le Scrum master rend service au PO

- L'aider à trouver des techniques pour définir efficacement l'Objectif de Produit et gérer efficacement du Product Backlog
- Sensibiliser la Scrum Team à la nécessité de bien comprendre le besoin d'avoir des éléments du Product Backlog clairs et concis
- Encourager l'application de la planification produit empirique dans un environnement complexe
- Faciliter la collaboration des parties prenantes, selon les demandes ou les besoins.

Le Scrum master rend service aux développeurs

- Accompagner, former et encadrer l'organisation dans son adoption de Scrum
- Planifier et apporter conseils sur les implémentations de Scrum au sein de l'organisation
- Faciliter la compréhension de l'approche empirique en environnement complexe des employés et des parties prenantes
- Contribuer à lever les obstacles qui peuvent se dresser entre les parties prenantes et la Scrum Team.


Le Scrum master en bref


- Pas de hiérarchie
- Il manage les process
- Il est responsable de l'efficacité Scrum, il donne l'impulsion à l'équipe
- Organisateur / Facilitateur / de bonne humeur !
- Il n'exploite pas les compétences, il motive les individus
- Il n'est pas au dessus, il est dans l'équipe
- Il ne dirige pas, il guide
- Il ne cherche pas qui a fait la faute, il accompagne jusqu'à la solution

La matrice des compétences

Skill	Céline		Pierre		Antoine		Mohamed		total
Front		-		1		1		1	3
Back		1		0		0		-	1
SQL		1		1		1		0	3
Architecture		1		0		0		0	1
Intégration		1		1		0		1	3
Testing		1		-		1		0	2
total		5		4		4		2	

Moving motivators

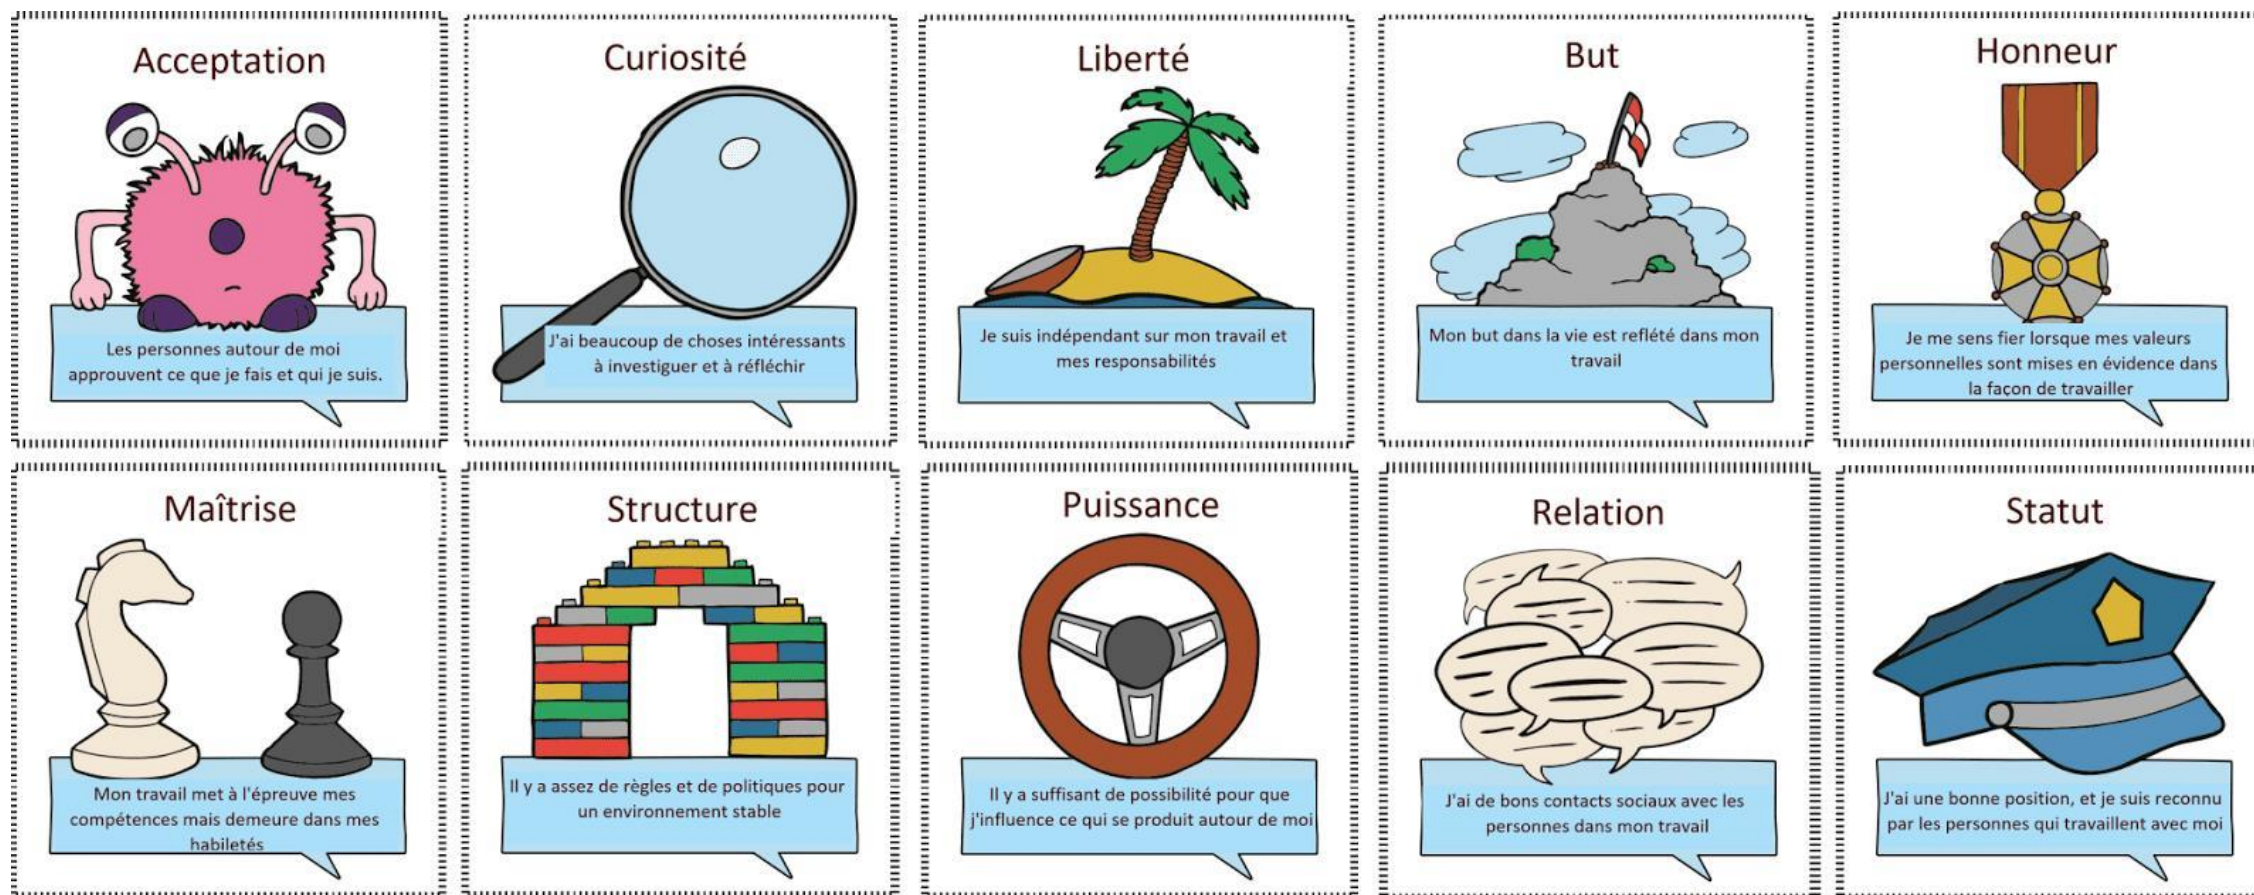

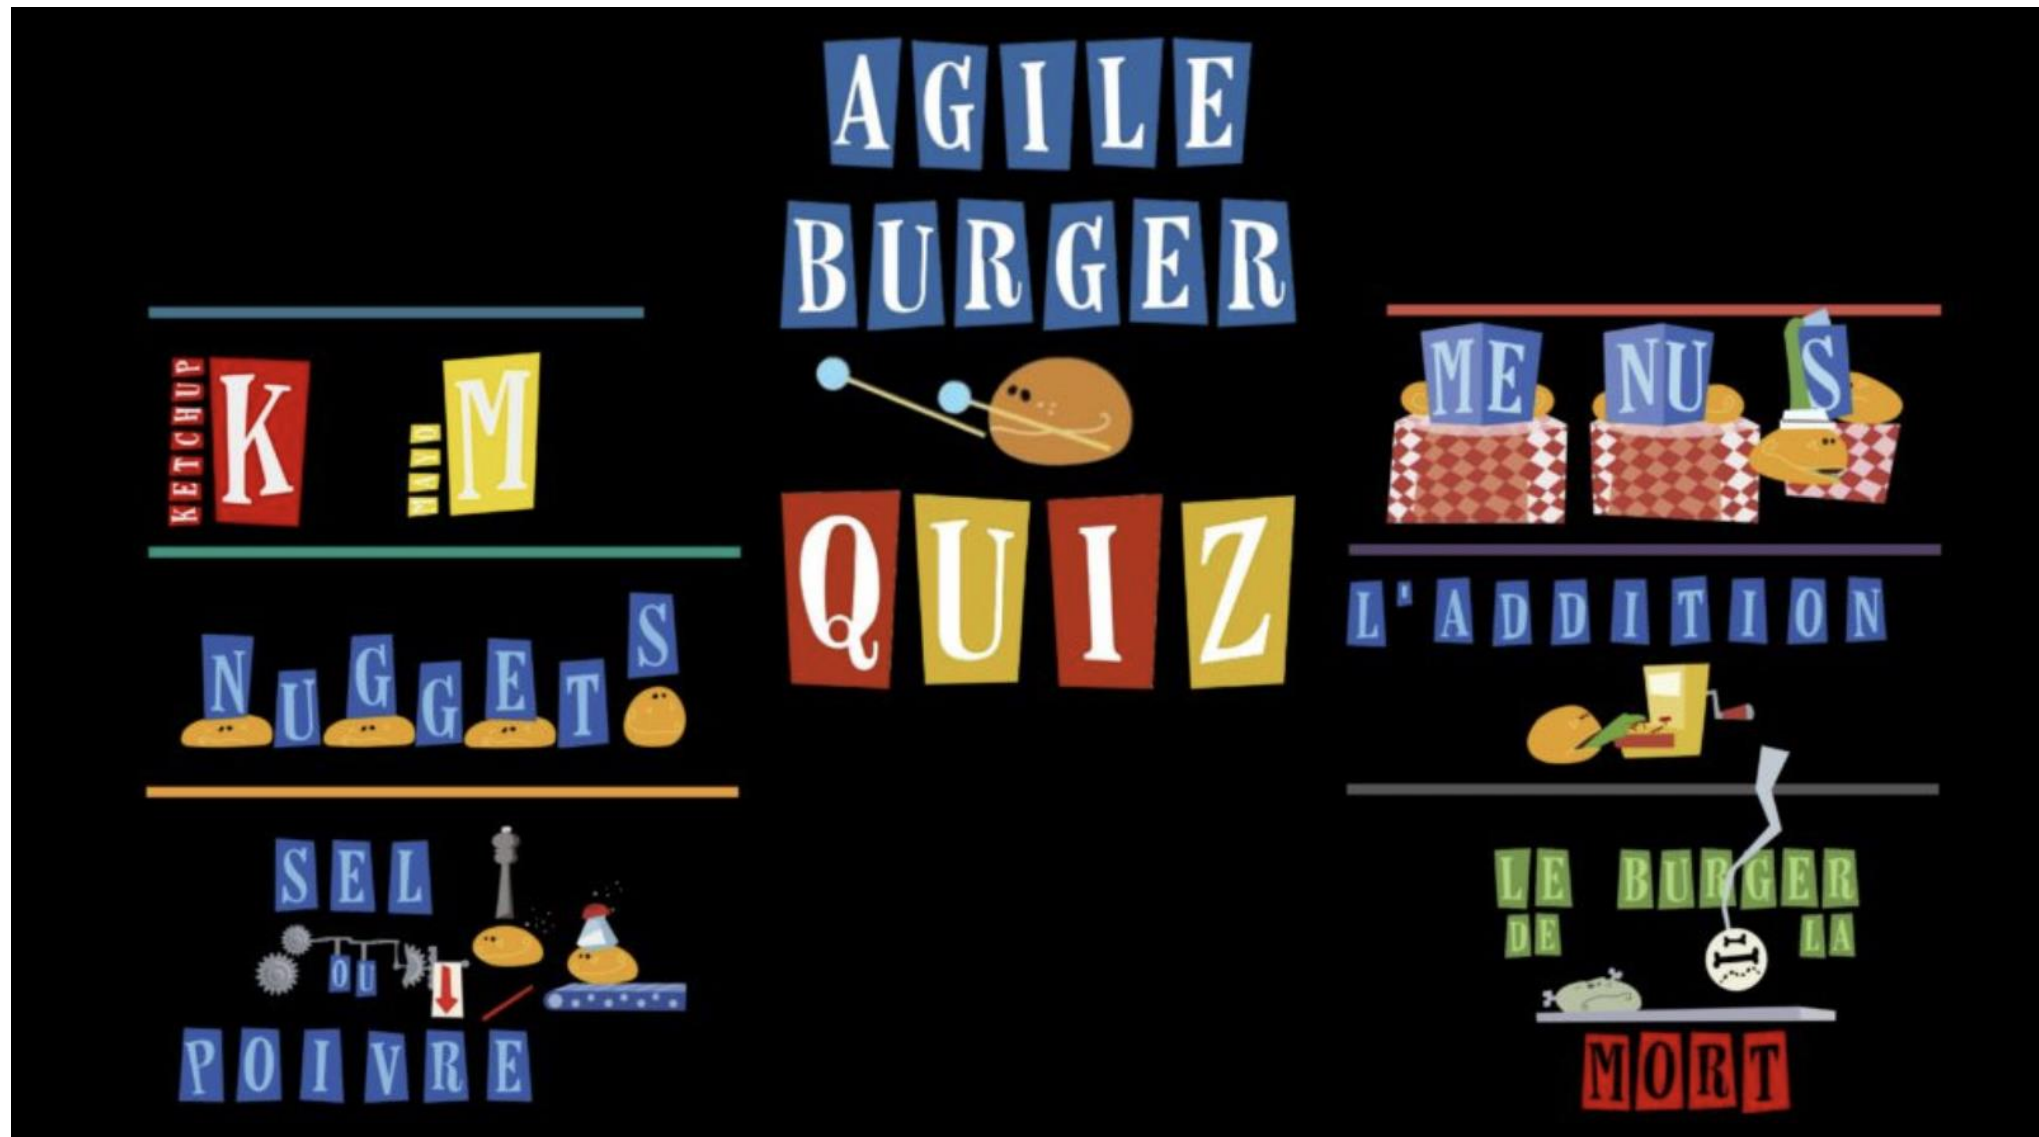

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is the LEAST productive way for the Scrum Master to improve the Development Team's communications with the Product Owner?**
 - a. Monitor their communication performance.
 - b. Suggest effective communication tools and techniques to the Product Owner.
 - c. Act as a go-between for them.
 - d. Teach them how to effectively communicate.
- **Lequel des éléments suivants est le moyen le MOINS productif pour le Scrum Master d'améliorer les communications des développeurs avec le Product Owner ?**
 - a. Surveillez leurs performances de communication.
 - b. Suggérer des outils et des techniques de communication efficaces au Product Owner.
 - c. Servir d'intermédiaire pour eux.
 - d. Apprenez-leur à communiquer efficacement.

Quiz Scrum.org

Which of the following is the LEAST productive way for the Scrum Master to improve the Development Team's communications with the Product Owner?

- a. Monitor their communication performance.
- b. Suggest effective communication tools and techniques to the Product Owner.
- **c. Act as a go-between for them.**
- d. Teach them how to effectively communicate.

a. Ceci dans le but de trouver des problèmes, suivi d'essayer de trouver des solutions. Faire office d'intermédiaire n'est pas une solution durable.

Quiz Scrum.org

- **When does a Scrum Master cancel a Sprint?**
 - a. When not enough resources are available for the project
 - b. When there's an unsolved technical dependency
 - c. When the forecast shows that we can't finish many of the items in the Sprint Backlog
 - d. The Scrum Master doesn't have the authority to cancel the Sprint.
- **Quand un Scrum Master annule-t-il un Sprint ?**
 - a. Lorsqu'il n'y a pas assez de ressources disponibles pour le projet
 - b. Quand il y a une dépendance technique non résolue
 - c. Lorsque les prévisions montrent que nous ne pouvons pas terminer de nombreux éléments du Sprint Backlog
 - d. Le Scrum Master n'a pas le pouvoir d'annuler le Sprint.

Quiz Scrum.org

- **When does a Scrum Master cancel a Sprint?**

- a. When not enough resources are available for the project
- b. When there's an unsolved technical dependency
- c. When the forecast shows that we can't finish many of the items in the Sprint Backlog
- **d. The Scrum Master doesn't have the authority to cancel the Sprint.**

- a. Nous utilisons des équipes stables dans Scrum, et même si elles ne semblent pas suffisantes, nous continuons simplement à développer et n'avons pas besoin d'annuler le Sprint.
- b. Essayez simplement de résoudre le problème, et si ce n'est pas possible, commencez à travailler sur d'autres éléments.
- c. C'est bon; il vous suffit de continuer et de livrer le plus possible.
- d. C'est fait par le Product Owner.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following can be reasons for the Scrum Master to attend the Daily Scrum?**
 - a. The developers have asked the Scrum Master to facilitate their Daily Scrum.
 - b. To track changes to the Sprint Backlog.
 - c. To get a report on progress of the Sprint.
 - d. To participate as a Scrum Team member
 - e. It's not necessary for them to be in the meeting.

Parmi les raisons suivantes, lesquelles sont des raisons pour que le Scrum Master assiste au Daily Scrum ?

- a. Les développeurs ont demandé au Scrum Master de faciliter leur Daily Scrum.
- b. Pour suivre les modifications apportées au Sprint Backlog.
- c. Pour obtenir un rapport sur l'avancement du Sprint.
- d. Pour participer en tant que membre de l'équipe Scrum
- e. Il n'est pas nécessaire qu'il soit présent à la réunion.

Quiz Scrum.org

- Which two of the following can be reasons for the Scrum Master to attend the Daily Scrum?
 - a. The developers have asked the Scrum Master to facilitate their Daily Scrum.
 - b. To track changes to the Sprint Backlog.
 - c. To get a report on progress of the Sprint.
 - d. To participate as a Scrum Team member
 - e. It's not necessary for them to be in the meeting.

- a. Le Scrum Master anime les réunions selon les demandes ou les besoins.
- b. Si nécessaire, cela sera fait par les développeurs
- c. Le Scrum Master se concentre sur le contexte, pas sur le contenu.
- d. Daily Scrum n'est pas pour l'équipe Scrum (les trois rôles), mais uniquement pour l'équipe de développement.
- e. En général, Daily Scrum est pour l'équipe de développement, ce qui signifie que seuls les développeurs "participent" (parlent). D'autres peuvent "assister" (regarder), mais ils ne "participeront" pas (parler).

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following actions may a Scrum Master take in starting up a project?**
 - a. Ask the Product Owner to explain the project, its business need, history, goals, and context.
 - b. Ask the team to work together and prepare a complete Product Backlog.
 - c. Ask the development managers to introduce their departments and capabilities.
 - d. Ask the Development Team members to introduce themselves to each other and tell about their skills and background.
 - e. Ensure that team members have clear roles and responsibilities.
 - f. Ask the Development Team to discuss and identify the way they are going to develop the product.

Parmi les actions suivantes, quelles sont celles qu'un Scrum Master peut entreprendre lors du démarrage d'un projet ?

- a. Demandez au Product Owner d'expliquer le projet, son besoin métier, son historique, ses objectifs et son contexte.
- b. Demandez à l'équipe de travailler ensemble et de préparer un Product Backlog complet.
- c. Demandez aux responsables du développement de présenter leurs départements et leurs compétences.
- d. Demandez aux membres de l'équipe de développement de se présenter les uns aux autres et de parler de leurs compétences et de leur parcours.
- e. Assurez-vous que les membres de l'équipe ont des rôles et des responsabilités clairs.
- f. Demandez à l'équipe de développement de discuter et d'identifier la manière dont ils vont développer le produit.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following actions may a Scrum Master take in starting up a project?**
 - a. Ask the Product Owner to explain the project, its business need, history, goals, and context.
 - b. Ask the team to work together and prepare a complete Product Backlog.
 - c. Ask the development managers to introduce their departments and capabilities.
 - d. Ask the Development Team members to introduce themselves to each other and tell about their skills and background.
 - e. Ensure that team members have clear roles and responsibilities.
 - f. Ask the Development Team to discuss and identify the way they are going to develop the product.

- b. Le backlog produit n'est jamais complet.

- c. Il doit s'agir du projet et des personnes en interne, pas des départements externes. N'oubliez pas que l'équipe est interfonctionnelle et fait tout le nécessaire pour le projet, sans aide extérieure.

- e. Ils partagent la responsabilité et n'ont pas de rôles et de responsabilités différentes.

Quiz Scrum.org

- **The Product Owner is not collaborating with the developers during the Sprint. Which two of the following actions would you choose as the Scrum Master?**
 - a. Cancel the Sprint and start training the Product Owner.
 - b. Bring up the issue in the next Sprint Retrospective.
 - c. Coach the Product Owner to understand why collaboration is important in Scrum and how it can affect the value of the product.
 - d. Nominate someone else as the proxy Product Owner.
 - e. Talk to the functional manager of the Product Owner.

Le Product Owner ne collabore pas avec les développeurs pendant le Sprint. Parmi les actions suivantes, lesquelles choisiriez-vous en tant que Scrum Master ?

- a. Annulez le Sprint et commencez à former le Product Owner.
- b. Abordez le problème dans la prochaine rétrospective Sprint.
- c. Coachez le Product Owner pour comprendre pourquoi la collaboration est importante dans Scrum et comment elle peut affecter la valeur du produit.
- d. Nommez quelqu'un d'autre en tant que Product Owner mandataire.
- e. Parlez au responsable fonctionnel du Product Owner.

Quiz Scrum.org

- **The Product Owner is not collaborating with the developers during the Sprint. Which two of the following actions would you choose as the Scrum Master?**
 - a. Cancel the Sprint and start training the Product Owner.
 - b. Bring up the issue in the next Sprint Retrospective.
 - c. Coach the Product Owner to understand why collaboration is important in Scrum and how it can affect the value of the product.
 - d. Nominate someone else as the proxy Product Owner.
 - e. Talk to the functional manager of the Product Owner.
- a. Ce n'est pas une raison valable pour annuler le Sprint, et aussi, seul le Product Owner peut annuler les Sprints.
- d. Il n'y a pas de Product Owner proxy dans Scrum.
- e. Il est préférable de résoudre les problèmes en interne.

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**

Chap. 2 : LE PRODUCT OWNER

Product Manager VS Product Owner


Les responsabilités sont fonction de la taille de l'organisation.

Product Manager	Product Owner
En lien avec les parties prenantes externes	En lien avec les parties prenantes internes
Aide à définir la vision produit	Communique aux équipes la vision commune
Détermine les objectifs	Aide à déterminer le plan pour les atteindre
Possède la vision	Possède le backlog de l'équipe
S'implique dans la phase de cadrage/conception	S'implique dans la réalisation

**On peut être les deux à la fois !
*Et le Business Owner ?***


Projet / Produit / Programme

→ **passer du mode projet au mode produit**

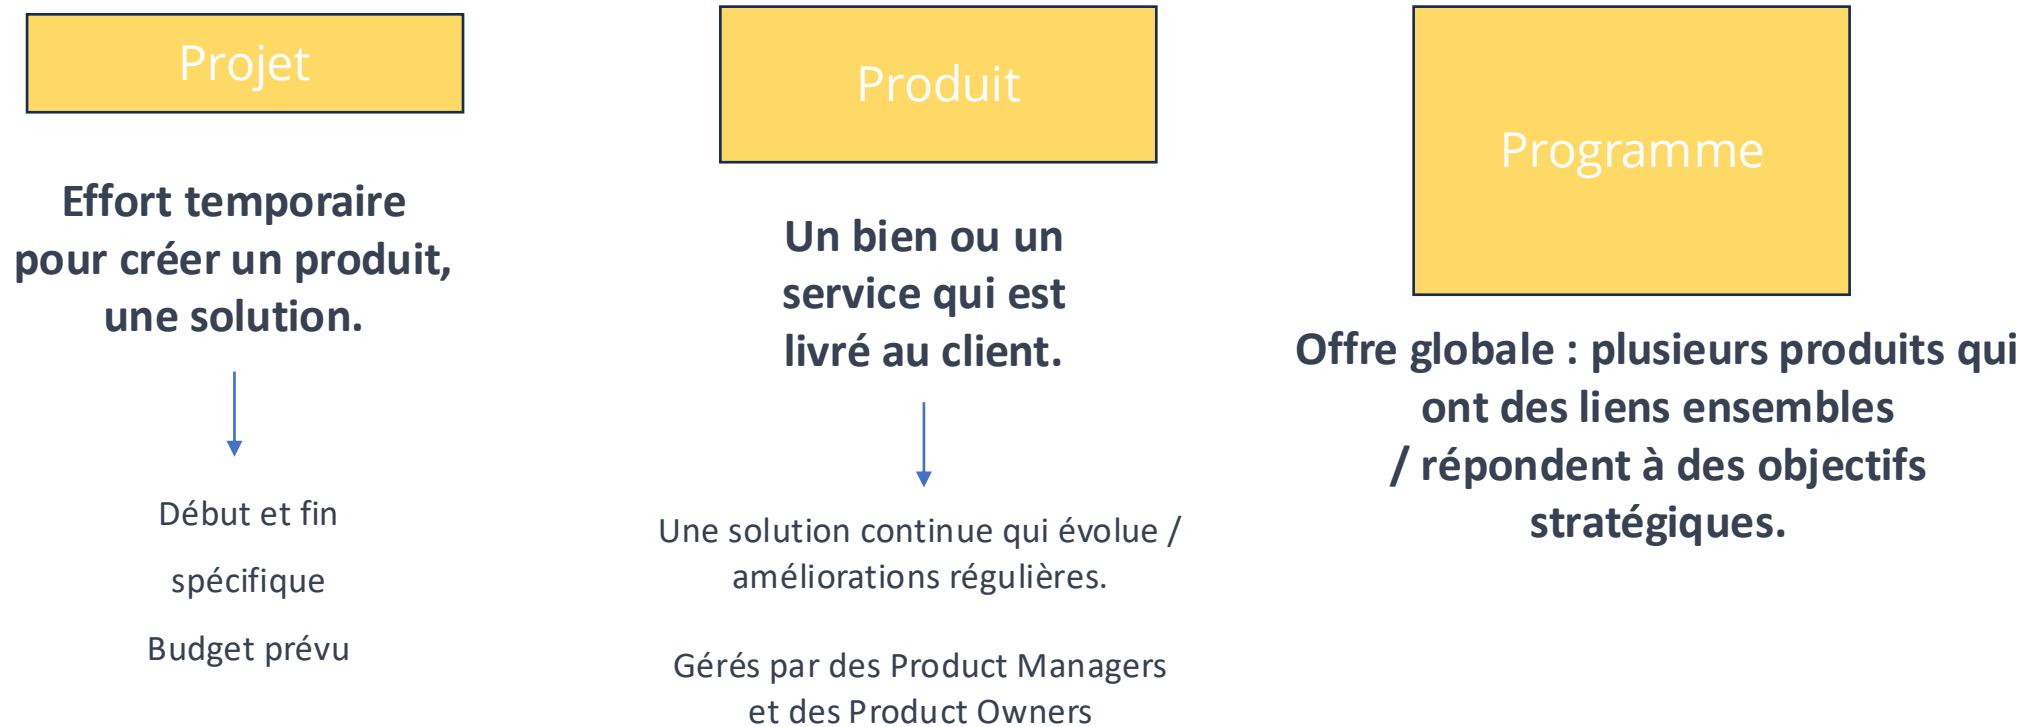

Le product owner

- Il manage le Backlog, pas une équipe.
- Vision produit
- Il peut être assisté mais il n'y en a qu'un seul !

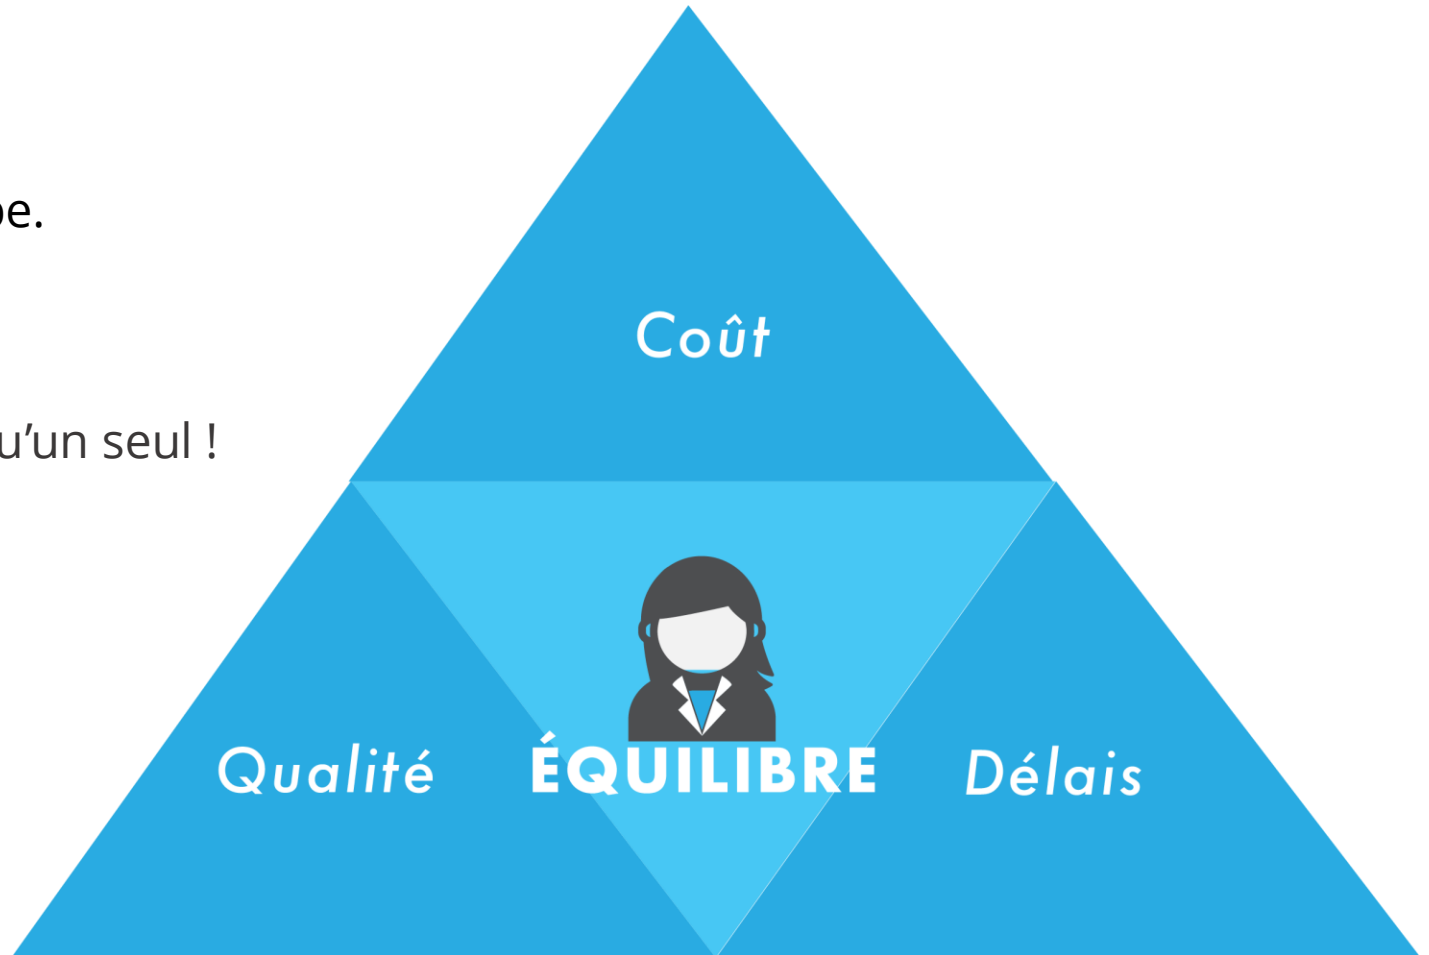

Ses rôles & compétences

- Responsable du produit : 1 seul !
- Valideur
- Traducteur de besoin
- Maximiser la valeur du produit
- Ordonnancer : il peut créer un comité
- Construire de façon empirique
- Ses compétences : Rigueur, Capacité d'immersion, Ecoute et ouverture, Esprit de synthèse, Être un bon communicant

Le product backlog (artefact)

- L'artefact primordial dans l'application de Scrum
- Composé d'items (PBI : Product Backlog Items) :
 - Fonctionnalités
 - Améliorations / Refactoring
 - Item techniques
 - Anomalies
 - Idées
 - Spike
- C'est ce qu'il faut faire pour livrer des fonctionnalités
- Chaque artefact contient un engagement
 - Pour le Product Backlog, il s'agit de l'Objectif de Produit – Product Goal
 - Pour le Sprint Backlog, c'est l'Objectif de Sprint.
 - Pour l'Increment, c'est la Definition of Done (définition de Fini).



*Product
backlog*



Caractéristiques du backlog

- Une liste de ce qu'il y a à faire
- Il est unique
- Il doit être considéré comme la référence
- Il est partagé
- Il parle une langue commune
- Chaque item est important mais avec des priorités
- Il n'est jamais statique



*Product
backlog*



Caractéristiques du backlog



Elodie Descharmes • 2e

[+ Suivre](#)

"Team Coach" multi-casquettes (👉)
Coach Agile, 🖨️ SPC, RTE, 🏈 Scru...
2 h • 🌐

Cette photo a 10 ans.

J'étais Product Owner et ça c'était mon backlog.


Petite équipe co-localisée, tout en management visuel sur les murs.

Pas de Jira.

Pas de description des items à rallonge dans des Epics / Features / US, juste quelques mots sur un post-it, beaucoup d'échanges face-to-face et beaucoup de confiance.

Parfois je me dis qu'on régresse... 🤔

Ou alors je vieillis et je commence à radoter sur le "bon vieux temps de l'agilité" 😂😂😂

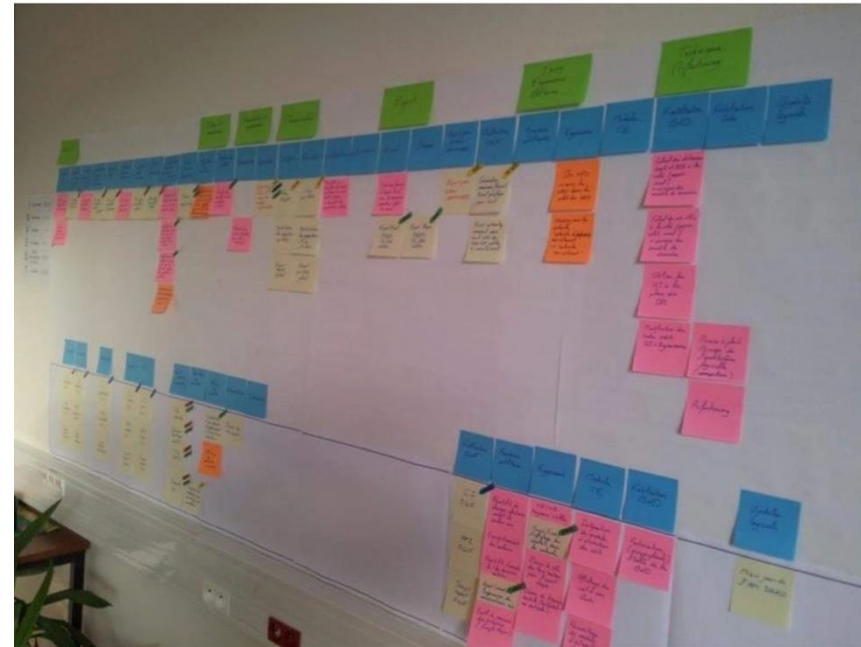

Caractéristiques du Backlog





Victor Billette de Vill...

[Se connecter](#)

Product Manager ★ top
créateurs tech LinkedIn v...
2 h • 🌐

Vision, stratégie, roadmap et backlog... expliqué par des
boules de billard. [...voir plus](#)

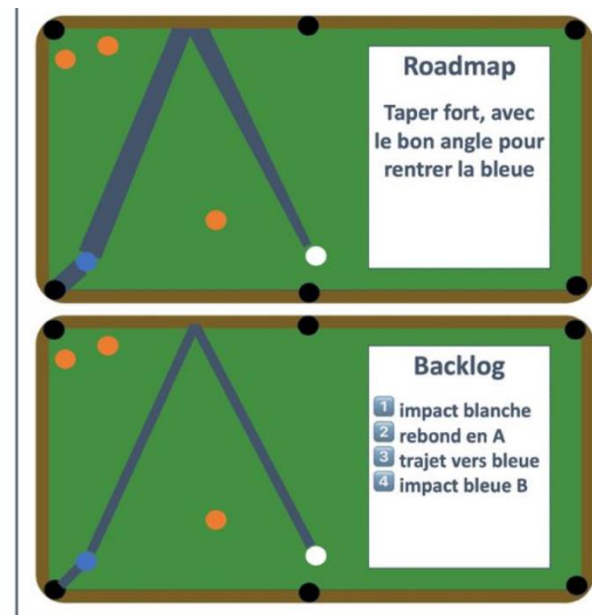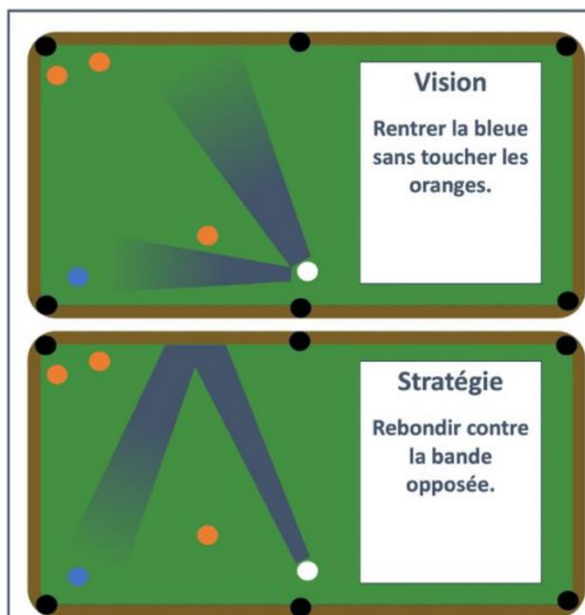

La User Story

- Pratique en ajout à Scrum / XP
- C'est un élément unitaire de backlog.
- **En tant que <QUI>, je souhaite <QUOI> afin de <POURQUOI> (pas obligatoire)**
- Il est défini par
 - Une description
 - Des critères d'acceptation
 - Une estimation
 - Un ordonnancement

Ce n'est pas le seul moyen d'écrire des items




Découper les US

- Découpage par workflow
- Par règle métier
- Par choix dans la navigation
- Par variation de données : ex. langues
- Par type d'interface
- Type d'optimisation : ex. lenteur moteur de recherche
- Par type de rôle
- Par type de plateforme : web, app, android, iPhone
- Par besoin d'analyse : spike



Les 3 C : aspect social des US

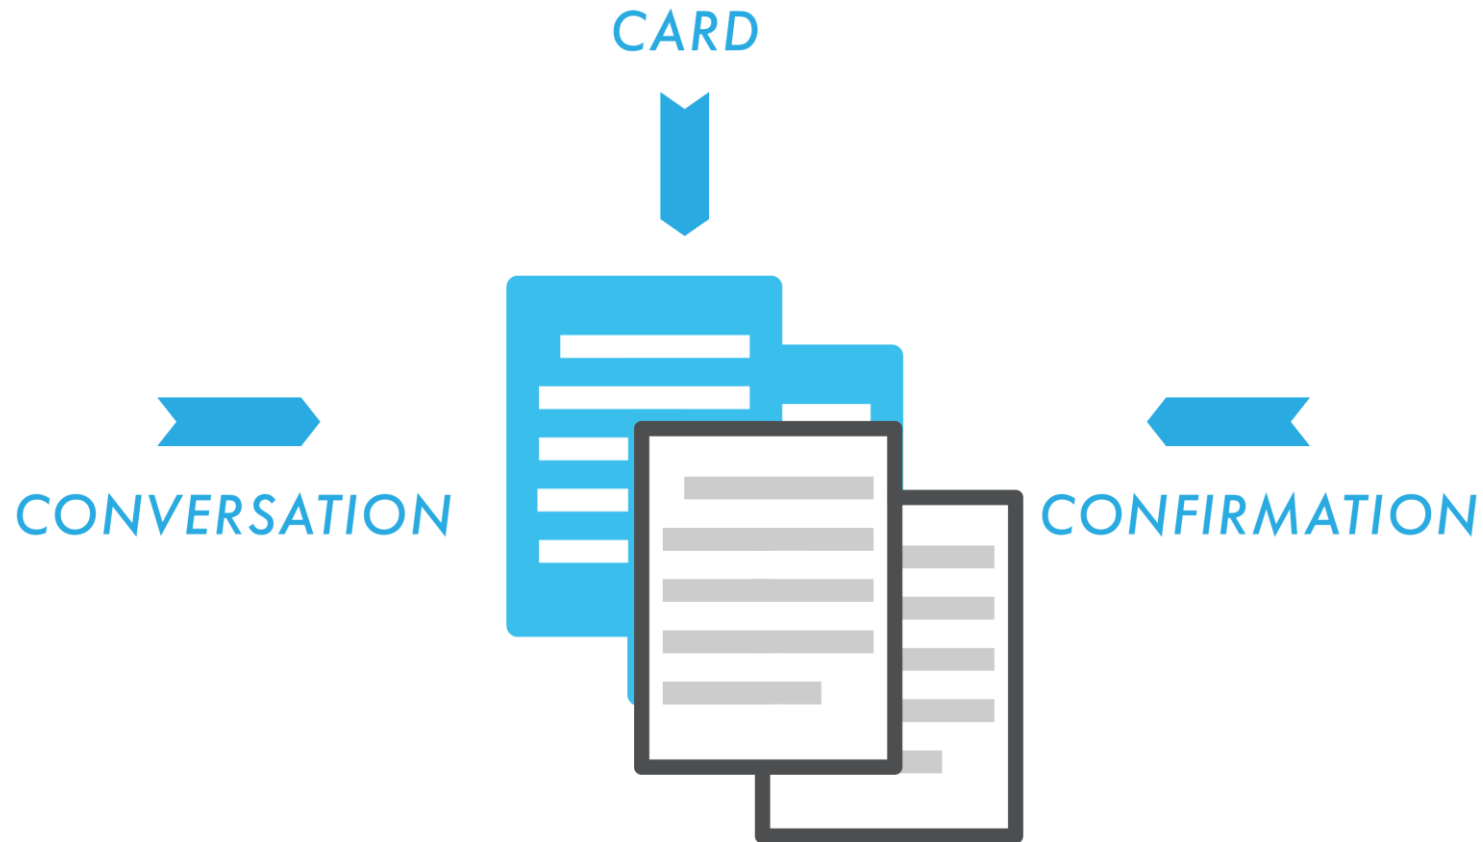

Utilisateurs / Parties prenantes / Dev / Testeurs / Business / DevOps...

Les critères INVEST

I –Independent

N –Negotiable
(Négociable)


V –Valuable (de valeur)


E -Estimable

S - Small

T -Testable


Le story Mapping

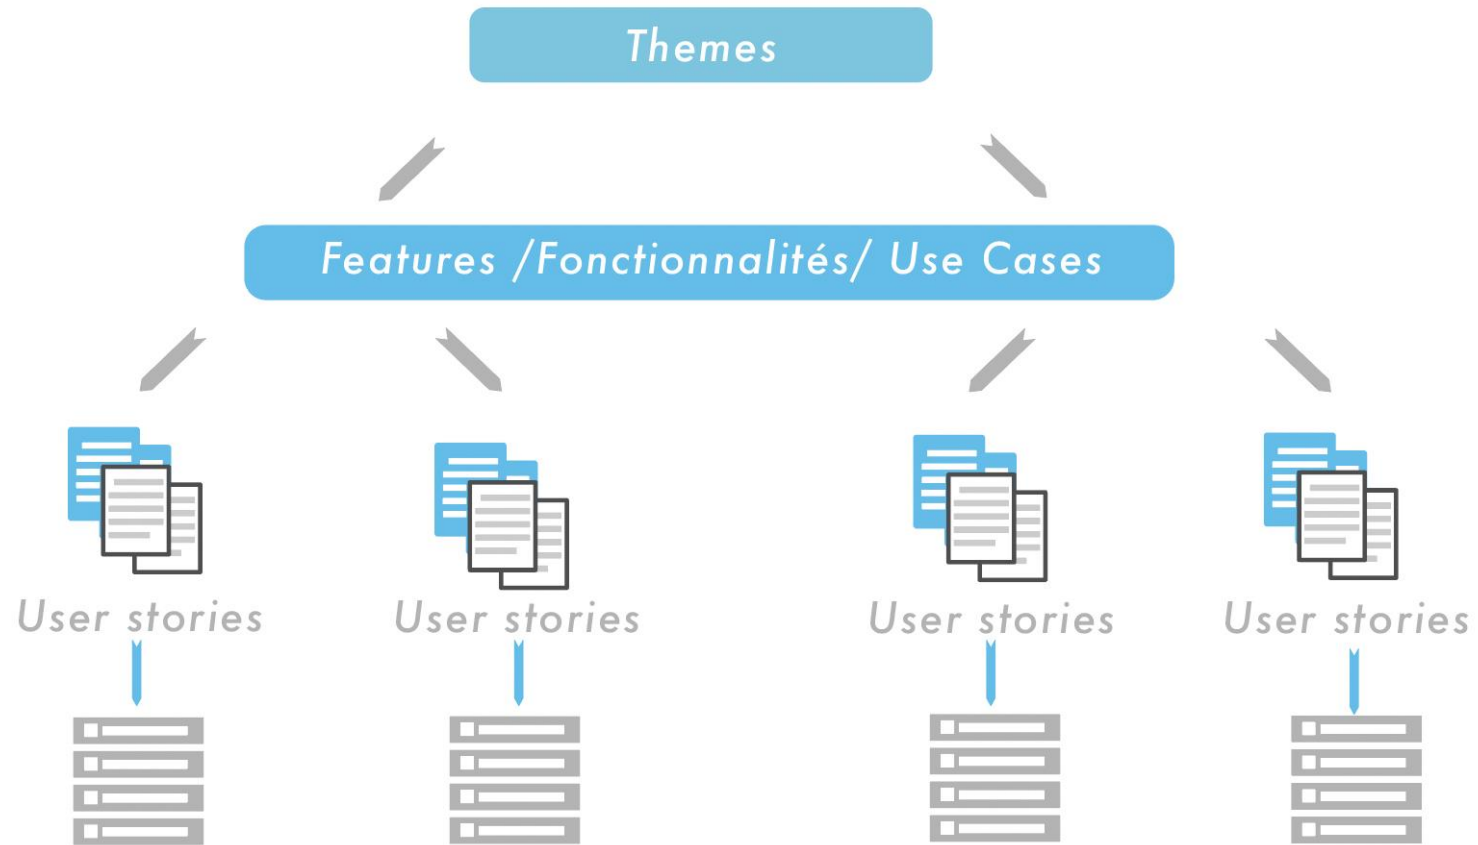

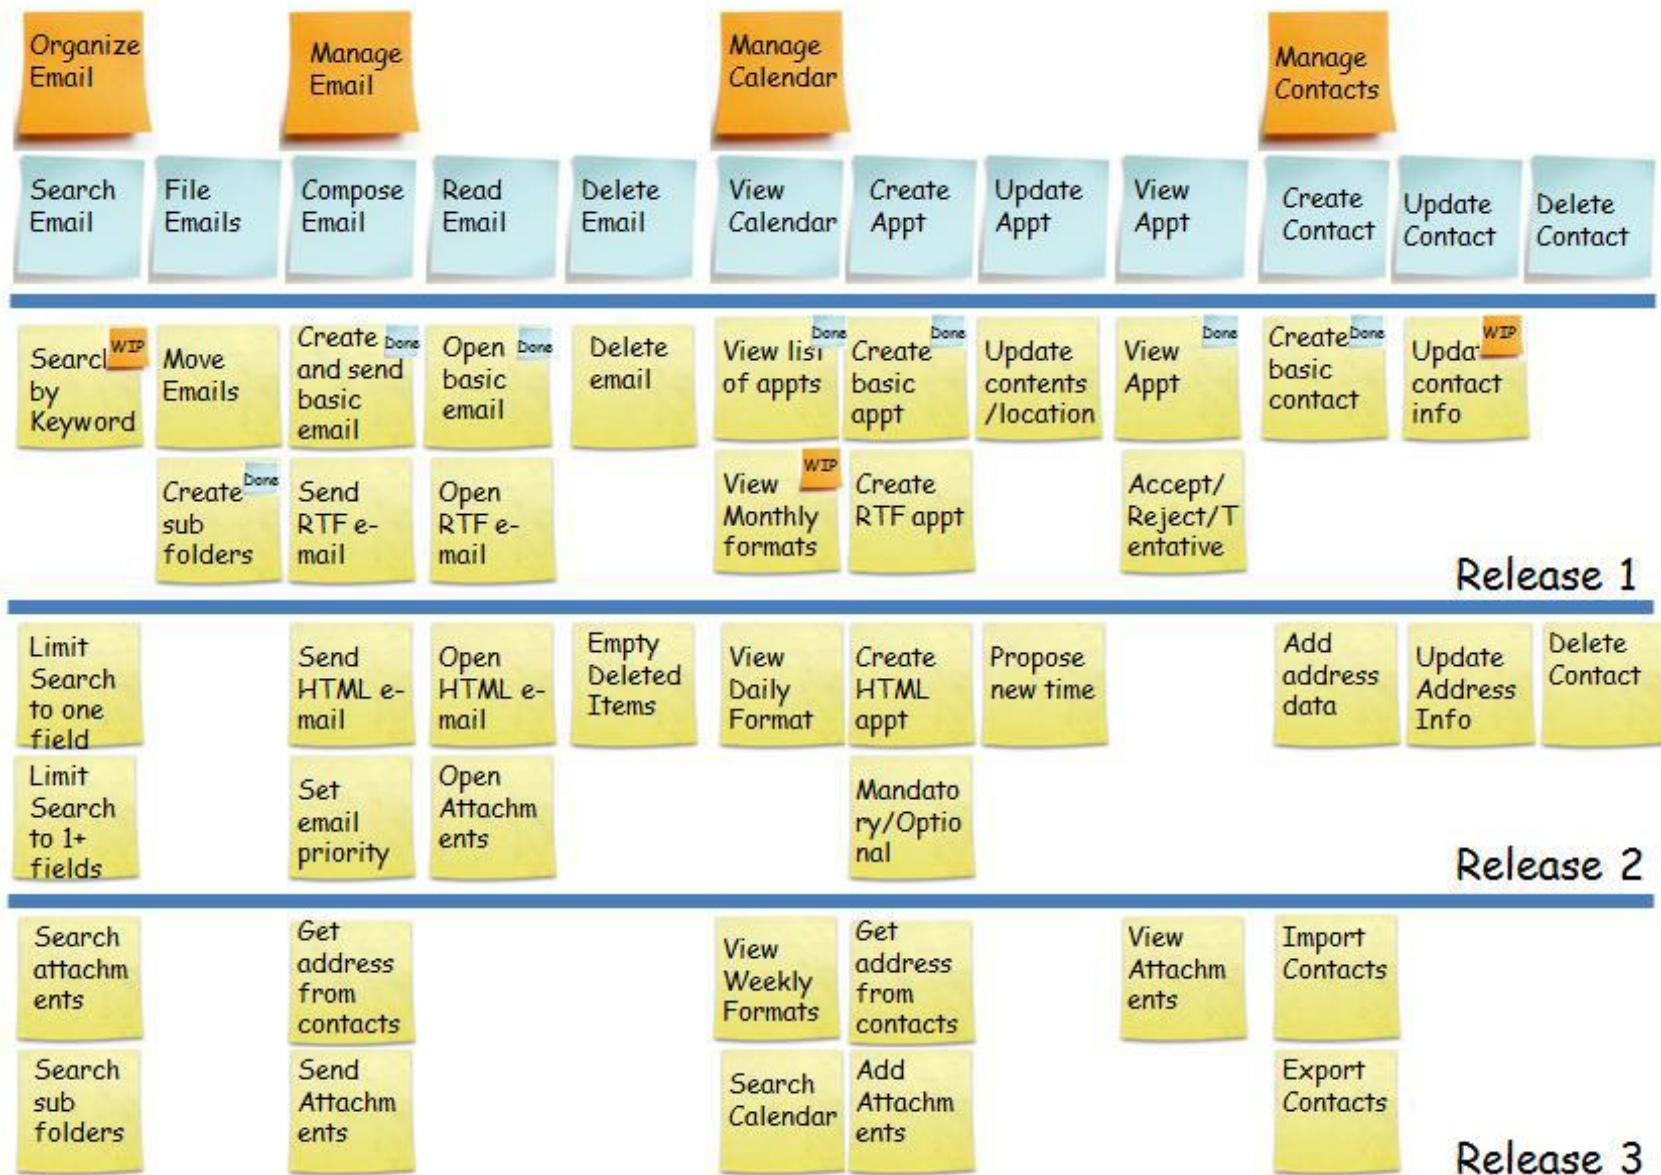


User Story Map / Appli Temps de travail


Version 1



Version 2

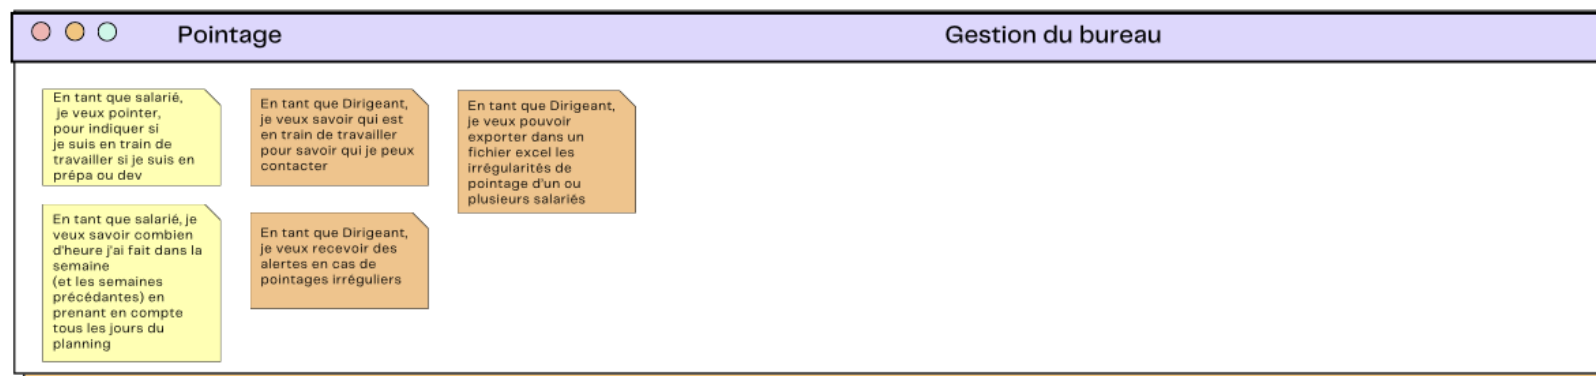

Version 3

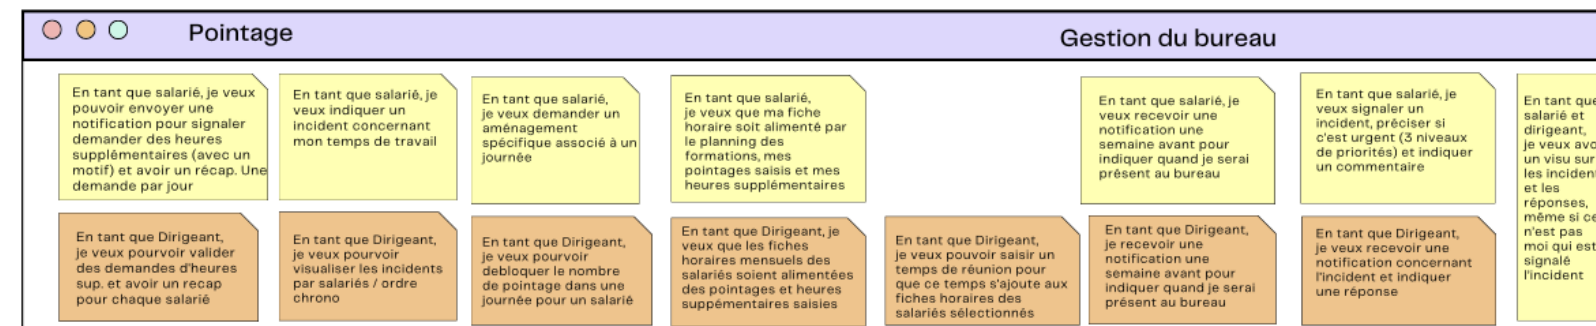


Roadmap : Goal oriented

Date 	12/04/15	Juin 2015	Q3 2015	Q4 2015	S1 2016
Nom release 	Release 1	...	...	...	...
Objectif 	Profiter des promotions en cours	Être informé des produits qui m'intéressent	Accéder à des conseils personnalisés	Première sortie privilégiée	Fidéliser
Fonctionnalités 	▶ Mise en avant du produit ▶ Code promo	▶ Soldes ▶ Nouveautés	▶ Promo combinées ▶ Cross-selling	▶ Ventes privées ▶ Pré-lancement ▶ Code employé	▶ Fidélité ▶ Parrainage ▶ Réservation
Métriques 	▶ Nombre codes promos utilisés ▶ Nouveaux comptes ▶ <u>Nombre ventes</u>	▶ Consultation nouvelles pages ▶ Nouveaux comptes ▶ <u>Nombre ventes</u>	▶ Nombre ventes en promos combinées ▶ Nombre vente en cross-selling ▶ <u>Nombre ventes</u>	▶ Participants vente-privée ▶ Ventes en vente privée ▶ Participants pré-lancement ▶ Codes utilisés ▶ <u>Nombre ventes</u>	▶ Nouveaux comptes ▶ Coupons utilisés ▶ Nombre réservations ▶ <u>Nombre ventes</u>

<https://www.media.thiga.co>

Roadmap : Now Next Later

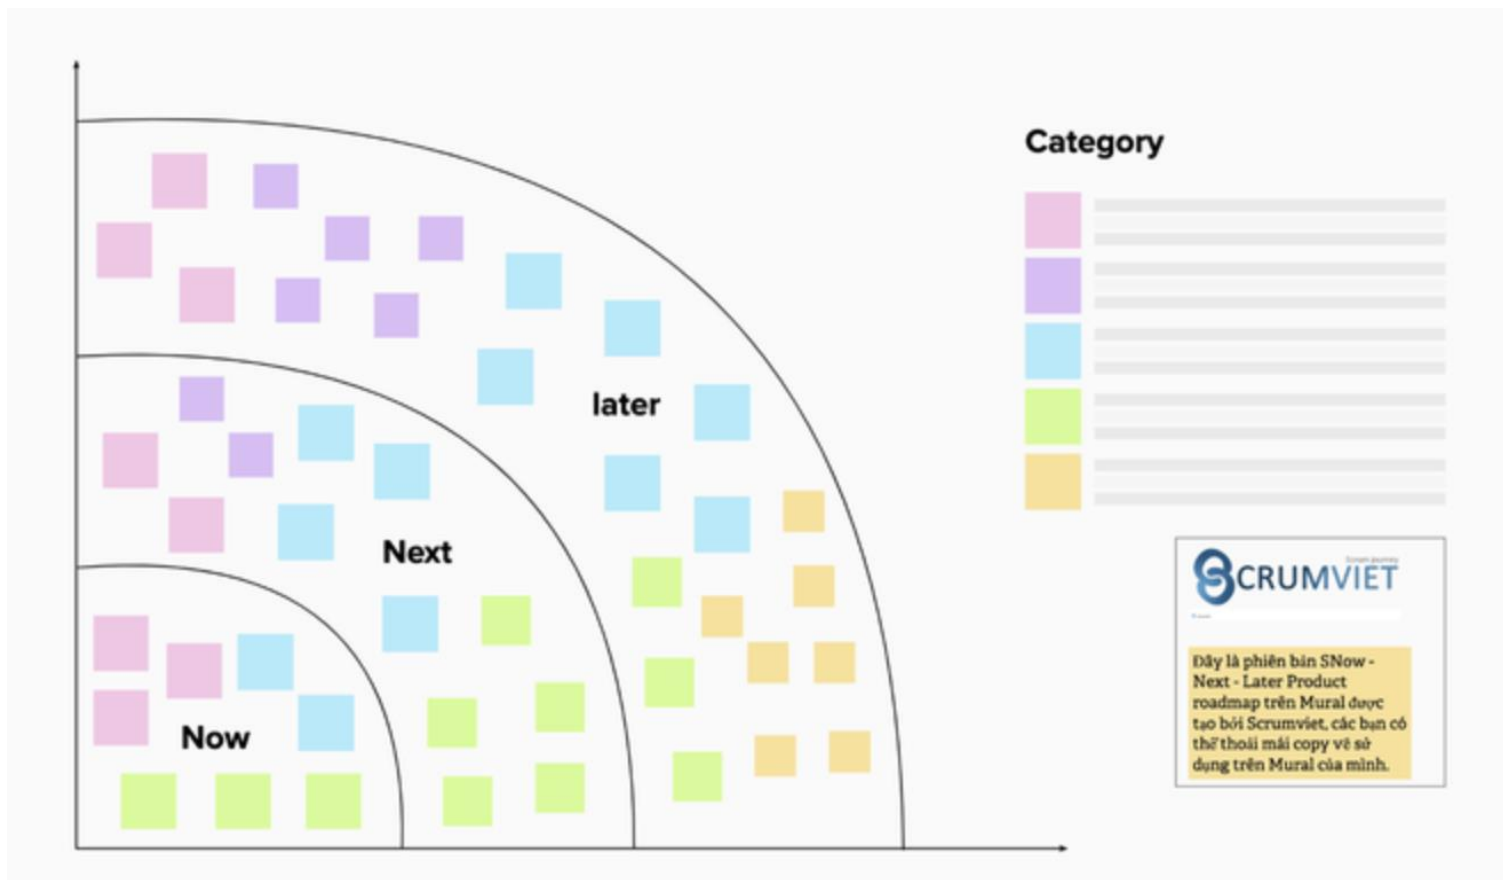


Now - Next - Later Product roadmap - Scrumviet

Roadmap : Now Next Later

EXPAND

NOW NEXT LATER

Plan for Business Growth and Marketing

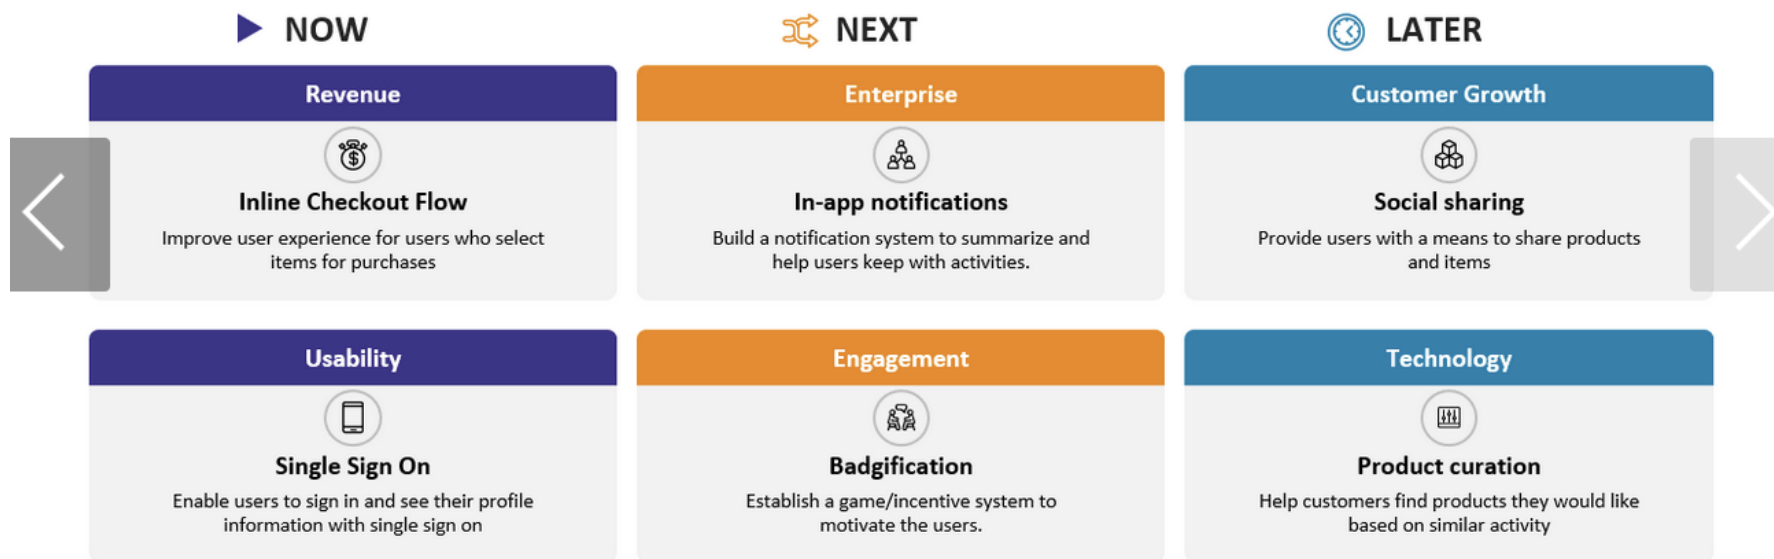



Atelier : créer une vision produit

- Vous êtes : utilisateurs, clients, parties prenantes... membre de l'équipe Scrum.
- 1 : PROBLÉMATIQUE : à quel problématique le projet répond ?
- 2 : UTILISATEURS CIBLES : à qui le produit va s'adresser ?
- 3 : BESOINS DES UTILISATEURS : les besoins et les irritants
- 4 : FONCTIONNALITÉS : les grandes idées de fonctionnalités
- 5 : PROPOSITION DE VALEUR : ce qui va permettre au produit de se différencier
- 6 : OBJECTIFS ET MÉTRIQUES : comment mesurer la progression et la réussite ?
- 7 : PHRASE DE CLIENT : on se met à la place du client en proposant des phrases types
- 8 : ÉNONCÉ FINAL DE LA VISION PRODUIT : une ou deux phrases inspirantes à communiquer à l'équipe

Cône d'incertitude

- Degré d'incertitude existant aux différents stades d'un projet.
- Nous devenons de plus en plus certains de nos estimations lorsque nous en apprenons plus sur le projet
- Décrit la réduction de l'incertitude sur la portée après chaque itération.
- À mesure que l'incertitude est éliminée et que la portée exacte est connue,
- A mesure qu'une prévision s'allonge, elle est de moins en moins certaine.

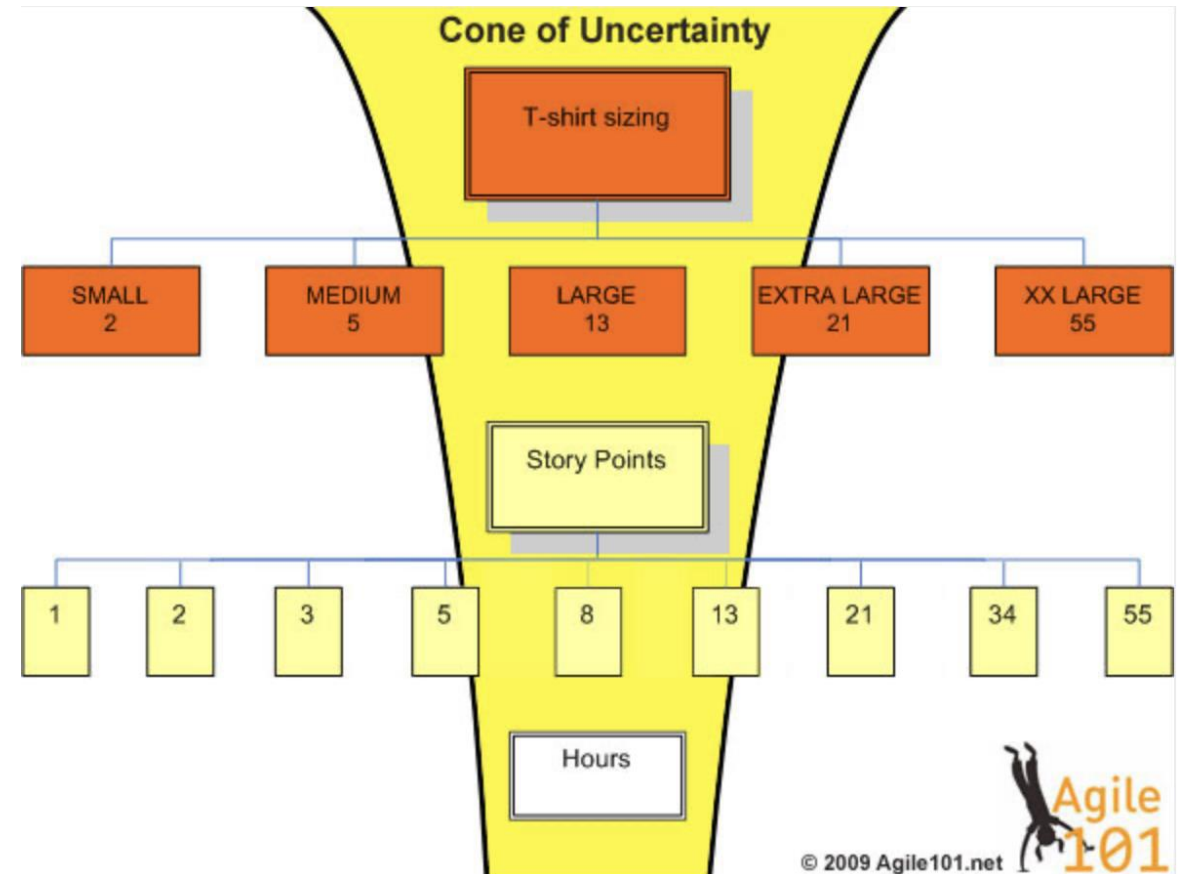



Les exigences non-fonctionnelles

- Intégrées à la vision du Produit
- Listées dans le Backlog
- Formalisées dans la story «fonctionnelle», comme critère d'acceptation
- Listées dans la Définition du terminé (Definition of done)

Les exigences non-fonctionnelles

- **Contraintes** pesant sur le système : prix maximum de la solution à développer, ressources humaines et matérielles imposées, ...
- **Conformité du système** à un environnement : normes réglementaires, documentaires, conformité aux licences acquises, ...
- **Maintenabilité du système** : traçage des erreurs, possibilité des mises à jour, extensibilité / modifiabilité du système initial, supportabilité en fonction de l'implantation géographique du futur système, testabilité...
- **Performance du système**: charge utilisateurs / transactions
- Portabilité du système : compatibilité avec diverses plateformes, facilité de remplacement d'autres systèmes en place, facilité d'installation et de désinstallation de l'application ...
- **Fiabilité du système** : capacité à gérer les erreurs du système, densité des défauts de qualité, capacité à être remis en état rapidement, capacité à résister aux attaques...
- **Sécurité du système** : traçage des mises à jour des données dans le système, gestion de la confidentialité, gestion de l'intégrité des données, protection des données personnelles ...
- **Utilisation du système** : facilité d'utilisation en limitant le nombre de clic à maximum 3 clics pour finaliser la transaction, rendre l'application attractive à une certaine audience (facteurs émotionnels), certification du système à une technologie particulière, capacité à respecter les exigences d'un pays, réutilisabilité de certains composants...

<https://gestofbusiness.com/blog/comment-decrire-les-exigences-non-fonctionnelles/>

La business value – Définition Of Value

Critères de business value proposés par Jean-Christophe Pagès :

- Améliore le travail des utilisateurs
- Attendu par les utilisateurs
- Indispensable pour d'autres projets
- Permet d'améliorer l'image du produit
- Nombre d'utilisateurs impactés
- Fréquence d'utilisation
- Augmente l'attrait du produit
- Diminue l'attrait du produit si fonctionnalité non incluse
- Peut permettre d'enchanter de façon inattendue nos utilisateurs
- Garantie une meilleure stabilité du produit
- Garantie une meilleure sécurité du produit
- Répond à une obligation légale
- Bénéfice financier suite à la mise en place de cette fonctionnalité
- Permet de réaliser ou fait progresser les objectifs de l'entreprise
- Déception / regret si cette fonctionnalité si elle n'est pas incluse
- Permet d'optimiser les coûts

Les méthodes de priorisation

Méthode MoSCoW

- Classer les exigences d'un projet selon leur degré de criticité.
- **M - Must have this** : Les fonctionnalités doivent être traités en priorité. Exigences non négociables.
- **S - Should have this if at all possible** : apporte de la valeur ajoutée, contribue à l'atteinte des objectifs, mais pas indispensable tout de suite. Correspond à de valeur, mais non urgent.
- **C - Could have this if it does not affect anything else** : fonctionnalités intéressantes mais pas indispensables. Ce sont les fonctionnalités « bonus », exigences de confort.
- **W - Won't have this time but would like in the future** : fonctionnalités pas à l'ordre du jour ou qui ne fait pas partie du scope

Les méthodes de priorisation

Méthode Valeur / Urgence

	URGENCE	VALEUR
5	•Très forte contrainte de temps. •Très fortes dépendances avec les autres éléments. •Si pas fait immédiatement, il n'y a un faible intérêt de le faire.	•Extrêmement important pour la plupart ou tous les clients. •Très fort impact sur la marque ou la réputation. •Critique pour le succès du business.
4	•Forte contrainte de temps. •Fortes dépendances avec les autres éléments. •A faire dans la prochaine itération à cause des clients ou des exigences contractuelles	•Important pour beaucoup de clients •Impact significatif sur la marque ou la réputation •Avantage compétitif significatif
3	•Contrainte de temps modérée. •Dépendances modérées avec les autres éléments. •Préférable d'être terminé dans les prochaines itérations	•Important pour plusieurs clients •Impact modéré sur la marque ou la réputation •Avantage compétitif modérément important
2	•Faible contrainte de temps. •Faible dépendance avec les autres éléments. •Acceptable d'être terminé dans les 2-3 prochaines itérations	•Important pour seulement quelques clients •Faible Impact sur la marque ou la réputation •Avantage compétitif faible
1	•Pas de contraintes de temps. •Pas de dépendances avec les autres éléments. •Peu ou pas d'impact	•Important pour peu ou aucun clients •Peu ou pas d'impact sur la marque ou la réputation •Peu ou pas d'avantage compétitif


V	5	5	10	15	20	25
A	4	4	8	12	16	20
L	3	3	6	9	12	15
E	2	2	4	6	8	10
U	1	1	2	3	4	5
R		1	2	3	4	5
	URGENCE					

25	Critique Doit être fait immédiatement
14-20	Important A inclure dans la prochaine itération
6-12	Modérément important A prévoir pour les 2-3 prochaines itérations
1-5	Nice to have Faible priorité Planification peu importante

Les méthodes de priorisation

Valeur / Critères pondérées

- On peut réaliser cet atelier avec l'ensemble de l'organisation ou un comité de priorisation avec des cartes de planning poker
- **Étape 1** : Écrire chaque item sur des post-it
- **Étape 2** : Choisir 4 à 6 critères pour laquelle on va appliquer une pondération (rôle du PO)
- **Étape 3** : Distribuer des cartes de planning poker à chaque participant (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34) 1 implique que l'item ne correspond pas au critère, 34 implique qu'il est en phase avec le critère
- **Étape 4** : le PO explique chaque item pour que chaque participant décide de la carte à annoncer, on estime la valeur pour chaque critère en faisant la moyenne des cartes (comme au planning poker).
- **Étape 5** : Noter sur le post-it la moyenne pour le critère 1, 2, 3 ... puis on fait la moyenne pondérée.
- **Étape 6** : Après avoir fait l'atelier pour chaque item, prioriser selon le plus important.

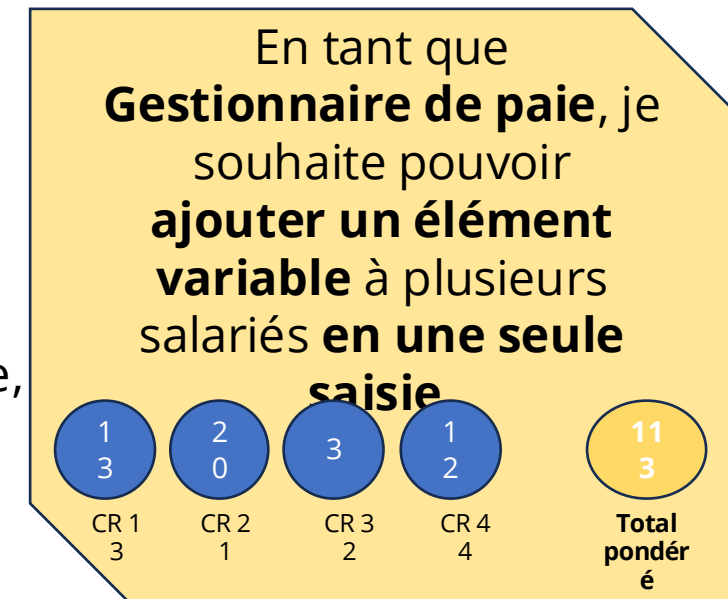

Les méthodes de priorisation

Méthode RICE

- Permet d'évaluer et classer les projets ou les fonctionnalités selon leur impact potentiel
- **Reach (Portée)** : Le nombre de personnes ou de transactions affectées par une initiative dans une période donnée.

Nombre de personnes

- **Impact (Impact)** : Mesure l'effet que l'initiative aura sur les utilisateurs ou sur les résultats de l'entreprise.

(Massif : 3, Élevé : 2, Moyen : 1, faible : 0,5 et minime : 0.25)

- **Confidence (Confiance)** : Évalue la confiance dans les estimations de portée, d'impact et d'effort. Cela permet d'ajuster la priorisation en fonction de l'incertitude. **(Élevé: 100%, Moyen: 80%, Faible : 50%)**

- **Effort (Effort)** : Représente le coût total nécessaire pour réaliser l'initiative, souvent mesuré en nombre de personnes-mois de travail.

Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE Score
1500	2	100%	2	1500
2000	3	80%	6	800
3000	1	50%	4	375

HOW TO SET PRIORITIES

© Eric Partaker

When your
plate is
too full

FOR INDIVIDUALS List out what needs to get done. Use the below 3 tools to make decisions, prioritize & schedule.

Eisenhower Matrix

Urgent Non-Urgent

Important	DO IT NOW 1	SCHEDULE IT 2
Unimportant	DELEGATE IT 3	DELETE IT 4

3-3-3 Method

h/t Oliver Burkeman

Plan your day to complete:

- 3** hours of deep work on an important project
- 3** urgent tasks like crucial meetings, emails, to-dos
- 3** maintenance tasks for a smoother life

Time Blocking

h/t Cal Newport & Nir Eyal

- Set blocks of time on your calendar.
 - Schedule a specific task in each block.
 - Focus only on that task during the assigned block.
- | |
|---------------------|
| 9 - 12 Focused Work |
| 12 - 1 Break |
| 1 - 2 Urgent Tasks |
| 2 - 3 Gym |
| 3 - 4 Other Tasks |
| 4 - 5 Calls/Emails |

FOR TEAMS Be sure your team has clear goals. Gather all team tasks. Use the below 3 tools to plan, prioritize & collaborate.

ABCDE Method

h/t Brian Tracy

Prioritize tasks based on consequences

A	Highest priority for today; severe consequences if not done
B	Important to do today; minor consequences if undone
C	Nice to do today; no consequences if undone
D	Delegate if possible; focus on ABC tasks instead
E	Eliminate entirely; stop doing unimportant tasks

MoSCoW Method

h/t Dai Clegg

Sort tasks into categories:

Must Have M	Should Have S	Could Have C	Won't Have W
Crucial tasks for success	Important not crucial	Nice to have	Out of scope

Kanban Board

h/t Taiichi Ohno

Organize & coordinate your team's priorities


To Do	Doing	Done

Warren Buffett 25/5 Rule

- Make a list of your top 25 projects & initiatives.
- Rank them by importance.
- Do the top 5.
- Ignore the rest.




Pareto Principle

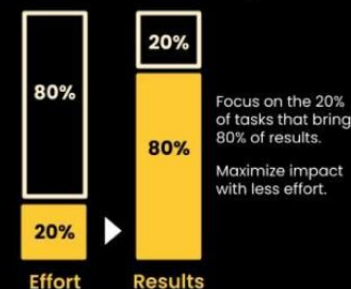

Theory of Constraints

h/t Eliyahu Goldratt

Find & fix the system's bottlenecks to go faster



Want a high-res PDF of this? Follow Eric Partaker [Top Voice](#) and try my free newsletter.

Définition of Done


- Checklist constituée de tout ce qu'il faut faire pour considérer un item comme terminée :
 - Revue du code effectuée
 - Tests unitaires validés
 - Tests d'intégration validés
 - Tests de performance validés
 - Test d'acceptation des utilisateurs validés
 - La documentation a été mise à jour
 - Les maquettes graphiques sont respectées
 - Livré sur un environnement stable
- Peut évoluer d'un Sprint à l'autre
- Une DoD mal exprimée est une des causes d'échec majeur dans la gestion de projet.
- Responsabilise et implique les développeurs
- Il peut y avoir plusieurs Dod si plusieurs équipes travaillent sur un même projet, tant qu'elles sont cohérentes entre elles.

Définition of Done

- Un item (PBI) ne peut pas être considéré comme un incrément (PI) s'il ne correspond pas à la définition du terminé
- La definition of done permet :
 - Prévenir la dette technique
 - Avoir une attente précise de ce que l'on veut obtenir => qualité
 - Intégrer les attentes des parties prenantes
- Elle est créée par la Scrum team, les parties prenantes peuvent participer à la discussion.


Les types de tests et environnements

Test de **sécurité**

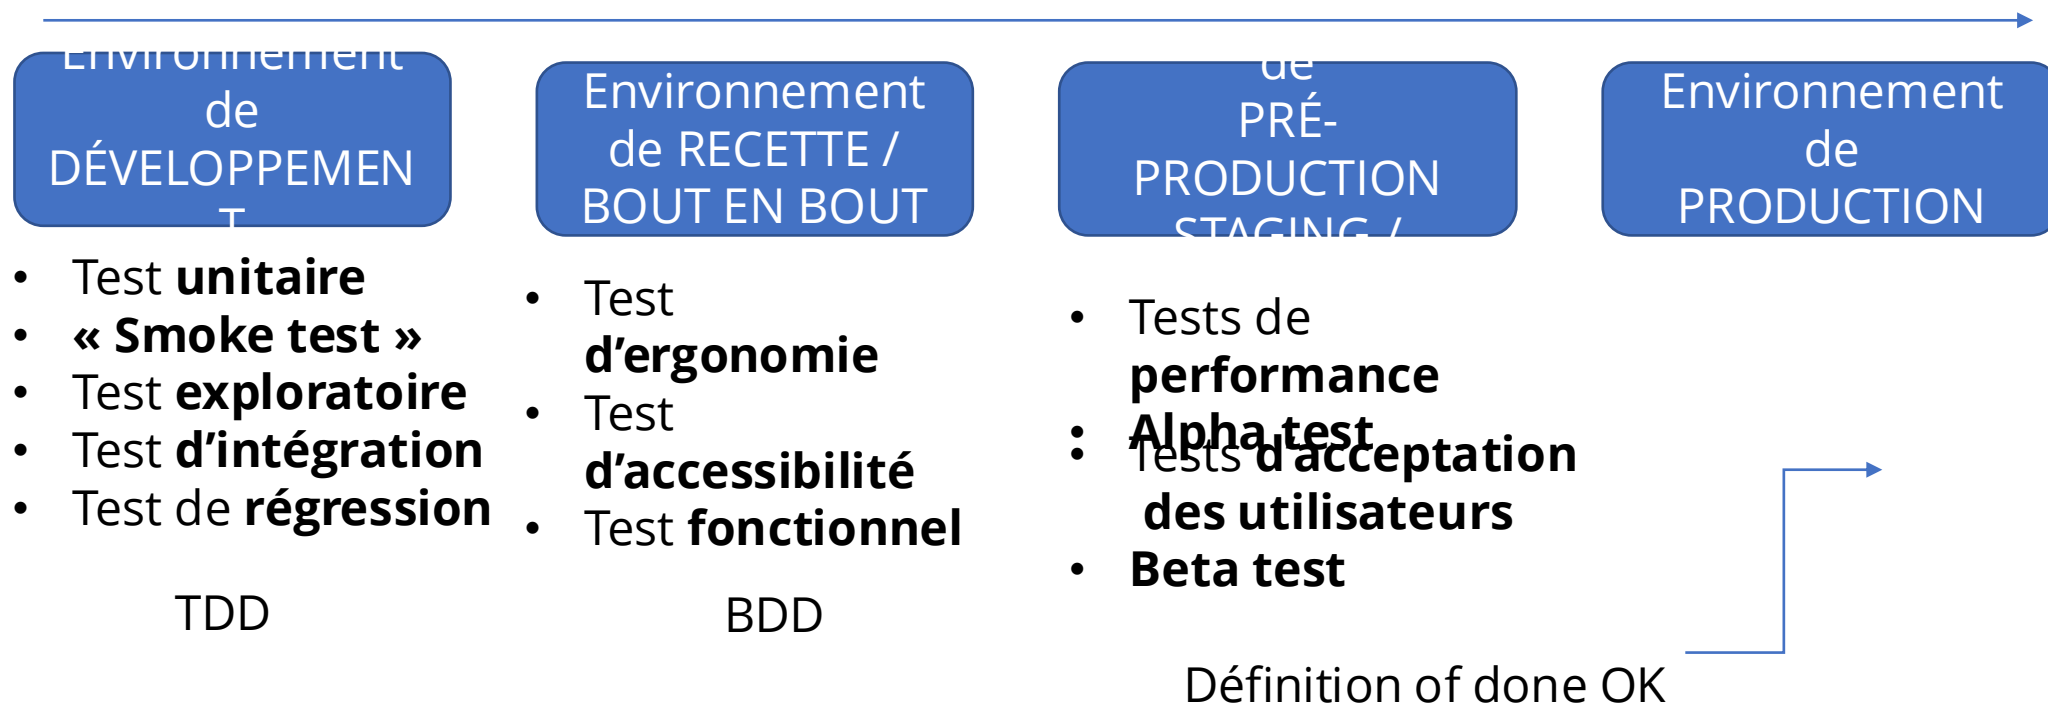


Les tests utilisateurs

- Les tests utilisateurs sont une pratique centrée sur **l'obtention de retours directement des utilisateurs finaux** pour évaluer la fonctionnalité, l'utilisabilité et l'efficacité d'un produit ou d'un service
- Cette pratique valorise la collaboration, l'adaptabilité et l'amélioration continue.
- Ils peuvent être fait au besoin et donc à n'importe quel moment !

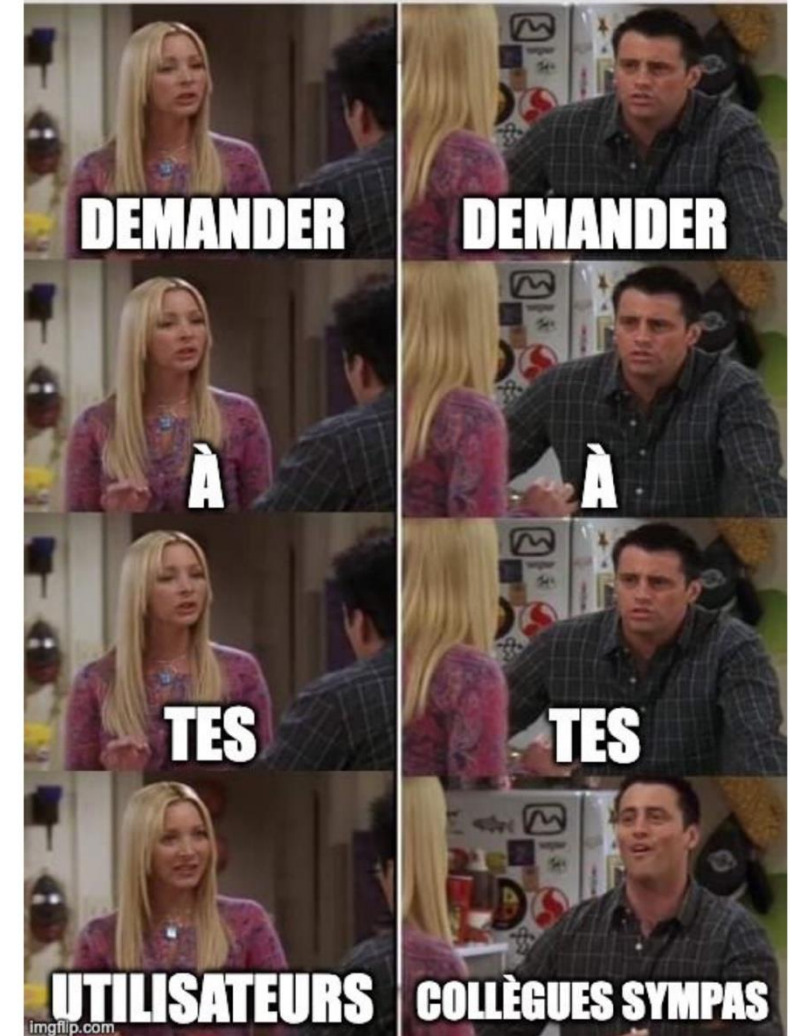

Définition of Ready

- Liste de contrôle pour soutenir la préparation d'un élément avant qu'il ne soit accepté par une équipe pour un sprint.
- Le Scrum Guide l'interdit :
En Scrum, les éléments sélectionnés en Sprint planning ne sont pas forcément « ready ».

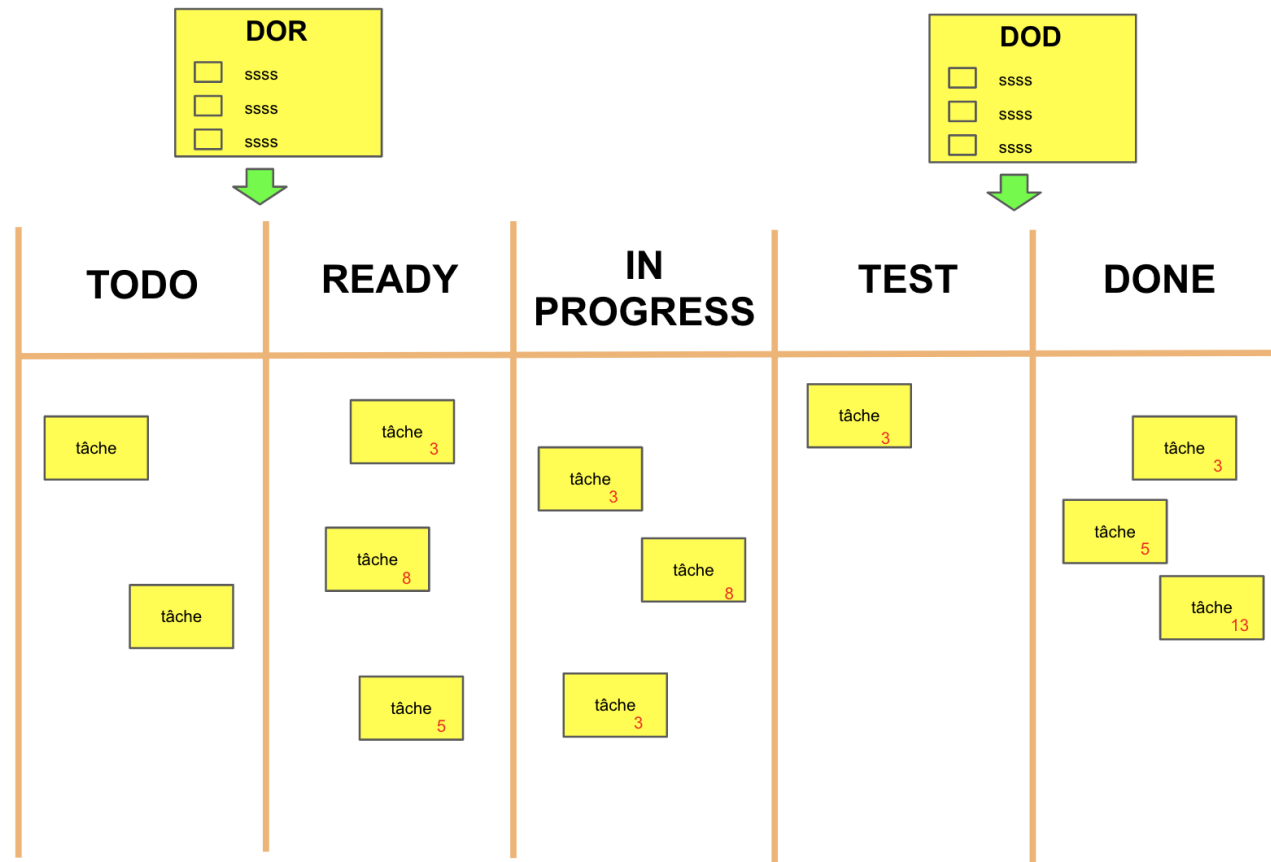


Erreurs à éviter

- Ne pas avoir de Backlog de produit
- Avoir plusieurs Backlogs pour un seul produit (ou d'autres sources parasites, comme un gestionnaire d'anomalies)
- Ne pas partager le Backlog avec toute l'équipe
- Ne jamais actualiser le Backlog
- Confondre avec le Backlog d'itération en y mettant des tâches
- Avoir plus de 150 éléments actifs à faire dans le Backlog
- Ne pas prioriser les éléments ou donner des priorités égales

Product Owner Proxy

Un Proxy Product Owner (Proxy PO) est un intermédiaire :

- Recueillir les besoins des clients.
 - Définir et commander le Product Backlog.
 - Planifiez comment réaliser le Backlog avec l'équipe.
 - Décidez quand les incréments de produit peuvent être distribués aux clients.
-
- Ce n'est pas le propriétaire du produit !
 - Ne contrôle pas le budget du produit.
 - Ne définit ni la vision du produit ni sa stratégie.
 - N'a pas le dernier mot sur le Backlog et ses items.
-
- Attention : cela n'existe pas en Scrum, importance d'une seule personne qui prend les décisions !

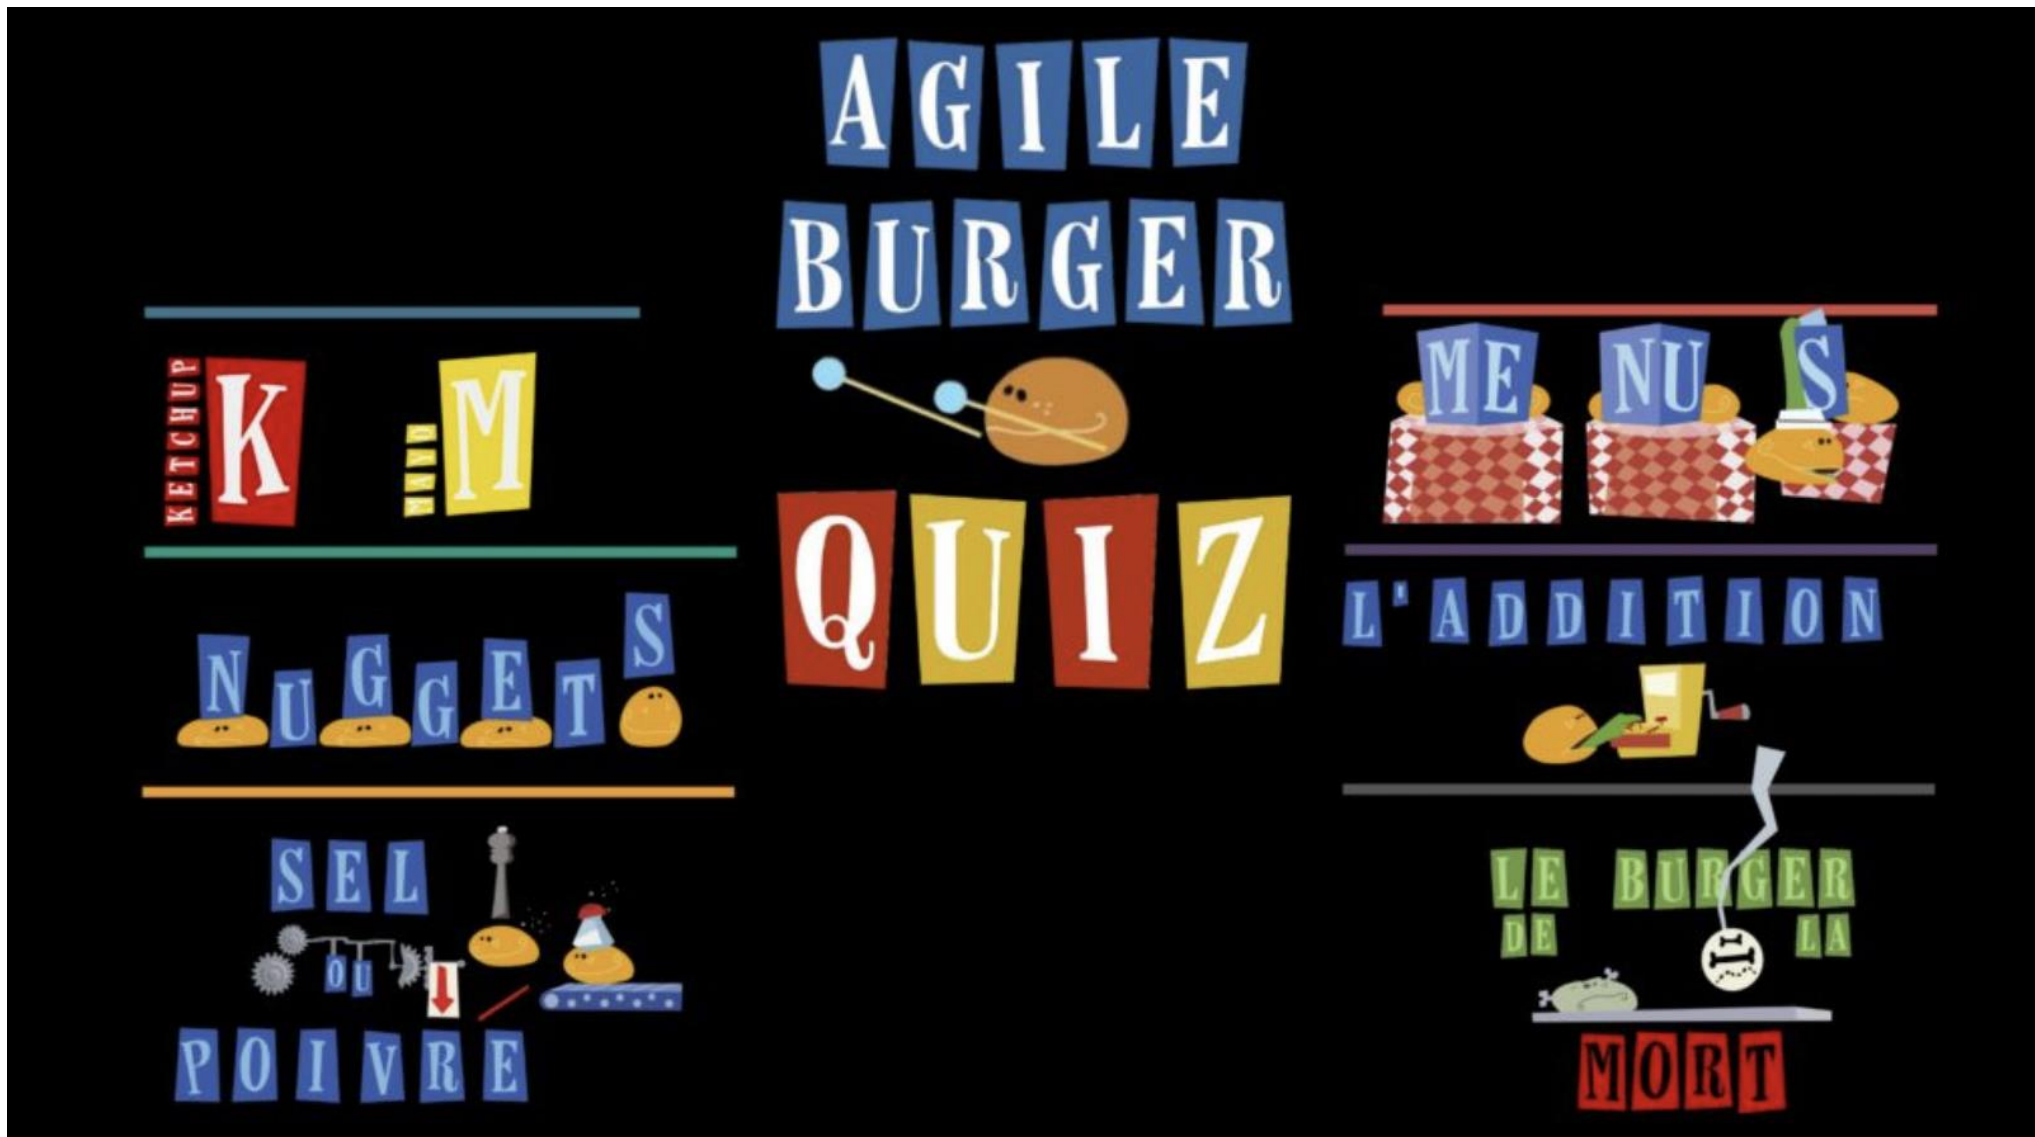

Quiz Scrum.org

- **On average, items on the Product Backlog tend to be ____**
 - a. Larger than those on the Sprint Backlog
 - b. Smaller than those on the Sprint Backlog
 - c. The same size as those on the Sprint Backlog

- **En moyenne, les éléments du Product Backlog ont tendance à être ____**
 - a. Plus grands que ceux du Sprint Backlog
 - b. Plus petits que ceux du Sprint Backlog
 - c. La même taille que celles du Sprint Backlog

Quiz Scrum.org

- **On average, items on the Product Backlog tend to be ____**
 - a. Larger than those on the Sprint Backlog
 - b. Smaller than those on the Sprint Backlog
 - c. The same size as those on the Sprint Backlog

Voici comment cela fonctionne : lorsque vous ajoutez les éléments au Product Backlog pour la première fois, vous n'avez pas à les décomposer en éléments très petits et clairs, car il s'agit d'une forme de planification initiale. Certains d'entre eux peuvent être très grands.

Lorsque vous commandez les éléments, s'ils sont en haut de la liste, vous devez les préciser et vous assurer qu'ils peuvent tenir dans un seul Sprint ; par conséquent, vous les décomposerez en éléments plus petits. Certains de ces éléments enfants peuvent rester en haut, et certains peuvent descendre. Par conséquent, les éléments en haut du Product Backlog sont en moyenne plus petits que ceux en bas.

D'autre part, les éléments du Sprint Backlog proviennent du haut du Product Backlog, on peut donc dire que les éléments du Sprint Backlog sont, en moyenne, plus petits que les éléments du Product Backlog.

Quiz Scrum.org

- **Which three statements are correct about non-functional requirements?**
- a. Scrum is all about functional requirements.
- b. Some of them can be added to the Definition of Done.
- c. They will be reflected in the Sprint Goal.
- d. They should be incorporated into every increment.
- e. They will be considered in the Hardening Sprints.
- f. Some of them can be added to the Product Backlog.
- g. They will be in the Sprint Backlog, but not the Product Backlog.
- **Quels sont les trois énoncés corrects concernant les exigences non fonctionnelles ?**
- a. Scrum est uniquement une question d'exigences fonctionnelles.
- b. Certains d'entre eux peuvent être ajoutés à la définition de Terminé.
- c. Elles seront reflétées dans l'objectif de sprint.
- d. Elles doivent être intégrées à chaque incrément.
- e. Elles seront prise en compte dans les sprints de durcissement.
- f. Certains d'entre elles peuvent être ajoutés au Product Backlog.
- g. Elles seront dans le Sprint Backlog, mais pas dans le Product Backlog.

Quiz Scrum.org

- **Which three statements are correct about non-functional requirements?**

- a. Scrum is all about functional requirements.
- **b. Some of them can be added to the Definition of Done.**
- c. They will be reflected in the Sprint Goal.
- **d. They should be incorporated into every increment.**
- e. They will be considered in the Hardening Sprints.
- **f. Some of them can be added to the Product Backlog.**
- g. They will be in the Sprint Backlog, but not the Product Backlog.

a. Il y a toujours des exigences non fonctionnelles.

b. Par exemple. sécurité, évolutivité, maintenabilité

c. Les fonctionnalités non fonctionnelles concernent le fonctionnement des fonctionnalités fonctionnelles, et non nos objectifs pour les sprints.

d. Par exemple. Sécurité

e. Il n'y a pas de sprints de durcissement.

f. Par exemple. quelque chose lié à la performance d'une certaine partie du logiciel

g. Tous les éléments du Sprint Backlog proviennent du Product Backlog, à l'exception des éléments d'amélioration de processus qui sont générés dans les rétrospectives de Sprint.

Quiz Scrum.org

- **Who is responsible for explaining the Product Backlog items?**
 - a. Scrum Master
 - b. User representative(s)
 - c. Business Analyst
 - d. The Development Team is self-organized and has to talk to anyone necessary, and find out the meanings of items.
 - e. Product Owner

- **Qui est chargé d'expliquer les éléments du Product Backlog ?**
 - a. Scrum master
 - b. Représentant(s) des utilisateurs
 - c. Business Analyst
 - d. Les développeurs sont auto-organisées et doivent parler à toute personne nécessaire et découvrir la signification des éléments.
 - e. Product Owner

Quiz Scrum.org

Who is responsible for explaining the Product Backlog items?

- a. Scrum Master
- b. User representative(s)
- c. Business Analyst
- d. The Development Team is self-organized and has to talk to anyone necessary, and find out the meanings of items.
- **e. Product Owner**

C'est l'une des responsabilités du Product Owner d'expliquer ce que signifie chaque élément du Product Backlog et de s'assurer que tout le monde a la bonne compréhension. Cela se fait lorsque l'élément est défini pour la première fois, et également pendant le Sprint lorsque les développeurs travaillent sur l'élément et peuvent avoir des doutes.

Quiz Scrum.org

- **A Scrum project is supposed to have two releases: one in the middle and the other at the end of the project. Which of the following statements is correct?**
 - a. Increments are created for investigation and adaptation; they don't have to be releasable.
 - b. Increments that are created before each release should be releasable.
 - c. All increments should be releasable.
 - d. Having releasable Increments depends on the operations' preference.

Un projet Scrum est censé avoir deux versions : une au milieu et l'autre à la fin du projet laquelle des déclarations suivantes est correcte?

- a. Des incréments sont créés pour l'investigation et l'adaptation ; ils n'ont pas besoin d'être livrables.
- b. Les incréments créés avant chaque version doivent pouvoir être livrable.
- c. Tous les incréments doivent être livrables.
- d. Avoir des incréments livrables dépend de la préférence des opérations.

Quiz Scrum.org

- **A Scrum project is supposed to have two releases: one in the middle and the other at the end of the project. Which of the following statements is correct?**
 - a. Increments are created for investigation and adaptation; they don't have to be releasable.
 - b. Increments that are created before each release should be releasable.
 - **c. All increments should be releasable.**
 - d. Having releasable Increments depends on the operations' preference.

Tous les incréments doivent être potentiellement publiables pour permettre un retour d'information utilisable, quelles que soient les versions réelles que nous pouvons avoir.

Quiz Scrum.org

- **What do we do with Done items when the Sprint is cancelled?**
 - a. They will be reviewed, and if they are potentially releasable, the Product Owner typically accepts them.
 - b. They should be moved back to the Product Backlog, and will be taken care of in future Sprints.
 - c. They should be moved to the next Sprint Backlog.

Que fait-on des éléments Terminés lorsque le Sprint est annulé ?

- a. Ils seront examinés, et s'ils sont potentiellement livrables, le Product Owner les accepte généralement.
- b. Ils doivent être replacés dans le Product Backlog et seront pris en charge dans les futurs Sprints.
- c. Ils doivent être déplacés vers le prochain Sprint Backlog.

Quiz Scrum.org

- **What do we do with Done items when the Sprint is cancelled?**
 - a. They will be reviewed, and if they are potentially releasable, the Product Owner typically accepts them.
 - b. They should be moved back to the Product Backlog, and will be taken care of in future Sprints.
 - c. They should be moved to the next Sprint Backlog.

- b. Mais ils sont terminés, pourquoi devrions-nous les replacer dans le Product Backlog ?
- c. Les éléments du Sprint Backlog proviennent du Product Backlog. Donc, si c'est censé être fait, nous les replacerons dans le Product Backlog, et s'ils sont toujours en haut du Product Backlog, ils seront sélectionnés pour le prochain Sprint. Cependant, cette question concerne les éléments terminés et il n'y a aucune raison de les reculer.

Un Sprint peut être annulé si l'Objectif de Sprint devient obsolète.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are outputs of the Sprint Planning meeting?**
 - a. Estimations for the sizes of items
 - b. Resource assignment
 - c. Tasks
 - d. Order of items in the Product Backlog
 - e. Items selected from the Product Backlog
- **Parmi les éléments suivants, lesquels sont les résultats de la réunion de planification de sprint ?**
 - a. Estimations de la taille des items
 - b. Affectation des ressources
 - c. Tâches
 - d. Ordre des items dans le Product Backlog
 - e. Items sélectionnés dans le Product Backlog

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are outputs of the Sprint Planning meeting?**
 - a. Estimations for the sizes of items
 - b. Resource assignment
 - **c. Tasks**
 - d. Order of items in the Product Backlog
 - **e. Items selected from the Product Backlog**

- a. Nous pouvons réestimer les éléments lors de la planification du sprint, mais ce n'est pas nécessaire, et cela se fait normalement via le sprint lorsque nous affinons le Product Backlog.
- b. S'il s'agit d'attribuer des tâches aux développeurs, cela se fait pendant le Sprint.
- c. N'oubliez pas que seules certaines des tâches sont créées pendant la planification du sprint, le reste est créé pendant le sprint.
- d. Raffinement du carnet de produit

Quiz Scrum.org

- **The first Sprint can start as soon as the Product Backlog is complete.**
 - a. TRUE
 - b. FALSE
- **Le premier Sprint peut démarrer dès que le Product Backlog est complet.**
 - a. vrai
 - b. faux

Quiz Scrum.org

- **The first Sprint can start as soon as the Product Backlog is complete.**
 - a. TRUE
 - **b. FALSE**

Le Product Backlog n'est jamais complet. Il évolue toujours dans les méthodes adaptatives.

Quiz Scrum.org

- **Which of the following best describes the way a Product Owner can order the items in the Product Backlog?**
 - a. Based on size; larger items on the top
 - b. Based on risk; safer items on the top
 - c. Based on value; more valuable items on the top
 - d. Based on size; smaller items on the top
- **Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la manière dont un Product Owner peut prioriser les items du Product Backlog ?**
 - a. Basé sur la taille; items plus grands sur le dessus
 - b. Basé sur le risque; items plus sûrs sur le dessus
 - c. Basé sur la valeur ; plus d'items de valeur sur le dessus
 - d. Basé sur la taille; petit items sur le dessus

Quiz Scrum.org

- **Which of the following best describes the way a Product Owner can order the items in the Product Backlog?**
 - a. Based on size; larger items on the top
 - b. Based on risk; safer items on the top
 - **c. Based on value; more valuable items on the top**
 - d. Based on size; smaller items on the top

Le but ultime est de maximiser la valeur [commerciale] du produit. L'approche à l'ancienne en Agile consiste à considérer la valeur du produit comme la somme de la valeur des fonctionnalités (éléments du Product Backlog). En d'autres termes, une certaine valeur commerciale est prise en compte pour chaque élément, qui est également la base de la commande d'éléments dans le carnet de commandes.

Cependant, il existe une relation non linéaire entre les fonctionnalités (éléments du Product Backlog) et la valeur de leur combinaison dans le produit.

C'est pourquoi il est difficile de penser à la valeur commerciale des articles individuels. En raison de cette difficulté, les principales ressources, telles que Scrum.org, ne limitent plus les critères de classement à la valeur. Vous commanderez les articles en fonction de leur valeur, de leur priorité, de leurs risques et de leurs dépendances (le cas échéant).

Donc, pour votre examen, si vous avez le choix élaboré (valeur, priorité, risques et dépendances), choisissez-le. S'il n'y a pas un tel choix, optez pour le traditionnel (valeur).

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is correct about the Product Owner role?**
 - a. Helps the organization implement Scrum
 - b. Is accountable for all changes to the Product Backlog
 - c. Is responsible for assigning work during the Sprint
 - d. Participates in the Daily Scrum meeting

Lequel des énoncés suivants est correct concernant le rôle de Product Owner ?

- a. Aide l'organisation à mettre en œuvre Scrum
- b. Est responsable de tous les changements apportés au Product Backlog
- c. Est responsable de l'attribution du travail pendant le Sprint
- d. Participe à la réunion Daily Scrum

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is correct about the Product Owner role?**

- a. Helps the organization implement Scrum
- **b. Is accountable for all changes to the Product Backlog**
- c. Is responsible for assigning work during the Sprint
- d. Participates in the Daily Scrum meeting

a. Réalisé par le Scrum Master

b. Le Product Owner est propriétaire du Product Backlog et, par défaut, est la seule personne qui y apporte des modifications. Ils peuvent déléguer certaines de leurs responsabilités à d'autres, comme les développeurs, mais le Product Owner reste responsable.

c. L'équipe de développement est auto-organisée et gère elle-même les affectations de travail, au lieu de recevoir des commandes de quelqu'un d'autre.

d. Seuls les membres de l'équipe de développement participent. D'autres peuvent y assister, mais ils ne doivent pas parler.

Quiz Scrum.org

- **Which statement best describes the Product Backlog?**
 - a. Contains only small and clear items.
 - b. It changes as we learn more about the project.
 - c. It's used to create the project plan.
 - d. Contains all tasks identified by the developers.

- **Quelle affirmation décrit le mieux le Product Backlog ?**
 - a. Ne contient que des petits items clair et précis.
 - b. Cela change au fur et à mesure que nous en apprenons plus sur le projet.
 - c. Il est utilisé pour créer le plan de projet.
 - d. Contient toutes les tâches identifiées par les développeurs.

Quiz Scrum.org

- **Which statement best describes the Product Backlog?**

- a. Contains only small and clear items.
- b. It changes as we learn more about the project.
- c. It's used to create the project plan.
- d. Contains all tasks identified by the developers.

a. Les éléments au bas du Product Backlog peuvent être volumineux et peu clairs.

c. Il n'y a pas de "plan de projet" dans Scrum. Le Product Backlog est ce qui se rapproche le plus d'un plan de projet que nous ayons dans Scrum.

d. Les tâches sont identifiées lors de la réunion de planification de sprint ou pendant le sprint, et sont capturées uniquement dans le backlog de sprint.

Quiz Scrum.org

- **At the end of the Sprint, all items are done except for one that is almost done. What should be done with this item?**
 - a. Demonstrate it in the Sprint Review meeting, if the item is presentable in its current state.
 - b. The Sprint will be extended until we complete the item.
 - c. It can be added to the Increment if the user acceptance tests are done.
 - d. Do not include it in the Increment.
- **A la fin du Sprint, tous les éléments sont terminés sauf un qui est presque terminé. Que faire de cet item ?**
 - a. Démontrez-le lors de la réunion Sprint Review, si l'élément est présentable dans son état actuel.
 - b. Le Sprint sera prolongé jusqu'à ce que nous terminions l'item.
 - c. Il peut être ajouté à l'incrément si les tests d'acceptation des utilisateurs sont effectués.
 - d. Ne l'incluez pas dans l'incrément.

Quiz Scrum.org

- **At the end of the Sprint, all items are done except for one that is almost done. What should be done with this item?**
 - a. Demonstrate it in the Sprint Review meeting, if the item is presentable in its current state.
 - b. The Sprint will be extended until we complete the item.
 - c. It can be added to the Increment if the user acceptance tests are done.
 - d. **Do not include it in the Increment.**
-
- a. Nous ne présentons que l'incrément, et l'incrément ne contient que les éléments DONE.
 - b. Les sprints sont limités dans le temps, ce qui signifie que nous ne prolongeons pas leur durée.
 - c. L'incrément ne contient que des éléments 100 % DONE.
 - d. Tout dans l'incrément doit être fait ; c'est-à-dire 100 % FAIT ! Si un élément n'est pas fait, nous ne l'inclurons pas dans l'Incrément et le renverrons au Product Backlog

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are correct about the Product Owner role?**
 - a. Identifies all requirements
 - b. Makes sure that enough items are picked for the Sprint
 - c. Is responsible for measuring the performance of the project
 - d. Estimates the Product Backlog items
 - e. Measures the progress of releases
- **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes concernant le rôle de Product Owner ?**
 - a. Identifie toutes les exigences
 - b. S'assure que suffisamment d'éléments sont sélectionnés pour le Sprint
 - c. Est responsable de la mesure de la performance du projet
 - d. Estimer les items du Product Backlog
 - e. Mesure l'avancement des releases

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are correct about the Product Owner role?**

- a. Identifies all requirements
- b. Makes sure that enough items are picked for the Sprint
- c. Is responsible for measuring the performance of the project
- d. Estimates the Product Backlog items
- e. Measures the progress of releases

- a. La plupart des exigences sont identifiées par le Product Owner, mais certaines exigences techniques sont également identifiées par l'équipe de développement.
- b. L'équipe de développement décide du nombre d'éléments qu'elle peut choisir pour le Sprint, et personne d'autre ne peut annuler cette décision.
- c. Réalisé par le Product Owner
- d. Seuls ceux qui développeront les éléments (c'est-à-dire l'équipe de développement) peuvent estimer la quantité de travail. Lorsque « estimer » est utilisé seul, se réfère à l'estimation de la taille ou de la quantité d'effort requis.
- e. Réalisé par le Product Owner

Quiz Scrum.org

- **Who estimates the value of Product Backlog items?**
- a. The Project Manager
- b. Stakeholders
- c. The Team Leader
- d. The customer
- e. The Development Team
- f. The Product Owner

Qui estime la valeur des éléments du Product Backlog ?

- a. Le chef de projet
- b. Parties prenantes
- c. Le chef d'équipe
- d. Le client
- e. Les développeurs
- f. Le product owner

Quiz Scrum.org

- **Who estimates the value of Product Backlog items?**

- a. The Project Manager
- b. Stakeholders
- c. The Team Leader
- d. The customer
- e. The Development Team
- **f. The Product Owner**

a. Il n'y a pas de chef de projet dans Scrum.

c. Il n'y a pas de chef d'équipe dans Scrum. "Estimation", lorsqu'elle est utilisée sans informations supplémentaires, concerne l'estimation de la taille des éléments, qui est effectuée par les développeurs. Cependant, cette question concerne "l'estimation de la valeur", qui est différente, et qui est effectuée par le Product Owner.

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**

Chap. 3 : LES DÉVELOPPEURS

Les développeurs

- Un principe majeur de l'équipe : l'auto-organisation (self-organization)
=> Scrum Team autogérée (version 2020)
- Manifeste Agile, Principe n°11 : « Les meilleurs architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées »
- Seuls à décider la manière dont ils vont réaliser les fonctionnalités du sprint backlog.
- Pas de liens hiérarchiques.
- Les petites équipes communiquent mieux et sont plus productives.
- Ils ne sont pas forcément programmeurs !

Les développeurs

- Expertise nécessaire à la réalisation d'un produit
- Transformer les besoins transmis par le Product Owner en nouvelles fonctionnalités dans l'application.
L'objectif sera toujours de maximiser la valeur.
- Responsable de l'incrément
- Chargés de l'estimation
- Réalisateurs

Equipe Cross-fonctionnelle

FUNCTIONAL



System analysts




Developers



Testers

CROSS - FUNCTIONAL





SCRUM TEAM

Max 10 => plusieurs équipes si besoin

Feature team / component team

=> Spécialisation mais
Gestion des dépendances

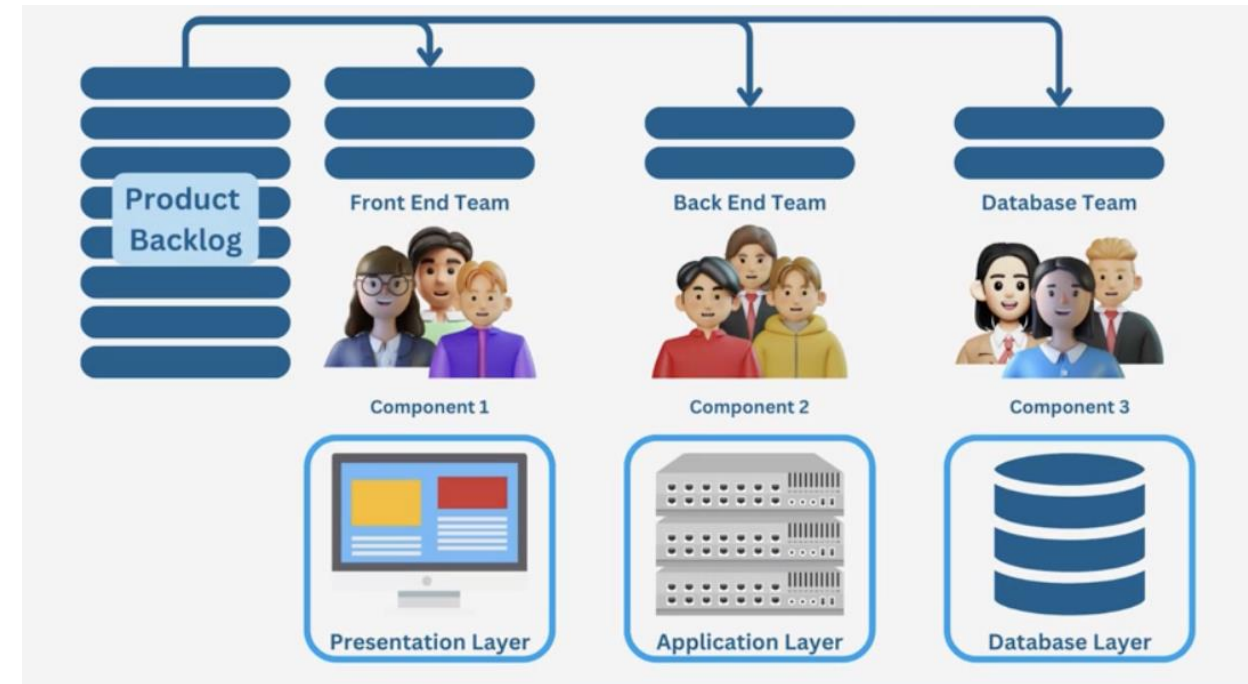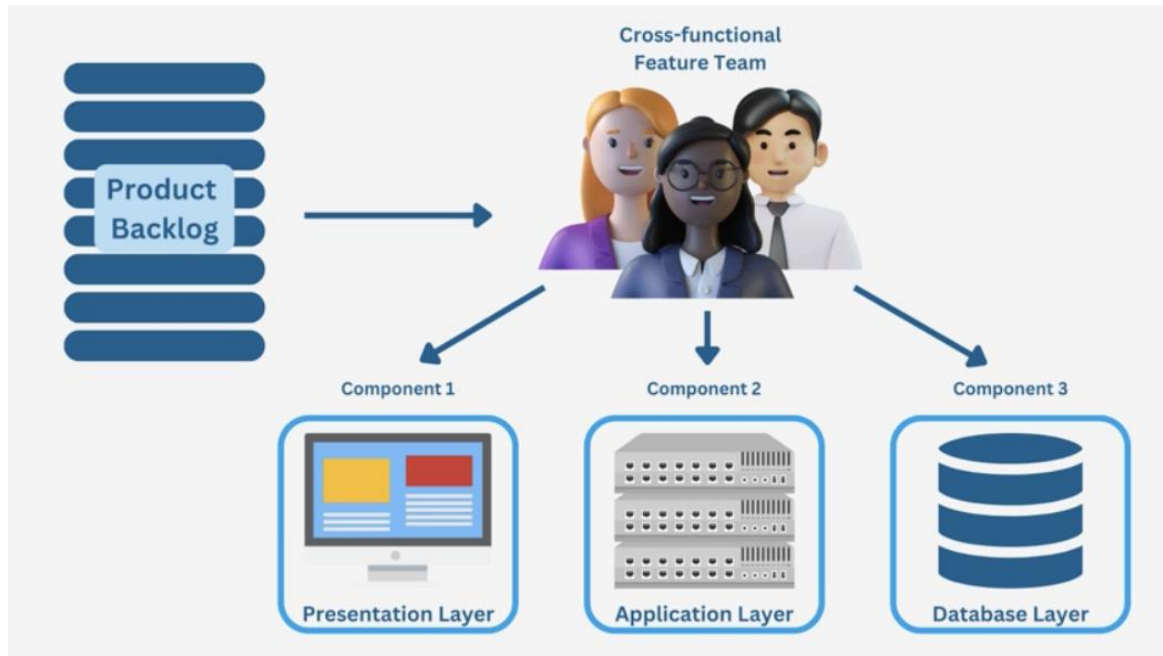

- Rendre visible les dépendances
- Les éléments avec des dépendances externes ne sont pas considérés comme « ready » pour la sélection lors de la planification du sprint

Le sprint backlog

- Composé de fonctionnalités issu du product Backlog en fonction de la priorisation exprimée par le PO.
- Le nombre de ces Items est décidé par l'équipe après éventuelle estimation.
- Ces fonctionnalités/items/User Stories sont découpées en tâches à réaliser par les développeurs
- Une mise à jour de l'état de chaque tâche permet d'être transparent sur l'avancement.
- Le Sprint Backlog évolue en permanence durant le Sprint.
- Le Sprint Backlog est la responsabilité des développeurs

Le sprint goal

- Un Sprint Goal est un but fixé pour le Sprint déterminé par la scrum team
 - Il doit apporter de la valeur au produit, à l'utilisateur, aux parties prenantes.
 - Les développeurs l'utilisent quotidiennement
 - Le Product Owner l'utilise pour communiquer
 - Le Scrum Master s'en sert pour veiller au cap
 - C'est une phrase simple à comprendre par tous.
- 👉 Voilà quelques exemples de bons objectifs de sprint :

 - ✓ "Les utilisateurs peuvent maintenant payer par carte de crédit"
 - ✓ "Les factures sont éditées automatiquement chaque nuit"
 - ✓ "Le membre peut se loguer à son espace client via un compte Google"
 - ✓ "Le taux de conversion de la page x est passé de 5 à 8%"
 - ✓ "La page d'administration charge maintenant en moins de 3 secondes"



Source : LinkedIn : Jean Christophe Pagès

Dette technique

- Concept ayant pour but de sensibiliser les développeurs et les décideurs à l'impact d'un code mal réalisé.

Exemple :

- des bugs
- des parties de code devenues obsolètes
- un code qui ne va pas à l'essentiel
- non respect des normes de codage

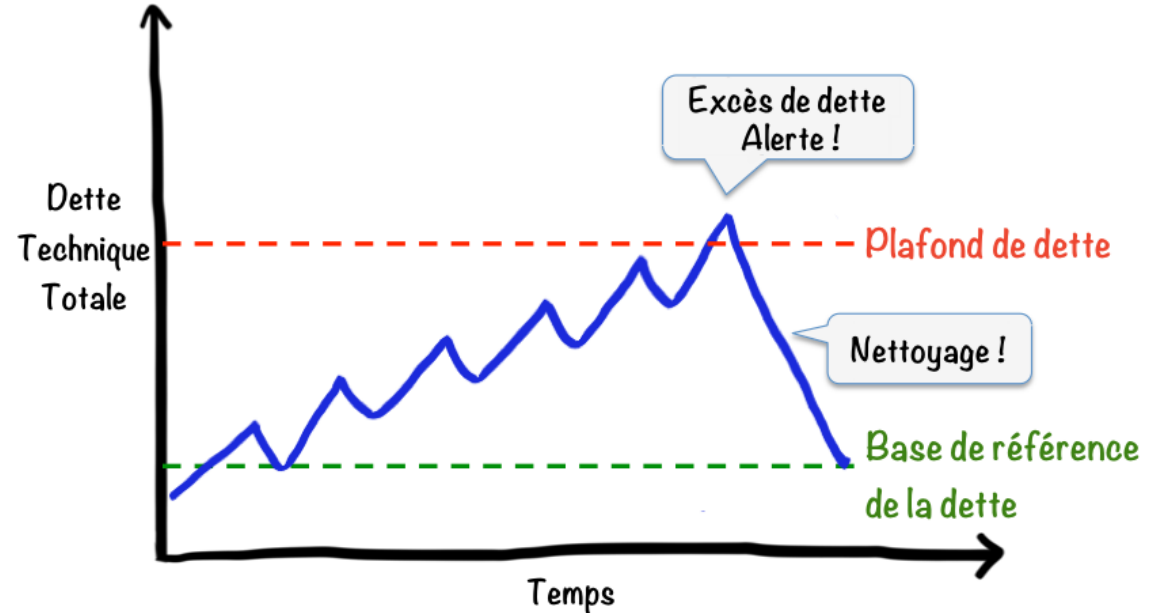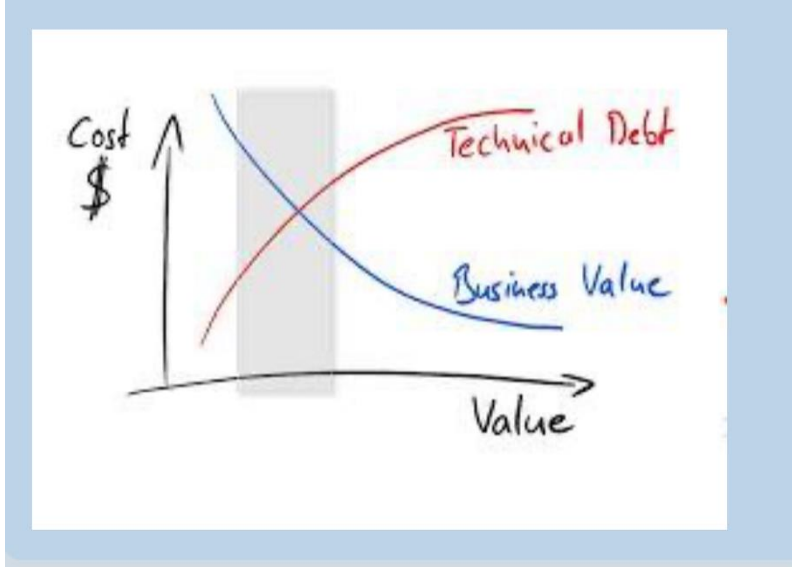

Vélocité d'une équipe

- C'est le nombre de points traités en une itération
 - Elle traduit la capacité de l'équipe
 - En nombre de points par itération
 - Permet de fixer un périmètre réaliste à l'itération à venir en se fondant sur l'extrapolation des itérations passées (aspect empirique)
 - Repère quantitatif
 - Mode de calcul
 - Moyenne des itérations
 - Les itérations deux et trois permettent de dégager une tendance
 - Points de vigilance :
 - La vélocité n'est pas un outil de management pour optimiser la capacité de l'équipe
 - L'augmentation de la vélocité n'est pas toujours une bonne nouvelle
 - C'est un outil de planification pour le reste du projet
- Le point d'effort ?
Ce n'est pas un nombre de jour/homme
 - Difficulté
 - Effort
 - Risques
 - Incertitudes
 - Inter-dépendances

Le planning poker

Annonces · Résultats planning poker jeu de carte



Cartes de poker à
planification agile -
augmentez la...

14,97 €

[Amazon.fr](https://www.amazon.fr)

+4,99 € de frais d...



Estimation Poker
Cards for Planning
Poker

9,43 €

7,99 £GB

[Agile Stationery](https://www.agilestationery.com)

+9,43 € de frais d...



Legamaster
LEGAMASTER Plan
ning Cartes de...

9,42 €

[Amazon.fr](https://www.amazon.fr)

+4,99 € de frais d...



Cartes de poker
Legamaster
Planning 52 pièce...

55,40 €

[PROFISHOP.fr](https://www.profishop.fr)

Livraison gratuite



Jeu de Planning
Poker pour 10
joueurs - Paquets...

49,00 €


[Amazon.fr](https://www.amazon.fr)

Livraison gratuite

Management visuel / Burn Down Chart


- Le burn down chart?
 - la quantité de travail restant dans le sprint
 - Droite de progression idéale pour savoir quand le travail sera fini...
- Mais...
 - le sprint peut être adapté en cours de sprint pour progresser vers l'objectif de sprint.

Il ne donne aucune indication sur l'objectif de sprint, aucune notion de valeur
- Il est utile pour ...
 - voir si le travail avance, s'il y en a trop, donne des indications sur nos pratiques...

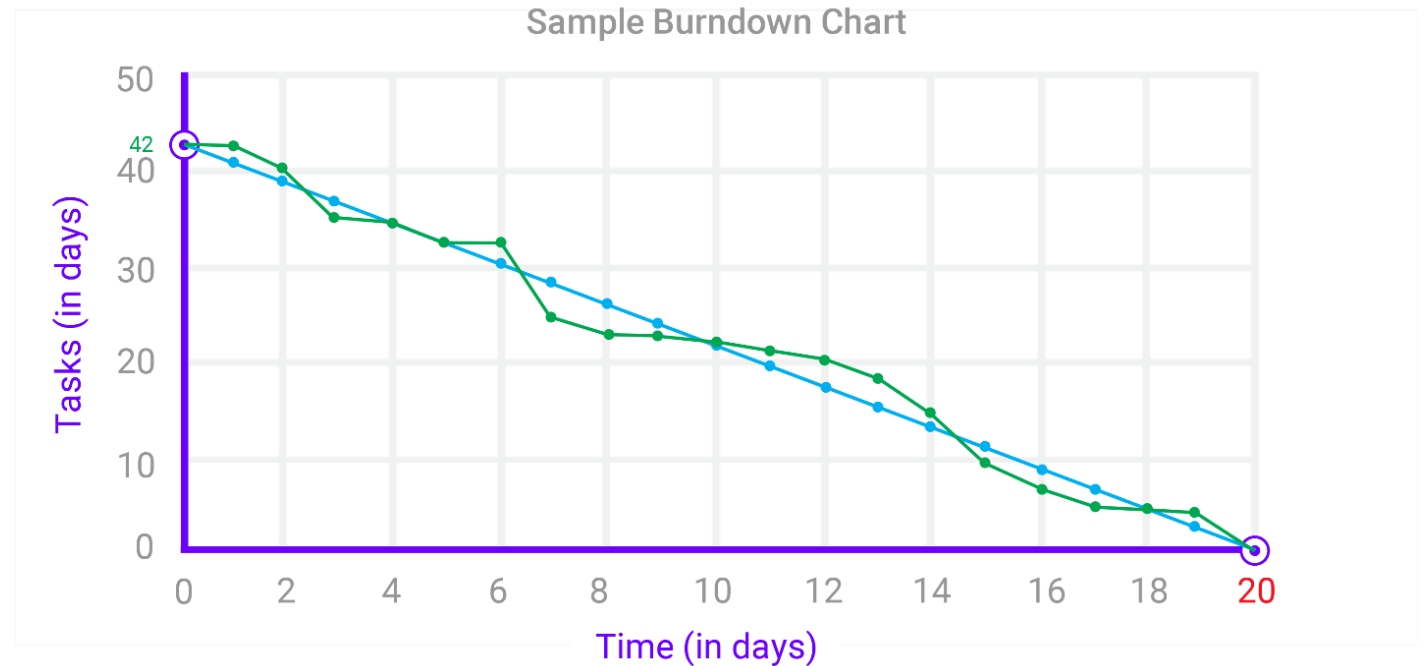


Management visuel / Diagramme de flux cumulés

- Vient du Kanban
- Limit WIP
- Etape en manque de tickets
- Faire de la prédictibilité
- Un backlog trop important

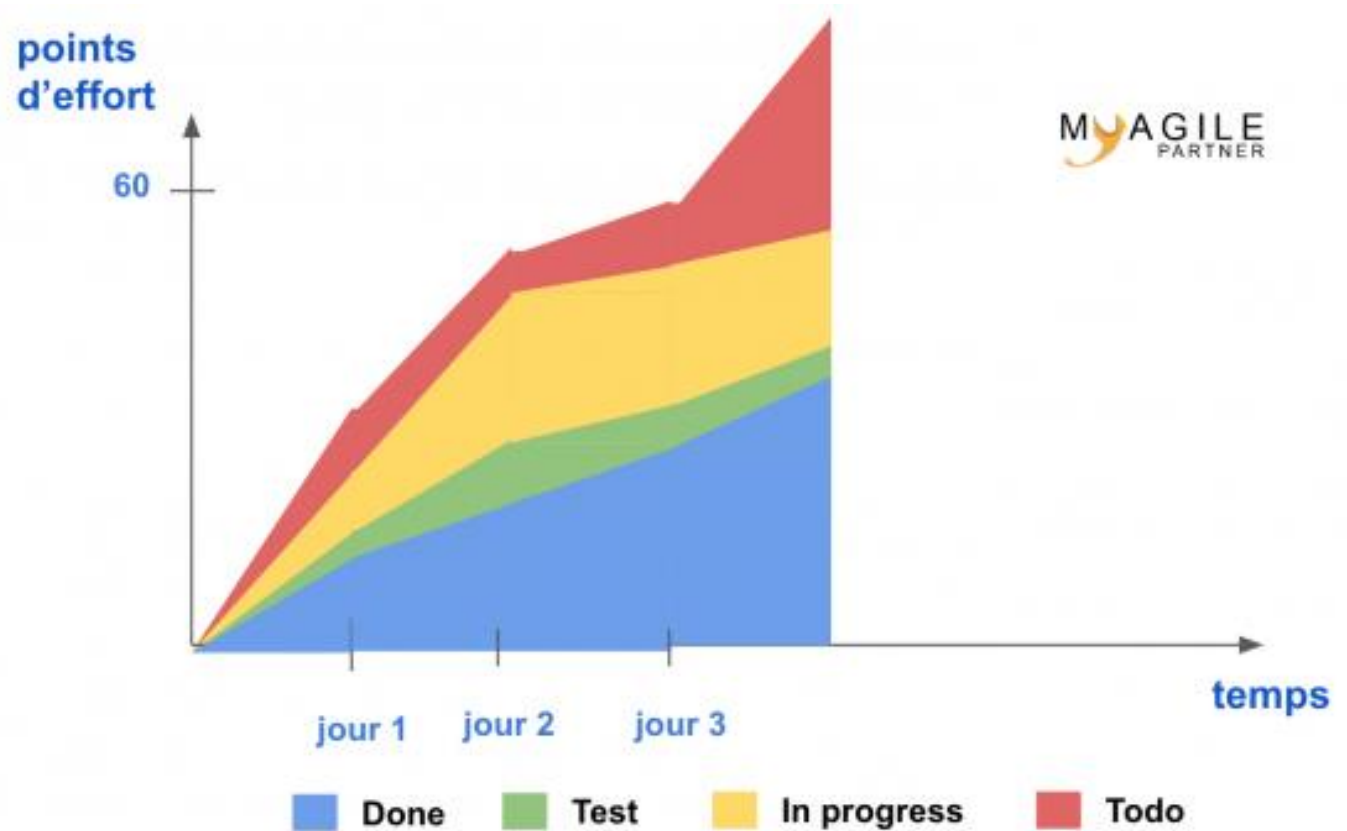

Le spike

- Activité déclenchée justement pour explorer un sujet, quand on ne sait pas estimer...
- La user story n'est pas « PRETE » et ne peut être estimée...
- on ne sait pas trop où on va (notamment techniquement)
- Besoin d'un temps d'étude
- Maximum 2 jours
- Se termine par la production d'un résultat concret
- Examiné lors de la revue de sprint

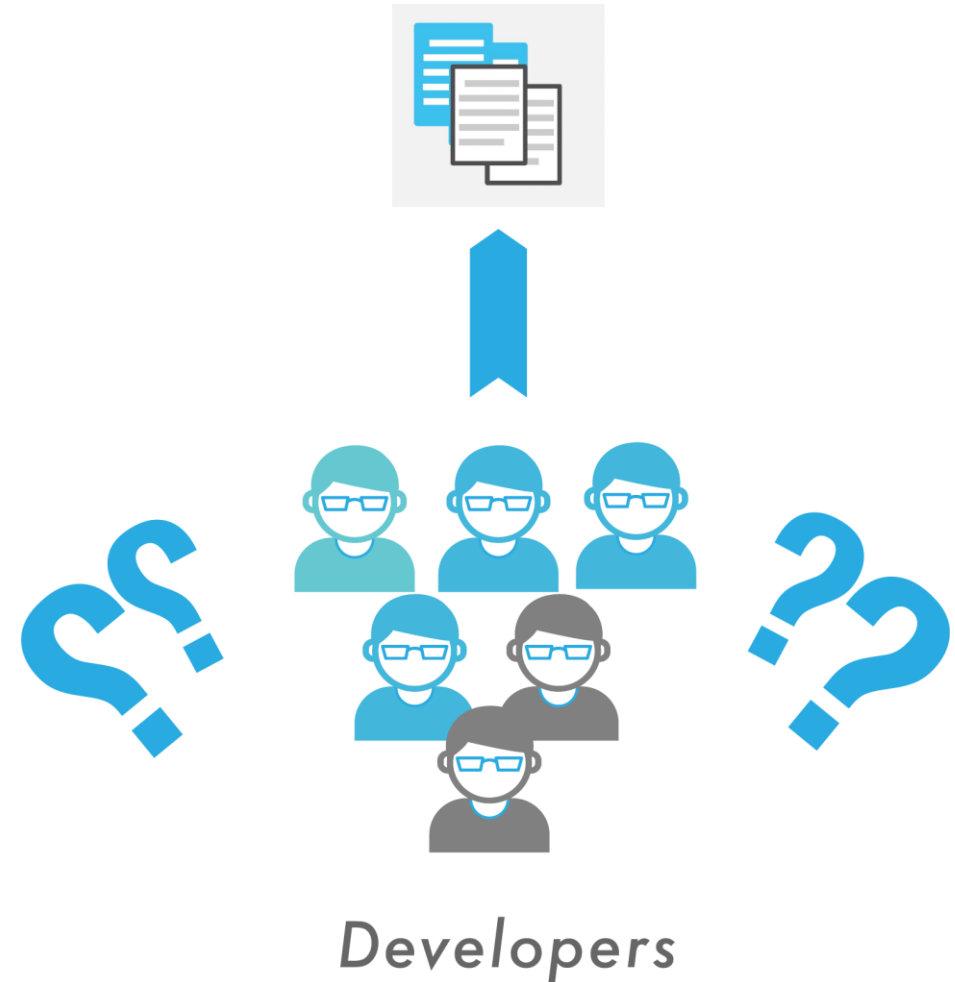

Le backlog refinement : attention pas grooming

Objectif du backlog refinement

- Affiner et prioriser le backlog de produit
- S'assurer que les items du backlog seront discutés et prêt au démarrage du sprint suivant
- Anticiper les impacts et activités à moyen terme
- Permet de fluidifier le developpement

Qui participe ?

- Product owner
- Développeurs
- Scrum master (pas obligatoire)

Quand ?

- Pour le product owner : autant que nécessaire
- Pour les développeurs : pas plus de 10% du temps de développement
- Ce n'est pas un événement, mais par exemple 1 fois par semaine.

Optimiser la qualité en Scrum

Principe n°9 du Manifeste Agile : Porter continuellement attention à l'excellence technique et à la qualité de la conception renforce l'agilité.

- Definition of done bien rédigée : critères pour qu'un incrément soit utilisable et publiable
- Régler immédiatement les bugs en cours de sprint
- Suivre la dette technique dans le backlog et la diminuer à chaque sprint
- Laisser du temps à la formation / spike
- Utiliser diverses pratiques telles que :
 - Limit WIP
 - TDD
 - Pair programming
 - Code review



Quiz Scrum.org

- **What's the main responsibility of a tester in Scrum?**
 - a. Verifying the work of programmers
 - b. Tracking quality metrics
 - c. Finding bugs
 - d. There are no testers in Scrum

- **Quelle est la principale responsabilité d'un testeur dans Scrum ?**
 - a. Vérification du travail des programmeurs
 - b. Suivi des indicateurs de qualité
 - c. Trouver des bugs
 - d. Il n'y a pas de testeurs dans Scrum

Quiz Scrum.org

- **What's the main responsibility of a tester in Scrum?**
 - a. Verifying the work of programmers
 - b. Tracking quality metrics
 - c. Finding bugs
 - **d. There are no testers in Scrum**

Il n'y a pas de personnes "titrées" en tant que testeurs, car nous n'avons pas de rôles et de titres supplémentaires dans Scrum. Cependant, il peut y avoir des "développeurs" experts en tests. N'oubliez pas que tout le monde dans l'équipe de développement est appelé "développeur".

Lorsque vous voyez une déclaration comme celle-ci dans votre véritable examen, cela signifie généralement "testeur" comme rôle ou titre, plutôt qu'une personne experte en test.

Quiz Scrum.org

- **What does a burn-down chart measure?**
 - a. Cost of the project across time
 - b. The amount of business value delivered to the customer
 - c. Work that is done based on the Definition of Done
 - d. Work remaining across time

Que mesure un burn-down chart ?

- a. Coût du projet dans le temps
- b. Le montant de la valeur commerciale livrée au client
- c. Travail effectué sur la base de la définition de terminé
- d. Travail restant dans le temps

Quiz Scrum.org

- **What does a burn-down chart measure?**
 - a. Cost of the project across time
 - b. The amount of business value delivered to the customer
 - c. Work that is done based on the Definition of Done
 - **d. Work remaining across time** (Travail restant dans le temps)

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is NOT mandatory in Scrum?**
 - a. Sprint Planning
 - b. Burn-down charts
 - c. Product Owner
 - d. Definition of Done

- **Lequel des éléments suivants n'est PAS obligatoire dans Scrum ?**
 - a. Planification des sprints
 - b. Burn-down charts
 - c. Product Owner
 - d. Définition de terminé (Definition of Done)

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is NOT mandatory in Scrum?**

- a. Sprint Planning
- **b. Burn-down charts**
- c. Product Owner
- d. Definition of Done

b. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme de mesure, de suivi et de visualisation des progrès. Seuls les rôles, événements et artefacts (+ Definition of Done et mesure de progression) sont obligatoires.

Quiz Scrum.org

- When does a Development Team member become the sole owner of a Sprint Backlog item?
 - a. During the Daily Scrum.
 - b. At the Sprint planning meeting.
 - c. Whenever a team member can accommodate more work.
 - d. Never. All Sprint Backlog Items are "owned" by the entire Development Team, even though each one may be implemented by an individual development team member.

Quand un membre des développeurs devient-il l'unique propriétaire d'un élément du Sprint Backlog ?

- a. Pendant le daily scrum.
- b. Lors de la réunion de planification du sprint.
- c. Chaque fois qu'un membre de l'équipe peut accepter plus de travail.
- d. Jamais. Tous les éléments du backlog de sprint sont "détenus" par l'ensemble des développeurs, même si chacun peut être implémenté par un membre individuel des développeurs.

Quiz Scrum.org

- When does a Development Team member become the sole owner of a Sprint Backlog item?
 - **A)** During the Daily Scrum.
 - **B)** At the Sprint planning meeting.
 - **C)** Whenever a team member can accommodate more work.
 - **D) Never. All Sprint Backlog Items are "owned" by the entire Development Team, even though each one may be implemented by an individual development team member.**

Le Sprint Backlog et tous ses éléments sont la propriété collective de l'équipe de développement. Aucun membre de l'équipe ne peut revendiquer la propriété d'un élément, car cela bloquerait la communication et la collaboration.

Quiz Scrum.org

- **Which statement explains a benefit of having tests in the Definition of Done?**

- a. Increments would be closer to potentially releasable.
- b. It makes it easier for the Scrum Master to measure performance and report progress.
- c. Increments would be more complete.

Quelle affirmation explique un avantage d'avoir des tests dans la définition de terminé ?

- a. Les incréments seraient plus proches de potentiellement livrables
- b. Cela permet au Scrum Master de mesurer plus facilement les performances et de rendre compte des progrès.
- c. Les incréments seraient plus complets.

Quiz Scrum.org

- **Which statement explains a benefit of having tests in the Definition of Done?**
 - **a. Increments would be closer to potentially releasable.**
 - b. It makes it easier for the Scrum Master to measure performance and report progress.
 - c. Increments would be more complete.

- a. Vous ne pouvez pas le publier à moins d'avoir testé la sortie et d'être sûr qu'il ne créera pas de problèmes en production.
- b. La mesure des performances et les rapports d'avancement ne sont pas effectués par le Scrum Master.
- c. Eh bien, techniquement parlant, cette affirmation n'est pas fausse, mais ce n'est pas la meilleure façon de décrire les avantages d'avoir des tests, et vous avez déjà un meilleur choix à sélectionner.

Quiz Scrum.org

- **The Scrum Team should choose at least one high priority process improvement, identified during the Sprint Retrospective, and place it in the Product Backlog.**
 - a. True
 - b. False
- **L'équipe Scrum devrait choisir au moins une amélioration de processus hautement prioritaire, identifiée lors de la rétrospective de sprint, et la placer dans le Product Backlog.**
 - a. Vrai
 - b. Faux
-

Quiz Scrum.org

- **The Scrum Team should choose at least one high priority process improvement, identified during the Sprint Retrospective, and place it in the Product Backlog.**
 - a. True
 - **b. False**
- Pour assurer une amélioration continue, le Sprint Backlog plutôt que le Product Backlog inclut au moins une amélioration de processus hautement prioritaire identifiée lors de la précédente réunion de rétrospective de Sprint.
- **Dans la version 2020 : on n'ajoute plus d'amélioration de processus dans le sprint backlog**
-

Quiz Scrum.org

- Which two statements are correct about Product Backlog Refinement?
 - a. It should be timeboxed for 8 hours or less.
 - b. It should be done right before Sprint Planning.
 - c. Multiple teams may participate in it.
 - d. Normally, it doesn't take more than 10% of the Product Owner's time.
 - e. Normally, it doesn't take more than 10% of the developers' time.
 - f. Normally, it shouldn't take more than 10% of the Scrum Team's time.
- **Quelles sont les deux affirmations correctes concernant l'affinement du backlog produit ?**
 - a. Il doit être limité à 8 heures ou moins.
 - b. Cela devrait être fait juste avant la planification du sprint.
 - c. Plusieurs équipes peuvent y participer.
 - d. Normalement, cela ne prend pas plus de 10% du temps du Product Owner.
 - e. Normalement, cela ne prend pas plus de 10% du temps des développeurs.
 - f. Normalement, cela ne devrait pas prendre plus de 10 % du temps de l'équipe Scrum.

Quiz Scrum.org

- Which two statements are correct about Product Backlog Refinement?
 - a. It should be timeboxed for 8 hours or less.
 - b. It should be done right before Sprint Planning.
 - **c. Multiple teams may participate in it.**
 - d. Normally, it doesn't take more than 10% of the Product Owner's time.
 - **e. Normally, it doesn't take more than 10% of the developers' time.**
 - f. Normally, it shouldn't take more than 10% of the Scrum Team's time.

d. Cela représente 10 % du temps de l'équipe de développement ; Les Product Owners y consacrent généralement plus de temps. F. C'est 10% du temps de l'équipe de développement, pas de toute l'équipe Scrum.

Quiz Scrum.org

- **There can be multiple Definitions of Done when multiple teams are working on the same product.**
 - a. TRUE
 - b. FALSE
- **Il peut y avoir plusieurs définitions de terminé lorsque plusieurs équipes travaillent sur le même produit.**
 - a. vrai
 - b. faux

Quiz Scrum.org

- **There can be multiple Definitions of Done when multiple teams are working on the same product.**
- a. TRUE
- **b. FALSE**

Il n'y a qu'une seule definition of done, mais des variants possibles.

Selon Scrum.org, ils peuvent avoir différentes définitions de terminé, tant qu'ils sont compatibles les uns avec les autres et capables de créer des incréments intégrés.

Remarque : il peut sembler que le guide Scrum indique qu'il n'y a qu'une seule définition de terminé pour plusieurs équipes, mais ce n'est pas le cas selon Scrum.org. Avoir cette flexibilité peut aider, car, par exemple, une équipe peut souhaiter avoir des tests supplémentaires. Il n'y a pas de mal à cela, et pourtant, cela a un impact sur leur définition du fait.

Quiz Scrum.org

- **How many people are there in Scrum Team ?**
 - a. 5 ± 3
 - b. 5 to 12
 - c. 3 to 12
 - d. 10
 - e. 3 to 11
 - f. 6 ± 3

- **Combien y a-t-il de personnes au maximum dans l'équipe Scrum ?**
 - a. 5 ± 3
 - b. 5 à 12
 - c. 3 à 12
 - d. 10
 - e. 3 à 11
 - f. 6 ± 3

Quiz Scrum.org

- **How many people are there in a scrum team ?**
 - a. 5 ± 3
 - b. 5 to 12
 - c. 3 to 12
 - **d. 10**
 - e. 3 to 11
 - f. 6 ± 3

DANS LA VERSION 2020, ON NOUS INDIQUE 10 PERSONNES MAXIMUM DANS LA SCRUM TEAM

Quiz Scrum.org

- **What type of test should be done during the Sprint?**
 - a. All tests, except for user acceptance tests
 - b. All tests, except for integration tests
 - c. Every type of test
 - d. Unit tests

- **Quel type de test faut-il faire pendant le Sprint ?**
 - a. Tous les tests, à l'exception des tests d'acceptation par les utilisateurs
 - b. Tous les tests, sauf les tests d'intégration
 - c. Tous les tests
 - d. Tests unitaires

Quiz Scrum.org

- **What type of test should be done during the Sprint?**
 - a. All tests, except for user acceptance tests
 - b. All tests, except for integration tests
 - **c. Every type of test**
 - d. Unit tests
- N'oubliez pas que l'incrément doit être "Terminé" et potentiellement livrable. Cela signifie que tous les tests doivent être effectués.

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are required by Scrum?**
 - a. Definition of Done
 - b. User Stories
 - c. Definition of Ready
 - d. Pair-Programming
 - e. Sprint Retrospectives
 - f. Sprint Goal

Parmi les éléments suivants, lesquels sont requis par Scrum ?

- a. Définition of done
- b. User Stories
- c. Definition of ready
- d. Programmation en binôme
- e. Rétrospectives de sprint
- f. Sprint goal

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are required by Scrum?**

- a. Definition of Done
- b. User Stories
- c. Definition of Ready
- d. Pair-Programming
- e. Sprint Retrospectives
- f. Sprint Goal

c. Il n'y a pas de définition de Ready dans Scrum

Quiz Scrum.org

- **How many hours per day should a Development Team member work?**
 - a. Between 6 and 16 hours, depending on the situation
 - b. At a constant pace
 - c. Normally, 40 hours a week
 - d. As much as needed for realizing the Sprint Backlog items by the end of the Sprint

- **Combien d'heures par jour un membre des developpeurs doit-il travailler ?**
 - a. Entre 6 et 16 heures, selon la situation
 - b. A un rythme constant
 - c. Normalement, 40 heures par semaine
 - d. Autant que nécessaire pour réaliser les items du Sprint Backlog d'ici la fin du Sprint

Quiz Scrum.org

- **How many hours per day should a Development Team member work?**
 - a. Between 6 and 16 hours, depending on the situation
 - **b. At a constant pace**
 - c. Normally, 40 hours a week
 - d. As much as needed for realizing the Sprint Backlog items by the end of the Sprint
- b. C'est l'un des 12 principes Agiles.
- d. Le Sprint Backlog n'est qu'une estimation approximative de ce que nous pouvons faire. Nous aurons un rythme constant et livrerons autant que possible, dans la qualité définie, et rien de grave ne se produira si tous les articles ne sont pas livrés.

Quiz Scrum.org

- **Who owns the Sprint Backlog?**
 - a. The whole Scrum Team
 - b. The Scrum Master
 - c. The Product Owner
 - d. The Development Team

- **À qui appartient le Sprint Backlog ?**
 - a. Toute l'équipe Scrum
 - b. Le Scrum master
 - c. Le Product Owner
 - d. Les developpeurs

Quiz Scrum.org

- **Who owns the Sprint Backlog?**
- a. The whole Scrum Team
- b. The Scrum Master
- c. The Product Owner
- **d. The Development Team**

Si vous « possédez » quelque chose (dans ce contexte), cela signifie que vous en êtes responsable et que vous êtes la personne qui y apporte des modifications.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following may be done when the team becomes mature enough during the project?**
 - a. They won't need timeboxed events anymore.
 - b. They may not need Sprint Retrospectives anymore.
 - c. They may improve their Definition of Done.
 - d. They will need longer Sprint Retrospectives.
 - e. Their velocity may increase.

- **Parmi les actions suivantes, lesquelles peuvent être effectuées lorsque l'équipe devient suffisamment mature au cours du projet ?**
 - a. Ils n'auront plus besoin d'événements limités dans le temps.
 - b. Ils n'auront peut-être plus besoin des rétrospectives Sprint.
 - c. Ils peuvent améliorer leur Définition du Terminé.
 - d. Ils auront besoin de rétrospectives de sprint plus longues.
 - e. Leur vélocité peut augmenter.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following may be done when the team becomes mature enough during the project?**
 - a. They won't need timeboxed events anymore.
 - b. They may not need Sprint Retrospectives anymore.
 - **c. They may improve their Definition of Done.**
 - d. They will need longer Sprint Retrospectives.
 - **e. Their velocity may increase.**

- b. Il y a toujours place à l'amélioration.
- c. La définition de terminé ne devrait pas changer au milieu du sprint. En dehors de cela, vous pouvez parfois l'améliorer en fonction de ce que vous avez appris dans le projet, pour augmenter la qualité de votre travail.
- e. car ils deviennent plus à l'aise pour communiquer avec le client.

Quiz Scrum.org

- **It's up to the self-organizing team to decide which Scrum artifacts are needed in the project.**
 - a. FALSE
 - b. TRUE

C'est à l'équipe auto-organisée de décider quels artefacts Scrum sont nécessaires dans le projet.

- a. faux
- b. vrai

Quiz Scrum.org

- **It's up to the self-organizing team to decide which Scrum artifacts are needed in the project.**
 - a. FALSE
 - b. TRUE

L'auto-organisation n'est pas illimitée, vous devez suivre le cadre Scrum.

Quiz Scrum.org

- **The Development Team should have a Team Leader to improve communications and collaboration.**
 - a. TRUE
 - b. FALSE

- **Les développeurs devraient avoir un chef d'équipe pour améliorer les communications et la collaboration.**
 - a. vrai
 - b. faux

Quiz Scrum.org

- **The Development Team should have a Team Leader to improve communications and collaboration.**
- a. TRUE
- **b. FALSE**

Il n'est pas permis d'introduire de nouveaux rôles ou titres tels que "chef d'équipe" dans Scrum.

Quiz Scrum.org

- **Who makes sure that enough items are selected for the Sprint Backlog?**
 - a. The customer
 - b. Developpers
 - c. Stakeholders
 - d. The Scrum Master
 - e. The Solution Architect
 - f. The whole Scrum Team
- **Qui s'assure que suffisamment d'éléments sont sélectionnés pour le Sprint Backlog ?**
 - a. Le client
 - b. Les développeurs
 - c. Parties prenantes
 - d. Le Scrum master
 - e. L'architecte de solutions
 - f. Toute l'équipe Scrum

Quiz Scrum.org

- **Who makes sure that enough items are selected for the Sprint Backlog?**

- a. The customer
- **b. Developpers**
- c. Stakeholders
- d. The Scrum Master
- e. The Solution Architect
- f. The whole Scrum Team

e. Il n'y a pas de rôle/titre d'architecte de solution distinct dans Scrum. Les développeurs sont auto-organisés.

Quiz Scrum.org

- **The Definition of Done is composed by the Product Owner, to ensure that the Increments will be usable by the end-users.**
 - a. TRUE
 - b. FALSE

La Definition of Done est composée par le Product Owner, pour s'assurer que les Incréments seront utilisables par les utilisateurs finaux.

- a. vrai
- b. faux

Quiz Scrum.org

- **The Definition of Done is composed by the Product Owner, to ensure that the Increments will be usable by the end-users.**
 - a. TRUE
 - **b. FALSE**

The Definition of Done may come from the organization. Inside the project, it's the developers who adjust or define it.

La définition de terminé peut provenir de l'organisation. A l'intérieur du projet, ce sont les développeurs qui l'ajustent ou le définissent.

Quiz Scrum.org

- **Which two statements explain when a Product Backlog item is considered complete?**
 - a. When it can be part of a potentially releasable Increment
 - b. When user acceptance tests are passed
 - c. The item is ready for user acceptance testing
 - d. When no work is left based on the Definition of Done

Quels sont les deux énoncés qui expliquent quand un élément du Product Backlog est considéré comme complet ?

- a. Lorsqu'il peut faire partie d'un incrément potentiellement livrable
- b. Lorsque les tests d'acceptation des utilisateurs sont réussis
- c. L'item est prêt pour les tests d'acceptation par l'utilisateur
- d. Lorsqu'il ne reste plus de travail sur la base de la définition de terminé

Quiz Scrum.org

- **Which two statements explain when a Product Backlog item is considered complete?**

- a. When it can be part of a potentially releasable Increment
- b. When user acceptance tests are passed
- c. The item is ready for user acceptance testing
- d. When no work is left based on the Definition of Done

b. Ils peuvent encore manquer quelque chose. En revanche, si le test est centré sur l'unité, qu'en est-il du test de la solution intégrée ? Cela peut casser quelque chose.

c. Nous ne pouvons pas le considérer comme terminé lorsque les tests d'acceptation par les utilisateurs ne sont pas effectués.

Un élément du Product Backlog que vous avez dans le Sprint Backlog est Terminé, lorsqu'il satisfait à la Définition de Terminé. Remarque : utilisable pour les utilisateurs finaux = potentiellement livrable = potentiellement livrable = Terminé selon la définition de Terminé

Quiz Scrum.org

- **Who measures the performance of the Sprints?**

- a. The Development Team
- b. The whole Scrum Team
- c. The Project Manager
- d. The Team Leader
- e. The customer
- f. The Solution Architect

Qui mesure la performance des Sprints ?

- a. Les développeurs
- b. Toute l'équipe Scrum
- c. Le chef de projet
- d. Le chef d'équipe
- e. Le client
- f. L'architecte de solutions

Quiz Scrum.org

- **Who measures the performance of the Sprints?**

- **a. Developpers**
- b. The whole Scrum Team
- c. The Project Manager
- d. The Team Leader
- e. The customer
- f. The Solution Architect

c. Il n'y a pas de chef de projet dans Scrum.

d. Il n'y a pas de chef d'équipe dans Scrum.

f. Il n'y a pas de rôle/titre d'architecte de solution distinct dans Scrum.

Quiz Scrum.org

- **What is a proper role of a PMO in a company that uses Scrum?**
- a. The PMO should manage and help Product Owners.
- b. There's no place for a PMO in such an organization.
- c. Manages portfolios and programs and facilitates the application of techniques that complement Scrum.

Quel est le rôle approprié d'un PMO (missions de structuration et d'assistance au pilotage de projets) dans une entreprise qui utilise Scrum ?

- a. Le PMO doit gérer et aider les Product Owners.
- b. Il n'y a pas de place pour un PMO dans une telle organisation.
- c. Gère les portefeuilles et les programmes et facilite l'application de techniques qui complètent Scrum.

Quiz Scrum.org

- **What is a proper role of a PMO in a company that uses Scrum?**
- a. The PMO should manage and help Product Owners.
- b. There's no place for a PMO in such an organization.
- **c. Manages portfolios and programs and facilitates the application of techniques that complement Scrum.**

N'oubliez pas qu'il y a des limites à l'auto-organisation de l'équipe, et l'important est d'avoir le pouvoir dans les limites du projet.

Cependant, chaque projet est exécuté dans une organisation plus large avec plusieurs niveaux de gestion ayant un impact sur le projet, et il n'est pas possible ni même acceptable de rejeter cette structure, tant qu'elle ne bloque pas l'auto-organisation interne de l'équipe et l'adaptation fondamentale.

Quiz Scrum.org

- **The customer goes to the Development Team in the middle of a Sprint and asks them to add an important item to the Sprint Backlog. What should they do?**
 - a. Replace one of the existing items in the Sprint Backlog with the new one.
 - b. Add the item to the current Sprint Backlog.
 - c. Refer the customer to the Product Owner.
 - d. Reject the request.
- **Le client se rend dans l'équipe de développement au milieu d'un sprint et lui demande d'ajouter un élément important au backlog de sprint. Que devraient-ils faire?**
 - a. Remplacez l'un des éléments existants dans le Sprint Backlog par le nouveau.
 - b. Ajoutez l'élément au Sprint Backlog actuel.
 - c. Référer le client au Product Owner.
 - d. Rejetez la demande.

Quiz Scrum.org

- **The customer goes to the Development Team in the middle of a Sprint and asks them to add an important item to the Sprint Backlog. What should they do?**
 - a. Replace one of the existing items in the Sprint Backlog with the new one.
 - b. Add the item to the current Sprint Backlog.
 - **c. Refer the customer to the Product Owner.**
 - d. Reject the request.

Le Product Owner est la personne responsable des articles et de l'ordre dans lequel ils sont développés.

Quiz Scrum.org

- **Which three statements are correct when four teams are working on a product?**
 - a. There can be multiple Product Owners.
 - b. There can be multiple Scrum Masters.
 - c. There is only one Product Backlog.
 - d. There can be multiple Product Backlogs.
 - e. There is only one Product Owner.
 - f. There is only one Sprint Backlog each Sprint.

- **Quelles sont les trois affirmations correctes lorsque quatre équipes travaillent sur un produit ?**
 - a. Il peut y avoir plusieurs Product Owners.
 - b. Il peut y avoir plusieurs Scrum Masters.
 - c. Il n'y a qu'un seul Product Backlog.
 - d. Il peut y avoir plusieurs Product Backlog.
 - e. Il n'y a qu'un seul Product Owner.
 - f. Il n'y a qu'un seul Backlog de Sprint par Sprint.

Quiz Scrum.org

- **Which three statements are correct when four teams are working on a product?**
 - a. There can be multiple Product Owners.
 - **b. There can be multiple Scrum Masters.**
 - **c. There is only one Product Backlog.**
 - d. There can be multiple Product Backlogs.
 - **e. There is only one Product Owner.**
 - f. There is only one Sprint Backlog each Sprint.


Lorsqu'il y a n équipes dans un projet, il y a : 1 Product Backlog n Sprint Backlogs à chaque Sprint une ou plusieurs Definitions of Done, tant qu'elles sont compatibles entre elles
1 Increment intégré à chaque Sprint
1 Product Owner n rôles de Scrum Master qui peuvent être occupé par 1 ou plusieurs Scrum Masters

Note 1 : un projet correspond à un produit.

Note 2 : La façon dont le guide Scrum l'explique, il semble qu'il devrait y avoir une définition de terminé pour Scrum à l'échelle, mais Scrum.org pense qu'il peut y avoir plusieurs définitions, tant qu'elles sont compatibles les unes avec les autres et capables de créer des Incréments, et c'est ce que vous devez répondre dans votre examen.

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**

Chap. 4 : LES ÉVÉNEMENTS

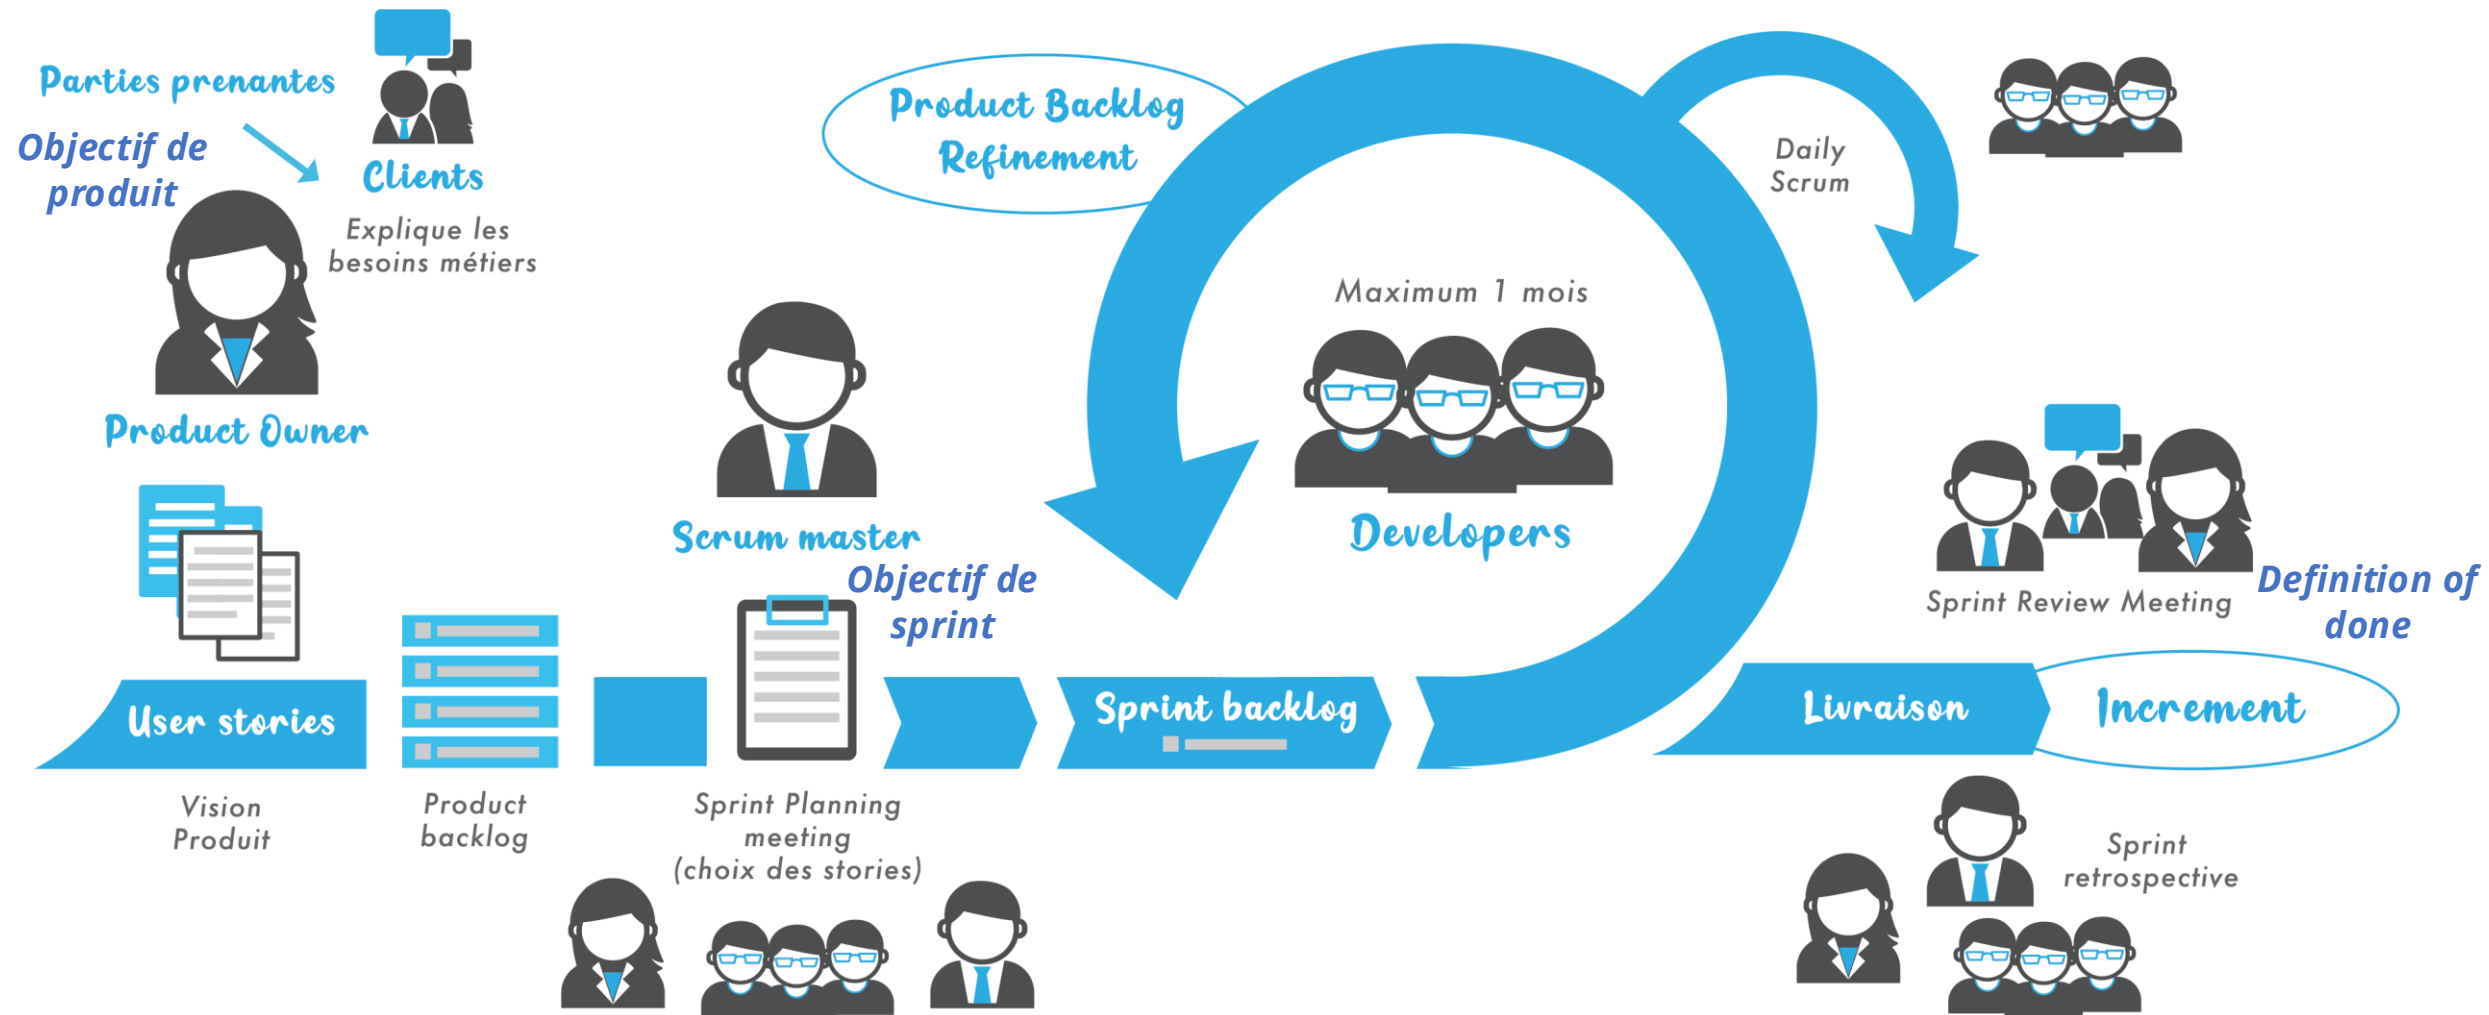


Le sprint

- Un Découpage « temporisé » du projet.
- Se base sur le Sprint Backlog.
- Durée maximale d'un mois calendaire.
- Et si l'équipe est en retard ou en avance ?

Le Sprint Zéro / Interdit en Scrum

- Le Sprint 0 n'a pas de durée définie. Son objectif est de permettre de construire les bonnes bases d'un nouveau projet et de former une équipe SCRUM ajustée pour sa réussite.
- Même en cas de projet complexe, il faut commencer à réaliser le travail
 - Limiter les risques
 - Augmenter la prévisibilité
 - Améliorer la qualité
 - Fournir de la valeur

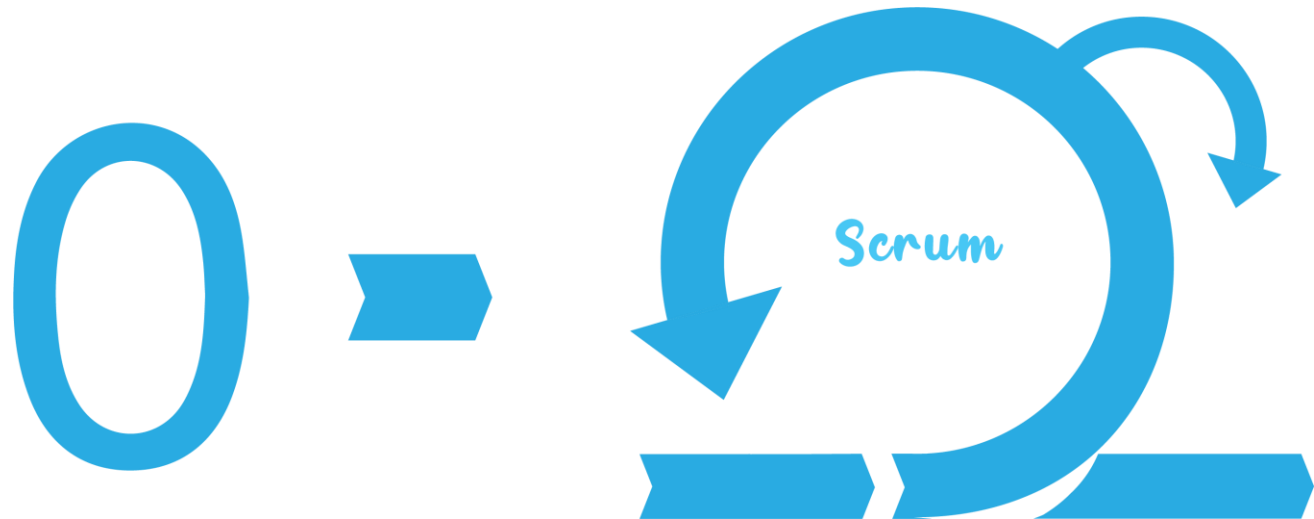

La sprint planning

- L'objectif est de définir :
 - Le Sprint Goal : la vision macroscopique, pour le sprint.
 - Le Sprint Backlog : la vision microscopique , au jour le jour.
- Qu'est-ce qu'on fait et comment le fait-on ?
- 8 Heures pour un Sprint de 4 semaines.
- Entités présentes :
 - Scrum Master
 - Product Owner
 - Développeurs

La sprint review

- Phase d'inspection de l'itération.
- 4 heures pour un Sprint de 4 semaines
- 5 Objectifs :
 - Montrer en quoi le sprint est terminé et répond aux exigences posées lors de la planification.
 - Faire le constat de ce qui s'est bien ou mal passé durant le sprint et réfléchir aux potentiels solutions.
 - Faire le point sur le Backlog product, du planning de la réalisation et du budget.
 - Prendre en compte les contraintes externes telles que l'évolution du marché, les objectifs des parties prenantes etc...
 - Anticiper les priorités du prochain Sprint.

Participants :

- Scrum Master
- Product Owner
- Développeurs
- Parties prenantes

La sprint retrospective

- 3 heures pour un sprint de 4 semaines
- La rétro se focalise sur l'équipe sur plusieurs niveaux possibles :
 - Relationnel et humain
 - Processus de réalisation du produit
- Ce qui s'est bien passé / mal passé ?
- Comment peut-on faire mieux ?

Objectifs:

- Tirer les enseignements de l'itération
- Analyser le plan d'actions précédent
- Déterminer ensemble un plan d'actions «réaliste» pour la prochaine itération.

Acteurs présents : l'ensemble de l'équipe Scrum.

Différents types d'animation : speed boat, 8 gaspillages lean, mood board, les 5 pourquoi

La sprint retrospective

EXEMPLE DE QUESTIONS À SE POSER

- Comment décrire la dynamique globale de l'équipe ?
- Qu'avons-nous appris lors de ce sprint qui pourrait vous rendre plus efficace au prochain ?
- Que peut-on faire pour nous soutenir davantage les uns les autres ?
- Quels sont les outils ou pratiques qui ont été efficaces ?
- La manière dont nous animons cette retrospective est-elle motivante ?
- Avez-vous été en « détresse » pendant ce sprint ?
- Quels sont les outils ou pratiques qui ont été inutiles ou contre productif ?
- Y a-t-il eu des erreurs ou des dysfonctionnements pendant le sprint ?
- Donner des citations pour illustrer le sprint


-
- LES FORCES**
- Intelligence des partenaires
 - Esprit d'équipe
 - Agilité
- ÉQUIPE**
- OBSTACLES**
- Contraintes
 - Stages critiques
 - Manque de ressources
 - Hébergement
 - Pas d'expériences à l'étranger
- RALENTI**
- Manque de visibilité
 - Projet de communication
 - Les clients
 - Accueil
- SUCCÈS**
- 90% de clients satisfaits
 - Lancer le projet à la rentrée
 - Site au top 1

La daily meeting

- Objectif : inspecter la progression vers l'objectif de sprint et adapter le sprint backlog au besoin
- 15 minutes maximum / mise à jour du tableau /
- 2 min par personne ? (non !)
- Doit se dérouler à la même heure et dans le même lieu pour faciliter l'organisation de l'événement.
- Uniquement pour les Dev = participer
- Le Scrum Master peut faciliter
- Le SM & le PO peuvent y assister

La daily meeting

- EXEMPLE DE QUESTIONS À SE POSER (proposé par Jean-Christophe Pagès) :
- Quels progrès a-t-on fait pour nous permettre d'atteindre notre objectif de sprint ?
- Sommes-nous confiants pour atteindre notre objectif ?
- Qu'a-t-on appris qui pourrait être utile à l'équipe ?
- Qu'est ce qui ralenti notre progression vers l'objectif ?
- Un item essentiel est-il bloqué ?
- Qui aurait besoin d'aide en ce moment ?
- Quel item est le plus à risque de dépasser notre Work Item Age ?
- Si nous avons du retard : comment pouvons-nous simplifier l'incrément tout en restant focus sur l'objectif de sprint ?
- Comment pouvons-nous travailler davantage en équipe ?
- Comment avançons nous sur les actions de la dernière retrospective ?

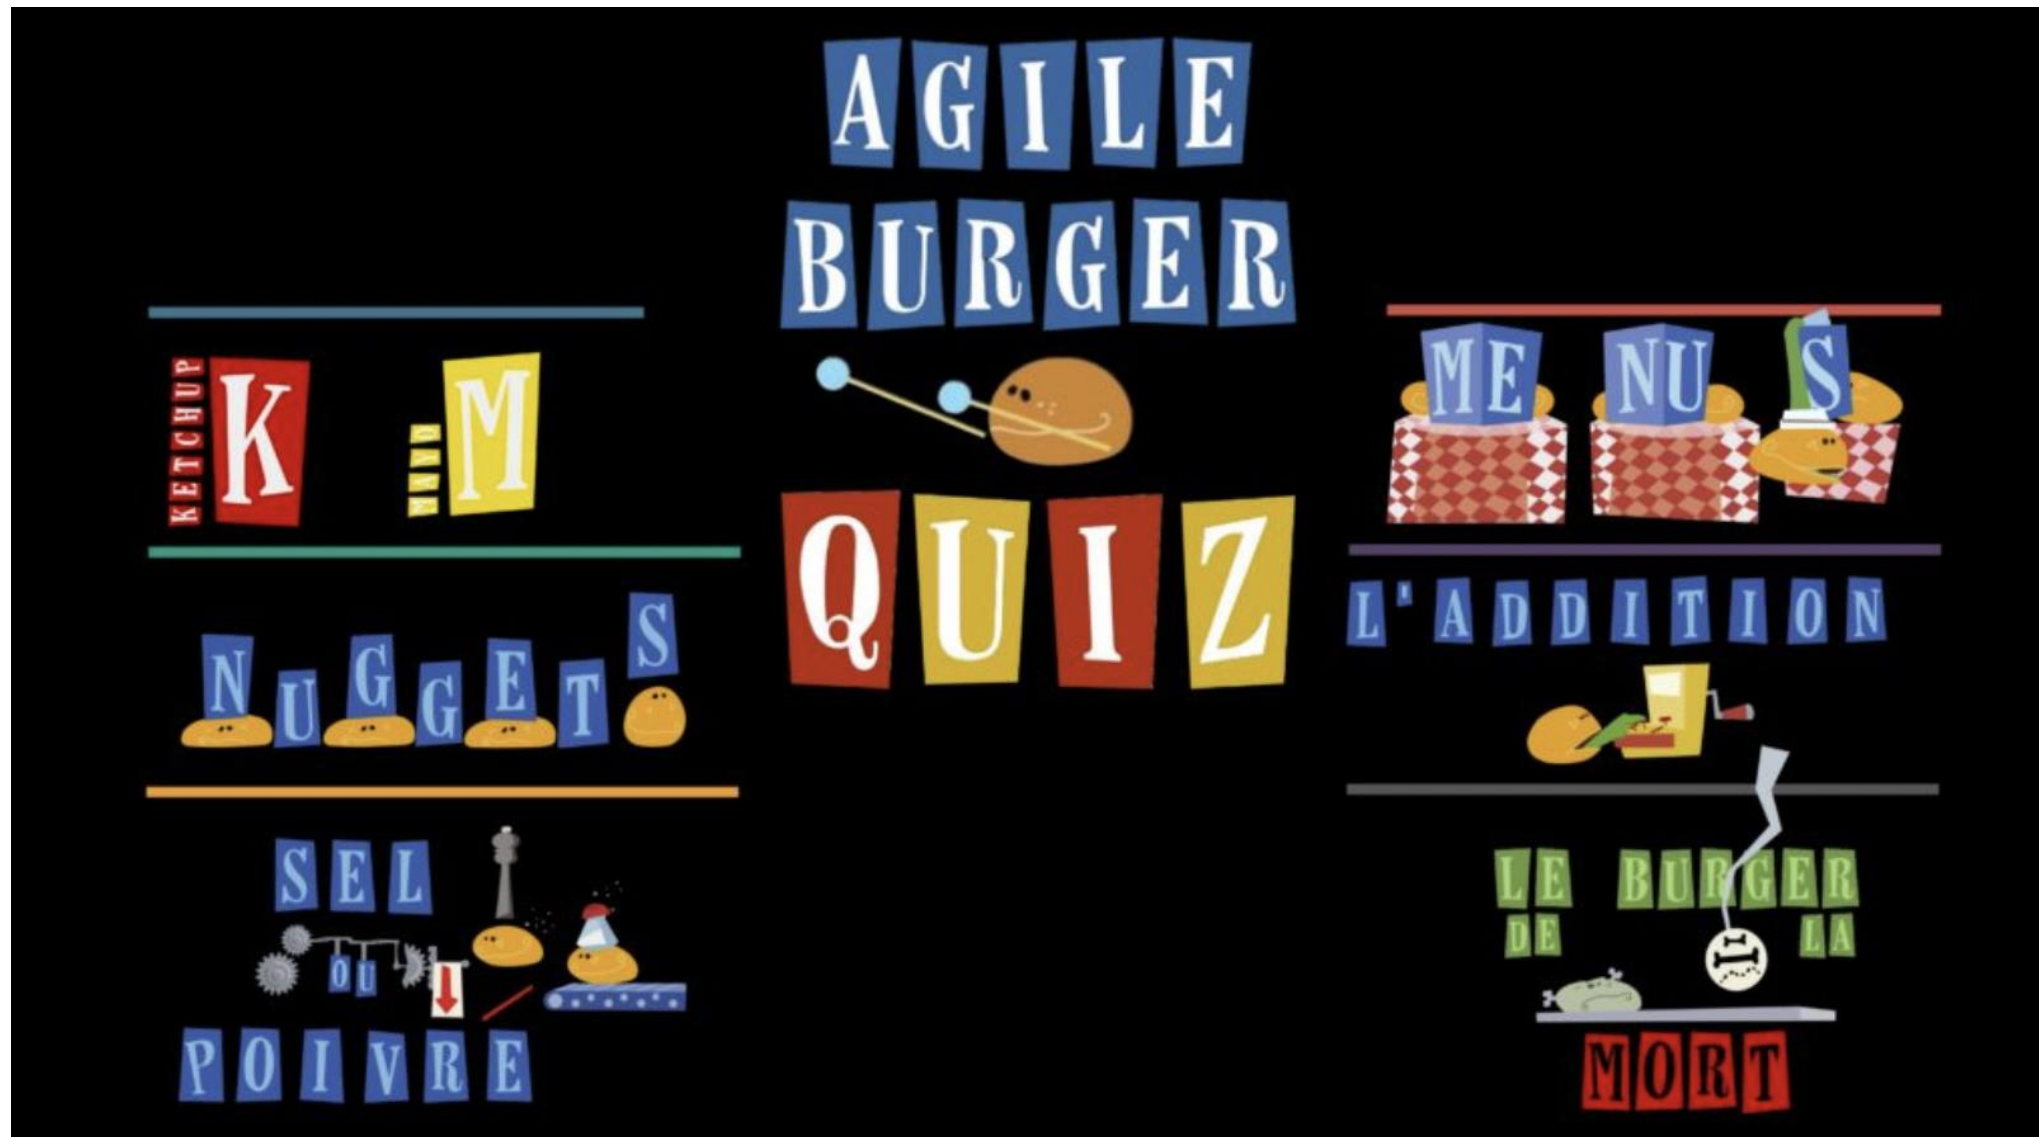

Quiz Scrum.org

- **Who can attend the Daily Scrum meeting?**
- a. The Development Team and the Scrum Master
- b. Anyone
- c. The Development Team and the Product Owner
- d. The whole Scrum Team

Qui peut assister à la réunion Daily Scrum ?

- a. L'équipe de développement et le Scrum Master
- b. Tout le monde
- c. L'équipe de développement et le Product Owner
- d. Toute l'équipe Scrum

Quiz Scrum.org

- **Who can attend the Daily Scrum meeting?**
- a. The Development Team and the Scrum Master
- **b. Anyone**
- c. The Development Team and the Product Owner
- d. The whole Scrum Team

Daily Scrum est pour les développeurs ; eux seuls "participent" (=parlent). D'autres peuvent "assister" (=regarder).

Quiz Scrum.org

- **What happens if we forecast that some of the work defined in the Sprint Backlog won't be done by the end of the Sprint?**
- a. Work overtime and try to complete all items.
- b. Review the work with the Product Owner to see if any adjustments are required, and keep working.
- c. Continue to the next Sprint without a Sprint Review meeting and finish those items in the next Sprint.
- d. The remaining items will be moved to the next Sprint Backlog.

Que se passe-t-il si nous prévoyons qu'une partie du travail défini dans le Sprint Backlog ne sera pas effectué d'ici la fin du Sprint ?

- a. Faites des heures supplémentaires et essayez de terminer tous les éléments.
- b. Passez en revue le travail avec le Product Owner pour voir si des ajustements sont nécessaires, et continuez à travailler.
- c. Passez au Sprint suivant sans réunion de Revue de Sprint et terminez ces éléments lors du Sprint suivant.
- d. Les éléments restants seront déplacés vers le prochain Sprint Backlog.

Quiz Scrum.org

- **What happens if we forecast that some of the work defined in the Sprint Backlog won't be done by the end of the Sprint?**
- a. Work overtime and try to complete all items.
- **b. Review the work with the Product Owner to see if any adjustments are required, and keep working.**
- c. Continue to the next Sprint without a Sprint Review meeting and finish those items in the next Sprint.
- d. The remaining items will be moved to the next Sprint Backlog.
 - a. Rythme constant !
- b. Lorsque vous voyez que certains éléments ne sont peut-être pas terminés à la fin du Sprint, c'est toujours une bonne idée de vérifier le travail avec le Product Owner ; peut-être avez-vous besoin de changer l'ordre du travail et de vous concentrer sur de nouvelles priorités ; peut-être pouvez-vous apporter des ajustements aux détails des éléments existants et en fournir davantage en les simplifiant, etc.
- c. Les éléments inachevés retournent au Product Backlog, et 2) nous ne supprimons pas la revue de sprint et les autres événements.
- d. Les articles inachevés retournent dans le Product Backlog et seront à nouveau commandés ; pas directement au prochain Sprint Backlog.

Certaines personnes pensent qu'une équipe qui réussit est celle qui peut terminer tout le travail du Sprint Backlog, mais ce n'est pas vrai. Au contraire, cela signifie probablement qu'ils sont trop conservateurs dans le nombre d'éléments qu'ils sélectionnent pour le Sprint, ce qui peut réduire leur productivité en raison de la loi de Parkinson et du syndrome de Student. Rien de mal ne se passe si certains éléments ne sont pas terminés à la fin du Sprint, et personne ne devrait blâmer l'équipe ; le Sprint Backlog n'est qu'une estimation approximative de ce qu'ils peuvent faire.

Quiz Scrum.org

- **Which of the following best describes the Sprint Review meeting?**
 - a. It's a controlling mechanism for evaluating the work of developers.
 - b. An inspection of the Increment to collect feedback and see what to do in the next Sprint
 - c. A demo at the end of the Sprint for everyone in the organization to see the Increment.
 - d. A formal meeting to receive approval of the customer for the Increment

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la réunion de revue de sprint ?

- a. C'est un mécanisme de contrôle pour évaluer le travail des développeurs.
- b. Une inspection de l'incrément pour recueillir les commentaires et voir ce qu'il faut faire dans le prochain sprint
- c. Une démo à la fin du Sprint pour que tous les membres de l'organisation voient l'incrément.
- d. Une réunion formelle pour recevoir l'approbation du client pour l'incrément

Quiz Scrum.org

- **Which of the following best describes the Sprint Review meeting?**

- a. It's a controlling mechanism for evaluating the work of developers.
- **b. An inspection of the Increment to collect feedback and see what to do in the next Sprint**
- c. A demo at the end of the Sprint for everyone in the organization to see the Increment.
- d. A formal meeting to receive approval of the customer for the Increment

a. Il ne s'agit pas de contrôler; il s'agit de revoir l'incrément et de recevoir des commentaires.

c. "Démon" n'est pas le meilleur mot à utiliser ici ; « bilan » est plus approprié, car il montre que l'événement est interactif, plutôt qu'une simple démonstration. De plus, c'est principalement pour le client, pas "tout le monde dans l'organisation".

d. Ce n'est pas une réunion formelle pour recevoir l'approbation; il s'agit de recevoir des commentaires. Remarque : il peut être considéré comme une « occasion formelle » d'inspection et d'adaptation, en plus d'être une « réunion informelle ».

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following best describe Sprint Planning?**
 - a. What went wrong in the last Sprint and what to do about it
 - b. Who will be in the team this Sprint?
 - c. Who will do what we have decided to do in the Sprint?
 - d. How are we going to do what we have decided to do in the Sprint?
 - e. What are we going to do during the Sprint?

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent le mieux la planification de sprint ?

- a. Qu'est-ce qui s'est mal passé lors du dernier Sprint et que faire à ce sujet
- b. Qui sera dans l'équipe ce Sprint ?
- c. Qui fera ce que nous avons décidé de faire dans le Sprint ?
- d. Comment allons-nous faire ce que nous avons décidé de faire dans le Sprint ?
- e. Qu'allons-nous faire pendant le Sprint ?

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following best describe Sprint Planning?**
 - a. What went wrong in the last Sprint and what to do about it
 - b. Who will be in the team this Sprint?
 - c. Who will do what we have decided to do in the Sprint?
 - d. How are we going to do what we have decided to do in the Sprint?
 - e. What are we going to do during the Sprint?
- a. Cela serait discuté dans la précédente rétrospective Sprint.
- c. La planification de sprint ne consiste pas à attribuer des éléments aux développeurs.

Quiz Scrum.org

- **Which two statements are correct about Daily Scrums?**
 - a. It's facilitated by the Scrum Master.
 - b. It's held at the same time and place every day.
 - c. It's timeboxed for 2 minutes per developer.
 - d. No one other than the Development Team is allowed to be there.
 - e. Only the developers participate in the meeting.
-
- **Quelles sont les deux affirmations correctes concernant les Daily Scrum ?**
 - a. Il est animé par le Scrum Master.
 - b. Il a lieu tous les jours à la même heure et au même endroit.
 - c. Il est limité à 2 minutes par développeur.
 - d. Personne d'autre que l'équipe de développement n'est autorisé à être là.
 - e. Seuls les développeurs participent à la réunion.

Quiz Scrum.org

- **Which two statements are correct about Daily Scrums?**

- a. It's facilitated by the Scrum Master.
 - **b. It's held at the same time and place every day.**
 - c. It's timeboxed for 2 minutes per developer.
 - d. No one other than the Development Team is allowed to be there.
 - **e. Only the developers participate in the meeting.**
-
- a. Pas nécessairement; il peut être facilité par le Scrum Master, comme demandé ou requis, mais pas par défaut.
 - b. Pour réduire les complications liées à l'organisation des réunions.
 - d. Toute personne autre que les principaux participants peut participer à n'importe quelle réunion, tant qu'elle ne participe pas (parle).
 - e. Participer = avoir un rôle actif et s'exprimer dans la réunion. D'autres peuvent "assister" sans parler (participer).

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following may be done in the Sprint Retrospective meeting?**
 - a. Calculate Velocity
 - b. Discuss the way Increments are demonstrated to the customer
 - c. Discuss the Product Backlog items for the next Sprint
 - d. Discuss the timeboxed duration of Sprints
 - e. Discuss the composition of the team
 - f. Discuss the next Sprint goal
- **Parmi les trois actions suivantes, lesquelles peuvent être effectuées lors de la réunion de rétrospective du sprint ?**
 - a. Calculer la vélocité
 - b. Discuter de la manière dont les incréments sont présentés au client
 - c. Discuter des éléments du Product Backlog pour le prochain Sprint
 - d. Discuter de la durée limitée des Sprints
 - e. Discuter de la composition de l'équipe
 - f. Discutez du prochain objectif du Sprint

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following may be done in the Sprint Retrospective meeting?**
 - a. Calculate Velocity
 - **b. Discuss the way Increments are demonstrated to the customer**
 - c. Discuss the Product Backlog items for the next Sprint
 - **d. Discuss the timeboxed duration of Sprints**
 - **e. Discuss the composition of the team**
 - f. Discuss the next Sprint goal
- a. Vous le faites probablement avant les réunions de Sprint Review.
- c. Il s'agit du contenu plutôt que du contexte. Vous pouvez avoir cette discussion à tout moment pendant le Sprint, lors de la réunion de revue de Sprint, etc ; mais pas pendant les rétrospectives Sprint.
- d. Peut-être vous rendez-vous compte qu'une autre durée limitée dans le temps est plus adaptée au projet. N'oubliez pas que la durée limitée dans le temps n'est pas définie pour chaque Sprint séparément ou sur une base ad hoc.
- f. Il s'agit de contenu plutôt que de contexte. Vous pouvez avoir des discussions à ce sujet avant le prochain Sprint, mais rappelez-vous que les objectifs de Sprint sont définis lors des réunions de planification de Sprint. Sprint Retrospective concerne notre façon de travailler. Il s'agit des choses qui affectent le produit, mais nous ne discutons pas directement du produit. En général, il s'agit du contexte, pas du contenu. Par exemple, nous parlons de la façon dont le Product Backlog est affiné, mais nous n'affinerons pas le Product Backlog lors de la réunion Sprint Retrospective.

Quiz Scrum.org

- **What are the three classical questions of Daily Scrums, if you decide to go through them?**
- a. How many hours did I spend on the project yesterday?
- b. What problems did I have yesterday?
- c. What impediments are in my way or in the way of the team?
- d. What work am I going to do today to help the team achieve its goal?
- e. Are we able to deliver all Sprint Backlog items by the end of the Sprint?
- f. What work did I do yesterday to help the team achieve its goal?
- **Quelles sont les trois questions classiques des Daily Scrum, si vous décidez de les parcourir ?**
- a. Combien d'heures ai-je passé sur le projet hier ?
- b. Quels problèmes ai-je eu hier ?
- c. Quels sont les obstacles sur mon chemin ou sur le chemin de l'équipe ?
- d. Quel travail vais-je faire aujourd'hui pour aider l'équipe à atteindre son objectif ?
- e. Sommes-nous en mesure de livrer tous les items du Sprint Backlog d'ici la fin du Sprint ?
- f. Quel travail ai-je fait hier pour aider l'équipe à atteindre son objectif ?

Quiz Scrum.org

- **What are the three classical questions of Daily Scrums, if you decide to go through them?**
- a. How many hours did I spend on the project yesterday?
- b. What problems did I have yesterday?
- c. What impediments are in my way or in the way of the team?
- d. What work am I going to do today to help the team achieve its goal?
- e. Are we able to deliver all Sprint Backlog items by the end of the Sprint?
- f. What work did I do yesterday to help the team achieve its goal?

Il n'est pas obligatoire d'utiliser ces questions, mais elles sont très courantes et recommandées.

Quiz Scrum.org

- **How is budgeting done in Scrum?**
 - a. Ideally revised each Sprint to ensure value is being delivered.
 - b. Usually every day
 - c. Budgeting is done based on the initial Product Backlog.
 - d. Scrum doesn't need a budgeting system.

Comment se fait la budgétisation dans Scrum ?

- a. Idéalement, réviser chaque Sprint pour s'assurer que la valeur est délivrée.
- b. Généralement tous les jours
- c. La budgétisation est faite sur la base du Product Backlog initial.
- d. Scrum n'a pas besoin d'un système de budgétisation.

Quiz Scrum.org

- **How is budgeting done in Scrum?**

- a. Ideally revised each Sprint to ensure value is being delivered.
- b. Usually every day
- c. Budgeting is done based on the initial Product Backlog.
- d. Scrum doesn't need a budgeting system.

b. That's too much!

c. Mais le Product Backlog n'est jamais complet, et le Product Backlog initial ne contient pas beaucoup d'éléments.

d. L'entité de financement (interne ou externe) a besoin d'au moins une idée approximative du coût pour avoir le produit et l'utiliser pour voir si elle aimerait exécuter le projet.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le projet, vous aurez une meilleure compréhension des fonctionnalités qui seront nécessaires et du temps que l'équipe doit passer pour terminer le produit. Cela détermine un budget approximatif qui est nécessaire pour le projet. Cependant, au fur et à mesure que vous avancez, les choses changent et vous devrez peut-être affiner cette estimation en fonction de ce que vous apprendrez des incréments.

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are NOT allowed in Scrum?**
- a. Using Story Points
- b. Release Planning
- c. Sprint Zero
- d. Using User Stories
- e. Integration Sprints
- **Parmi les propositions suivantes, lesquelles ne sont PAS autorisées dans Scrum ?**
- a. Utilisation des Story Points
- b. Release planning
- c. Sprint zéro
- d. Utilisation des User stories
- e. Sprints d'intégration

Quiz Scrum.org

- **Which two of the following are NOT allowed in Scrum?**

- a. Using Story Points
- b. Release Planning
- c. Sprint Zero
- d. Using User Stories
- e. Integration Sprints

a. Pas obligatoire, mais très courant.

b. Non mentionné dans le cadre, mais presque nécessaire.

c. Interdit; la préparation des outils et de l'infrastructure se fait progressivement lors des Sprints normaux. Sinon, cela bloquera l'adaptation et la génération de valeur.

d. Pas obligatoire, mais très courant et recommandé.

e. Non autorisé, car tous les éléments doivent être intégrés avant que nous puissions les considérer comme terminés. Certains concepts sont obligatoires; par exemple, rétrospective Sprint. Certains ne sont pas obligatoires, mais autorisés ; par exemple, en utilisant des histoires d'utilisateurs. Certains ne sont pas autorisés; par exemple, Sprint zéro. Il est important de ne pas mélanger le "non obligatoire, mais autorisé" avec le "non autorisé". Avez-vous remarqué le mot "pas" dans la question ?

Quiz Scrum.org

- **It's generally better to have shorter Sprints when the project is riskier.**
- a. TRUE
- b. FALSE

Il est généralement préférable d'avoir des Sprints plus courts lorsque le projet est plus risqué.

- a. vrai
- b. faux

Quiz Scrum.org

- **It's generally better to have shorter Sprints when the project is riskier.**
- **a. TRUE**
- b. FALSE

Des sprints plus courts offrent plus d'opportunités d'adaptation et réduisent ainsi les risques.

Quiz Scrum.org

- **When does the next Sprint begin?**

- a. When the Product Backlog is refined and items at the top are "ready"
- b. When the customer approves the previous Increment
- c. When the Product Owner authorizes
- d. Immediately after the previous Sprint

Quand commence le prochain Sprint ?

- a. Lorsque le Product Backlog est affiné et que les éléments en haut sont "prêts"
- b. Lorsque le client approuve l'incrément précédent
- c. Lorsque le Product Owner autorise
- d. Immédiatement après le Sprint précédent

Quiz Scrum.org

- **When does the next Sprint begin?**

- a. When the Product Backlog is refined and items at the top are "ready"
- b. When the customer approves the previous Increment
- c. When the Product Owner authorizes
- **d. Immediately after the previous Sprint**

a. Le raffinement se fait en continu. Nous n'attendons pas non plus que les articles du dessus soient "prêts" ; s'ils ne le sont pas, nous les sélectionnerons pour le Sprint Backlog et les affinerons pendant le Sprint.

Chaque Sprint démarre immédiatement après le précédent ; il n'y a pas d'espace entre les deux.

Il est important pour Scrum.org que vous le sachiez car de nombreuses personnes ajoutent des intervalles entre les sprints pour faire différentes choses telles que le raffinement, ce qui n'est pas productif.

Quiz Scrum.org

- **What's the role of a Scrum Master during Sprint Retrospectives?**
 - a. Summarizing and report the results of the meeting to stakeholders
 - b. Capturing process improvement ideas for the next Sprint Backlog
 - c. Participating as a Scrum Team member
 - d. They should not participate in this meeting
- **Quel est le rôle d'un Scrum Master lors des Sprint Retrospectives ?**
 - a. Résumer et rapporter les résultats de la réunion aux parties prenantes
 - b. Capturer des idées d'amélioration de processus pour le prochain Sprint Backlog
 - c. Participer en tant que membre de l'équipe Scrum
 - d. Ils ne doivent pas participer à cette réunion

Quiz Scrum.org

- **What's the role of a Scrum Master during Sprint Retrospectives?**
 - a. Summarizing and report the results of the meeting to stakeholders
 - b. Capturing process improvement ideas for the next Sprint Backlog
 - **c. Participating as a Scrum Team member**
 - d. They should not participate in this meeting

Les trois rôles (l'équipe Scrum) participent à la rétrospective de sprint, et ils travaillent ensemble pour voir comment ils peuvent améliorer leur façon de travailler dans le prochain sprint.

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is NOT a feedback loop in Scrum?**
 - a. Sprint Review
 - b. Release Planning
 - c. Sprint Retrospective
 - d. Daily Scrum
- **Lequel des éléments suivants N'EST PAS une boucle de rétroaction dans Scrum ?**
 - a. Revue de sprint
 - b. Release planning
 - c. Rétrospective Sprint
 - d. Daily scrum

Quiz Scrum.org

- **Which of the following is NOT a feedback loop in Scrum?**
 - a. Sprint Review
 - **b. Release Planning**
 - c. Sprint Retrospective
 - d. Daily Scrum

La planification de sprint, la mêlée quotidienne, la revue de sprint et la rétrospective de sprint sont des "opportunités formelles d'inspection et d'adaptation" et sont considérées comme des "boucles de rétroaction". Notez que "opportunité formelle" signifie "opportunité sérieuse" ou "opportunité importante" ici, et ce ne sont PAS des "réunions formelles", ce qui signifie que nous n'échangeons pas de signatures et ne nous soucions pas des aspects contractuels pendant celles-ci. Avez-vous remarqué le mot "pas" dans la question ?

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are feedback loops in Scrum?**
 - a. Release Planning
 - b. Sprint Review
 - c. Burn-down chart
 - d. Daily Scrum
 - e. Sprint Retrospective

- **Parmi les trois éléments suivants, lesquels sont des boucles de rétroaction dans Scrum ?**
 - a. Release planning
 - b. Revue de sprint
 - c. Graphique d'avancement/Burn down chart
 - d. Daily meeting
 - e. Rétrospective Sprint

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are feedback loops in Scrum?**
 - a. Release Planning
 - **b. Sprint Review**
 - c. Burn-down chart
 - **d. Daily Scrum**
 - **e. Sprint Retrospective**

La planification de sprint, la mêlée quotidienne, la revue de sprint et la rétrospective de sprint sont des "opportunités formelles d'inspection et d'adaptation" et sont considérées comme des "boucles de rétroaction". Notez que "opportunité formelle" signifie "opportunité sérieuse" ou "opportunité importante" ici, et ce ne sont PAS des "réunions formelles", ce qui signifie que nous n'échangeons pas de signatures et ne nous soucions pas des aspects contractuels pendant celles-ci.

Quiz Scrum.org

- **Which of the following may change during the Sprint?**
 - a. Composition of the team
 - b. Minimum level of quality
 - c. Product Backlog
 - d. Sprint Goal

Lequel des éléments suivants peut changer pendant le Sprint ?

- a. Composition de l'équipe
- b. Niveau de qualité minimal
- c. Product Backlog
- d. Sprint Goal

Quiz Scrum.org

- **Which of the following may change during the Sprint?**

- a. Composition of the team
- b. Minimum level of quality
- **c. Product Backlog**
- d. Sprint Goal

- a. L'équipe reste la même pendant le Sprint. Si vous devez le modifier, attendez le début du prochain Sprint.
- b. Le niveau de qualité attendu ne doit pas diminuer pendant le Sprint.
- c. Le Product Backlog peut changer à tout moment.
- d. L'objectif du sprint ne change pas après la réunion de planification du sprint Ceux qui restent fixes pendant le sprint sont nécessaires pour éviter les distractions et créer un environnement plus productif. Après tout, les Sprints ne sont pas si longs qu'ils créent des problèmes.

Quiz Scrum.org

- **What happens between a Sprint Retrospective and the next Sprint Planning meeting?**
 - a. Getting customer approval for the previous Increment
 - b. Nothing!
 - c. Refactoring the previous Increment
 - d. Product Backlog Refinement

Que se passe-t-il entre une rétrospective de sprint et la prochaine réunion de planification de sprint ?

- a. Obtenir l'approbation du client pour l'incrément précédent
- b. Rien!
- c. Refactoriser l'Incrément précédent
- d. Raffinement du product backlog

Quiz Scrum.org

- **What happens between a Sprint Retrospective and the next Sprint Planning meeting?**

- a. Getting customer approval for the previous Increment
- **b. Nothing!**
- c. Refactoring the previous Increment
- d. Product Backlog Refinement

c. Le refactoring est effectué pendant les Sprints.

d. C'est fait en continu. Chaque Sprint démarre immédiatement après le précédent ; il n'y a pas d'espace entre les deux. Il est important pour Scrum.org que vous le sachiez car de nombreuses personnes ajoutent des intervalles entre les sprints pour faire différentes choses telles que le raffinement, ce qui n'est pas productif.

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are timeboxed?**

- a. Release Planning
- b. Sprint Retrospective
- c. Sprint Review
- d. Sprint Zero
- e. Release Retrospective
- f. Sprint

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont limitées dans le temps ?

- a. Release Planning
- b. Rétrospective Sprint
- c. Revue de sprint
- d. Sprint zéro
- e. Release Retrospective
- f. Sprint

Quiz Scrum.org

- **Which three of the following are timeboxed?**

- a. Release Planning
- b. Sprint Retrospective
- c. Sprint Review
- d. Sprint Zero
- e. Release Retrospective
- f. Sprint

a. Il n'y a pas d'événement de planification de release dans Scrum.

b. Il n'y a pas de Sprint Zéro dans Scrum.

e. Il n'y a pas d'événement de rétrospective de release dans Scrum. Les événements (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review et Sprint Retrospective) sont limités dans le temps.

Quiz Scrum.org

- **The developers forecast that 5 out of 12 items they have in the Sprint Backlog won't be done by the end of the Sprint. What should they do?**
 - a. They will deliver as much as they can, and they learn more about how many items they can deliver in the next Sprints.
 - b. Cancel the Sprint.
 - c. Extend the duration of the Sprint, to be able to deliver everything.
 - d. The remaining items will be moved to the next Sprint Backlog.

Les développeurs prévoient que 5 des 12 éléments qu'ils ont dans le Sprint Backlog ne seront pas terminés d'ici la fin du Sprint. Que devraient-ils faire?

- a. Ils livreront autant qu'ils le pourront, et ils en apprendront davantage sur le nombre d'item qu'ils pourront livrer lors des prochains Sprints.
- b. Annulez le Sprint.
- c. Prolonger la durée du Sprint, pour pouvoir tout livrer.
- d. Les éléments restants seront déplacés vers le prochain Sprint Backlog.

Quiz Scrum.org

- **The developers forecast that 5 out of 12 items they have in the Sprint Backlog won't be done by the end of the Sprint. What should they do?**
 - a. They will deliver as much as they can, and they learn more about how many items they can deliver in the next Sprints.
 - b. Cancel the Sprint.
 - c. Extend the duration of the Sprint, to be able to deliver everything.
 - d. The remaining items will be moved to the next Sprint Backlog.
- b. Les sprints sont annulés lorsque l'objectif de sprint devient obsolète.
- c. Les sprints sont chronométrés.
- d. Les articles inachevés retournent dans le Product Backlog et seront à nouveau commandés ; pas directement au prochain Sprint Backlog. Certaines personnes pensent qu'une équipe qui réussit est celle qui peut terminer tout le travail du Sprint Backlog, mais ce n'est pas vrai. Au contraire, cela signifie probablement qu'ils sont trop conservateurs dans le nombre d'éléments qu'ils sélectionnent pour le Sprint, ce qui peut réduire leur productivité en raison de la loi de Parkinson et du syndrome de Student. Rien de mal ne se passe si certains éléments ne sont pas terminés à la fin du Sprint, et personne ne devrait blâmer l'équipe ; le Sprint Backlog n'est qu'une estimation approximative de ce qu'ils peuvent faire.

Quiz Scrum.org

- **When is it time to integrate the code?**
 - a. At the end of the project
 - b. Frequently, during the Sprint
 - c. At the end of each Sprint
 - d. Before each release

Quand est-il temps d'intégrer le code ?

- a. A la fin du projet
- b. Fréquemment, pendant le Sprint
- c. A la fin de chaque Sprint
- d. Avant chaque release

Quiz Scrum.org

- **When is it time to integrate the code?**
 - a. At the end of the project
 - **b. Frequently, during the Sprint**
 - c. At the end of each Sprint
 - d. Before each release

Vous ne pouvez pas savoir si le code fonctionnera correctement, sauf si vous l'intégrez au reste du code. C'est pourquoi nous avons une intégration continue dans Agile, qui peut se produire plusieurs fois par jour.

Quiz Scrum.org

- **How often should the composition of the team change?**
 - a. As needed, without a need to be concerned about changes in productivity
 - b. As needed, considering that it will have a short-term reduction in productivity
 - c. Never, because it reduces productivity
 - d. Every Sprint, to encourage creativity and openness

À quelle fréquence la composition de l'équipe doit-elle changer ?

- a. Au besoin, sans avoir à se soucier des changements de productivité
- b. Au besoin, considérant qu'il y aura une réduction à court terme de la productivité
- c. Jamais, car cela réduit la productivité
- d. Chaque Sprint, pour encourager la créativité et l'ouverture

Quiz Scrum.org

- **How often should the composition of the team change?**
 - a. As needed, without a need to be concerned about changes in productivity
 - **b. As needed, considering that it will have a short-term reduction in productivity**
 - c. Never, because it reduces productivity
 - d. Every Sprint, to encourage creativity and openness

Parfois, vous verrez des questions comme celle-ci dans l'examen. Vous savez peut-être que la composition de l'équipe ne devrait pas changer pendant le Sprint, pourtant, le bon choix ici peut impliquer cela. Eh bien, c'est à vous de l'interpréter de manière à ce que cela ne signifie pas une telle chose ! Ainsi, l'énoncé précis serait "Au besoin, tant que ce n'est pas au milieu du Sprint, et nous considérons qu'il peut y avoir une réduction de productivité à court terme".

PARTIE 4 : LE FRAMEWORK **SCRUM**

Chap. 5 : Les artefacts

Le product backlog

Les artefacts Scrum sont présent pour maximiser la transparence

- Artefact Scrum qui consiste en une liste ordonnée du travail à effectuer afin de créer et maintenir un produit.
- Géré par le Product Owner.
- Composé d'items (PBI : Product Backlog Items) :
 - Fonctionnalités
 - Améliorations / Refactoring
 - Item techniques
 - Anomalies
 - Idées
 - Spike
- **ENGAGEMENT : Product Goal**
Décrit l'état futur du produit qui peut servir d'objectif à partir duquel l'équipe Scrum peut planifier.

Le sprint backlog

- Artefact Scrum qui fournit un aperçu du travail de développement pour atteindre l'objectif d'un Sprint
- Prévise des fonctionnalités et du travail nécessaire pour fournir ces fonctionnalités.
- Géré par les développeurs.
- **ENGAGEMENT : Sprint Goal**
une brève expression de l'objectif du Sprint, souvent un problème commercial qui est abordé.
La fonctionnalité peut être ajustée pendant le sprint afin d'atteindre l'objectif du sprint.

Increment

- Artefact Scrum qui définit le travail complet et précieux produit par les développeurs lors d'un sprint. La somme de tous les incréments forme un produit.
- **ENGAGEMENT : Définition of Done**
une description formelle de l'état de l'Incrément lorsqu'il répond aux mesures de qualité requises pour le produit.
- Dès qu'un élément du Product Backlog répond à la définition de Terminé, un incrément naît.
- La définition du "Terminé" crée de la transparence en offrant à chacun une compréhension commune du travail effectué dans le cadre de l'incrément.

Si un élément du Product Backlog ne répond pas à la définition de Terminé, il ne peut pas être publié ni même présenté lors de la Sprint Review.

Quelques traductions

- Mandatory/required = obligatoire
- Allowed : Autorisé
- formal meeting : a meeting where people approve something and exchange signatures
- Release : version/livrable du projet
- To forecast : prévoir
- Pace : Rythme
- Participate = talk
- Attend : Assister, regarder
- Timeboxed : limité dans le temps
- PMO : project manager office
- Empediment : Obstacle
- Should : devrait
- Can /Could : pourrait / Peut
- Must : doit / Obligation
- Released : Livré(e)
- Releasable : livrable

Quelques traductions


- Mandatory/required = obligatoire
 - Allowed : Autorisé
 - formal meeting : a meeting where people approve something and exchange signatures
 - Release : version/livrable du projet
 - To forecast / forecast : prévoir / prévision
 - Pace : Rythme
 - Participate = talk
 - Attend : Assister, regarder
 - Timeboxed : limité dans le temps
 - PMO : project manager office
 - Empediment : Obstacle
 - Should : devrait
 - Can /Could : pourrait / Peut
 - Must : doit / Obligation
 - May / Might : peut
 - Released : Livré(e)
 - Releasable : livrable
-
- GLOSSAIRE SCRUM.ORG <https://www.scrum.org/Resources/Scrum-Glossary>

Quelques traductions

- Self-managing : auto-organisé
- raised concerns : Soulevé des préoccupations
- Accountable : responsable
- needs awareness : avoir connaissance
- Outcome : résultat
- effective ways : meilleure manière
- to ensure : garantir
- Postpone : reporter
- All of the above : toutes les réponses
- sufficient accuracy of inspection : précision suffisante de l'inspection
- kept up to date : tenu à jour
- Accurate : précis
- Hand off : remettre
- Given time : temps donné
- Set time : (je valide le temps, je choisi)

Merci pour votre
ATTENTION et votre PARTICIPATION !

marine@utopios.net

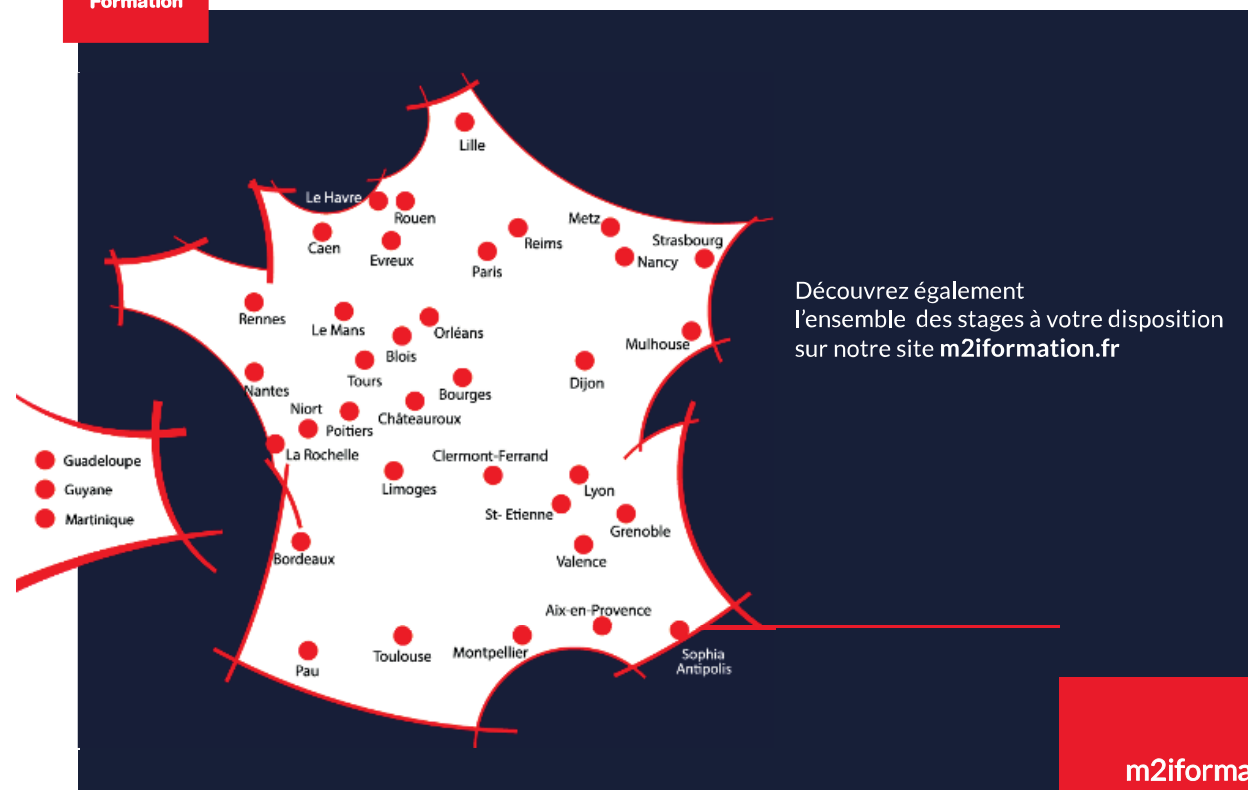

m2iinformation.fr

